

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目


监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-054

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

主题: 关于集电线路 AB1 高压电缆上塔作业相关事宜

内容: 监理人员巡视时发现集电线路 AB1 高压电缆上塔作业时, 未做好准备工作, 存在铁塔防盗帽未紧固, 高压电缆冷缩护套管破损等问题。高压电缆上塔作业涉及高空作业, 属于高风险作业, 施工单位未安排安全员进行监护, 未做好安全措施。要求施工单位临时暂停高压电缆上塔作业, 所有缺陷整改完成待监理单位检查合格后再开始作业。

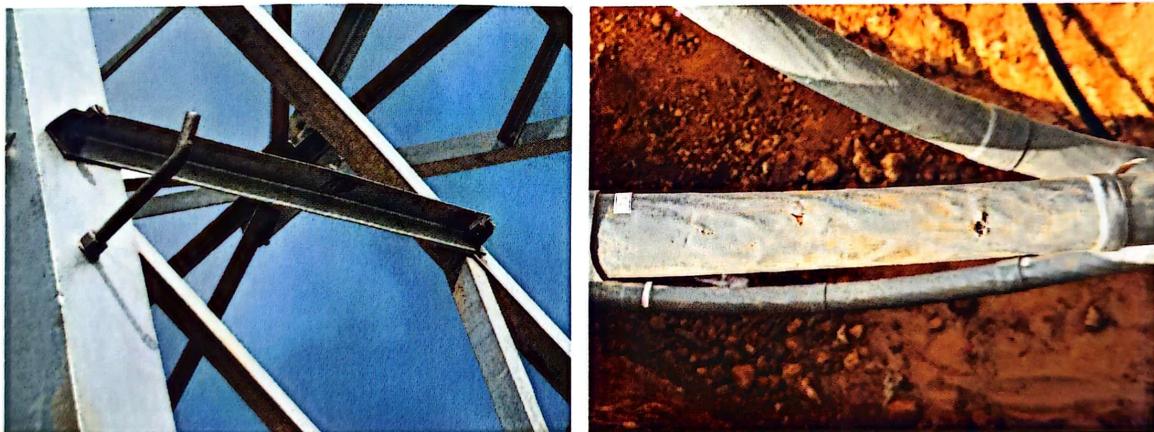

请贵单位在收到本通知后立即进行整改, 限 2 日内将整改结果书面回复我方。希望贵单位能够积极配合。

项目监理机构(章):

专业监理工程师: 平陆县 100MW

总监理工程师: 农光互补光伏项

日 期: 2024.09.13

填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。
