

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-114

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于洪池光伏场区钢筋笼摆放上下颠倒事宜

2024 年 8 月 15 日, 监理部人员对洪池光伏场区检查发现:

洪池场区钢筋笼摆放过程中, 部分出现了上下颠倒的情况, 影响结构的稳定性和安全性, 可能导致钢筋笼在后续施工中的受力不均, 必须引起高度重视。

现要求洪池所有地块对颠倒摆放的钢筋笼进行重新调整和正确摆放, 确保其熟悉施工规范和操作流程, 避免类似错误再次发生, 整改完成后, 需经监理验收合格后方可继续进行后续施工。

请贵公司接到此通知后按照设计及规范要求立即整改, 并在 2 日内将整改结果书面回复我监理部。

后附相关问题照片

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:


总监理工程师:

日

期:

填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。

附：ZHJL-JLTZ-PL-114 现场相关问题照片

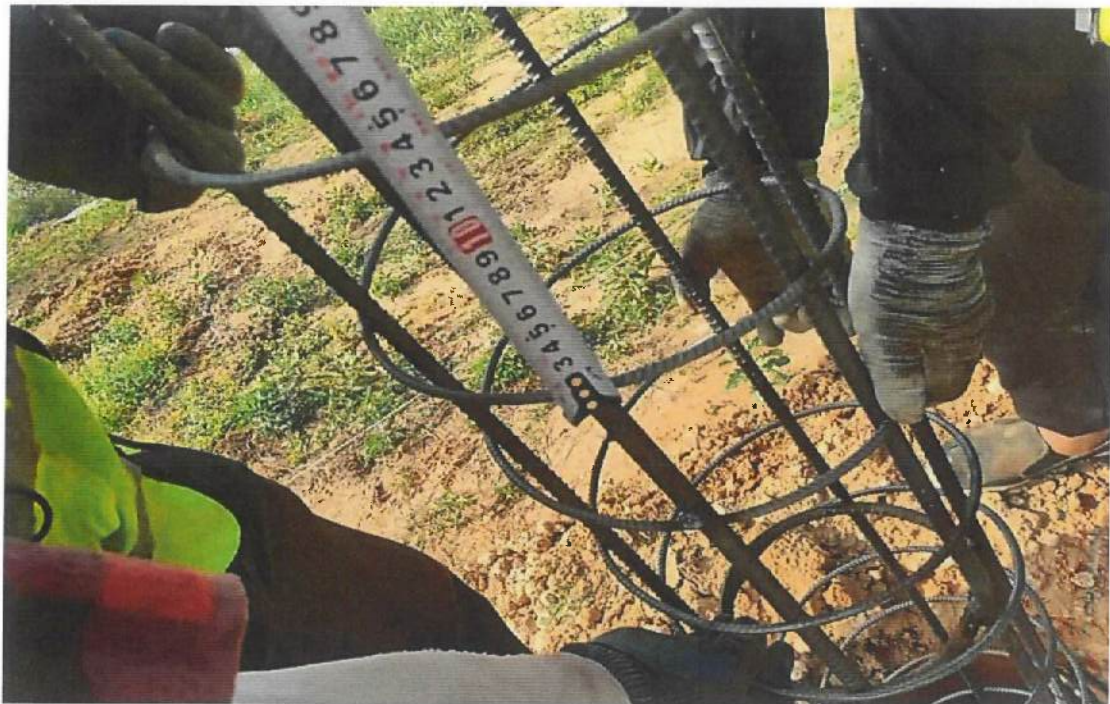

平陆县100MW农光互补光伏发电项目
施工区域：洪池新地块光伏区
施工内容：30—31地块支架桩基浇筑
拍摄时间：2024.08.15 10:07
天气：多云 25℃
地点：平陆县·沟口村

今日水印
相机 真实时间
版内 938E6KPN6KULLN
