

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-043

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于工程质量问题事宜

通知内容：

经监理人员日常巡检发现的质量问题，口头指令要求的部分现场仍未整改，特在此次对小店区王吴铁路东大棚验收中特别强调以下问题：

- 1、接地固定点缺少一道，固定不牢靠；
- 2、组件与支架接地部分缺少一道；组件间隙打胶事项未落实；
- 3、支架底板焊接存在两面焊、点焊现象，支架与桩基连接点的筋板厚度不符合图纸设计要求；
- 4、逆变器至支架直流电缆穿管固定点缺少，防火封堵缺失，未落实；
- 5、桩顶的防腐未做；
- 6、接地扁铁黄绿漆涂刷不规范；
- 7、设备接地埋深不足，电阻值过大；
- 8、支架立柱固定点存在只用一个螺丝固定现象，与设计要求不符，且个别处的螺丝未紧固，存在松动现象；
- 9、个别的支架底板焊渣未及时清理，未做防腐；
- 10、电缆沟回填土使用的为原状土，未使用砂，不符合图纸设计要求；
- 11、逆变器组串开路电压未进行检测；
- 12、去年桩基施工已完成，但截止目前仍未见其桩基试验报告。

以上问题，要求总包单位严格按照图纸设计要求立即整改，隐蔽工程严禁擅自隐蔽，未经复验的不得进行下一道工序，此通知单未回复前，擅自施工的一切后果由你单位自行承担。

附照片


项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：高伟池

日期：2024.4.24

注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。



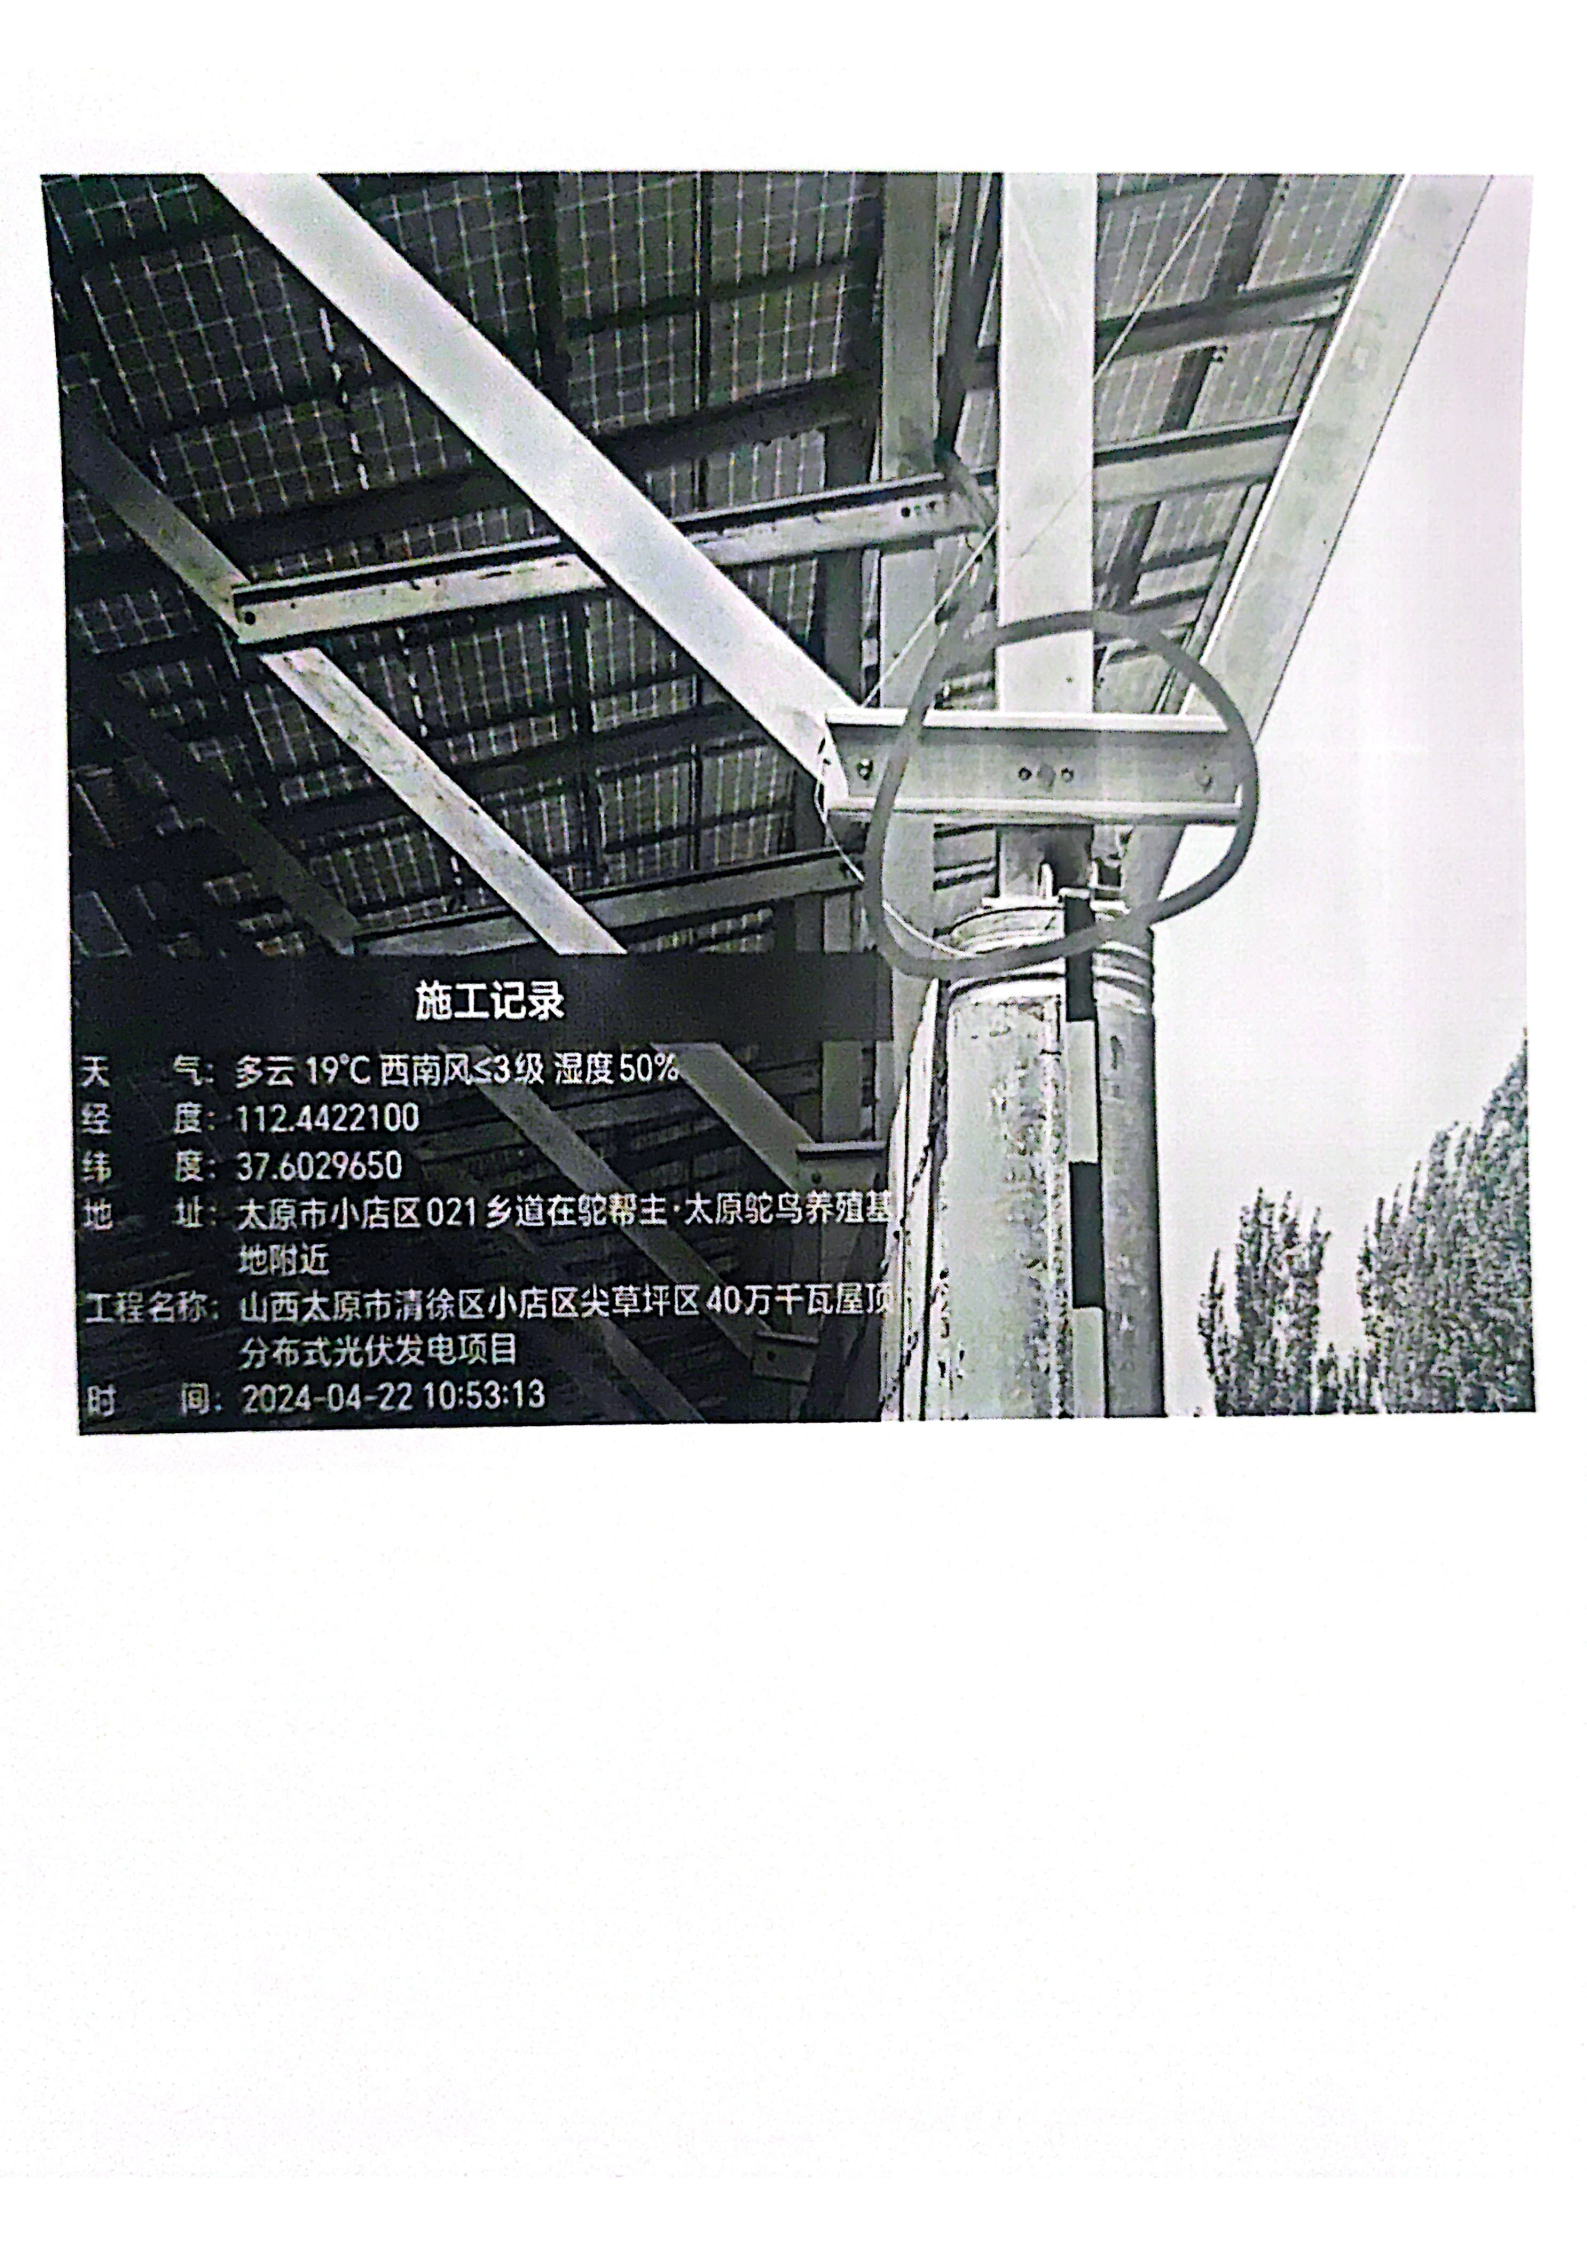

施工记录

天气: 多云 19℃ 西南风≤3级 湿度50%
经度: 112.4422100
纬度: 37.6029650
地址: 太原市小店区021乡道在驼帮主·太原驼鸟养殖基地附近
工程名称: 山西太原市清徐区小店区尖草坪区40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目
时间: 2024-04-22 10:53:13
