

监理工程师通知单

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏项目

编号：ZHJL-XY-TZD-AZ-028

主 送：安徽跨江电力工程有限公司

抄 送：新沂上电申宏新能源有限公司

内 容：关于业主方与监理方验收检查问题整改通知

2023 年 11 月 21 日，业主方张俊、徐金虎与监理方张望、陈城对陈桂田、陈艳梅、陈猛猛、陈凡林、何大方、孔德成、孔祥配和陈尊瑞农户安装过后的检查，发现如下问题：

- 1、陈尊瑞、陈艳梅、何大方、孔德成逆变器下端电缆管口与电表箱下面未做防火封堵；
- 2、陈尊瑞、陈艳梅、何大方、陈桂田、陈猛猛、孔祥配扁铁焊接处、接地焊接处防腐未做好，未按要求焊接，扁铁焊接搭接长度不够；
- 3、陈艳梅、孔祥配防水未做完；
- 4、孔德成螺栓、支架、压块生锈现象十分严重，直流线排线混乱，未绑扎好、逆变器处电缆未做电缆标记；
- 5、何大方逆变器未用三通管口连接，逆变器下方软管未开孔，组件间穿刺接地片部分未安装，施工现场垃圾未清理；
- 6、陈猛猛、陈凡林、何大方逆变器未贴 logo
- 7、陈艳梅电缆未绑扎
- 8、陈桂田防水开裂、农户反应组件间缝隙处漏雨

现要求你部收到整改通知后立即整改到位，分析原因，举一反三，加强现场质量管控，严格进行施工质量技术交底及学习，提高质量标准，确保工程质量。

以上问题及时整改，要求施工单位提供整改方案及期限，整改完成后回复《监理通知回复单》，逾期未整改或整改不到位按《发承包合同》相关质量考核要求给予相应考核。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：何立标


日 期：2023 年 11 月 21 日

本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 二 份


问题 1,




问题 2,

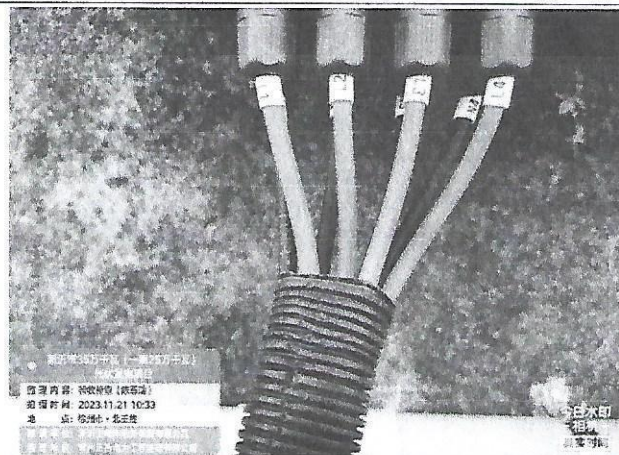


问题 3,

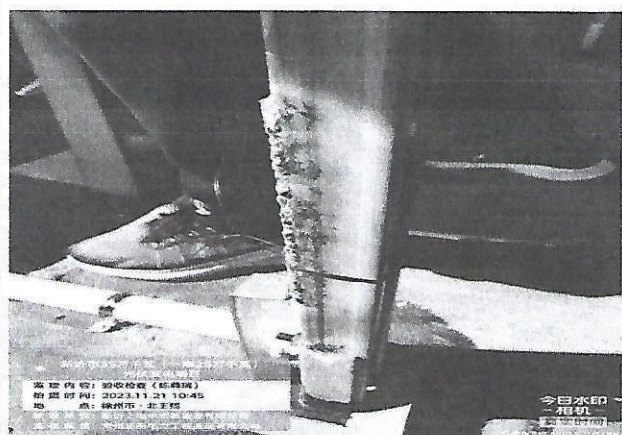


问题 4,

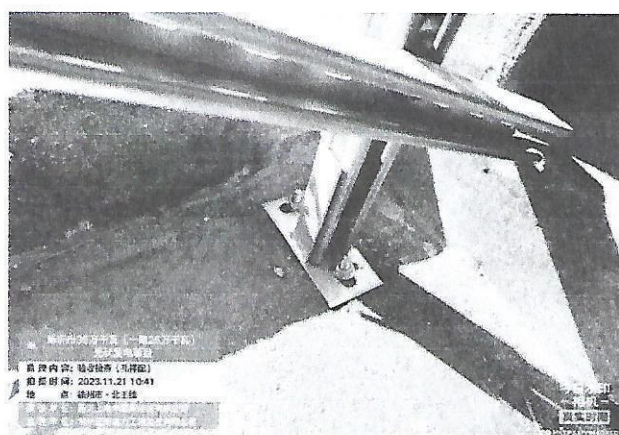


问题 5,

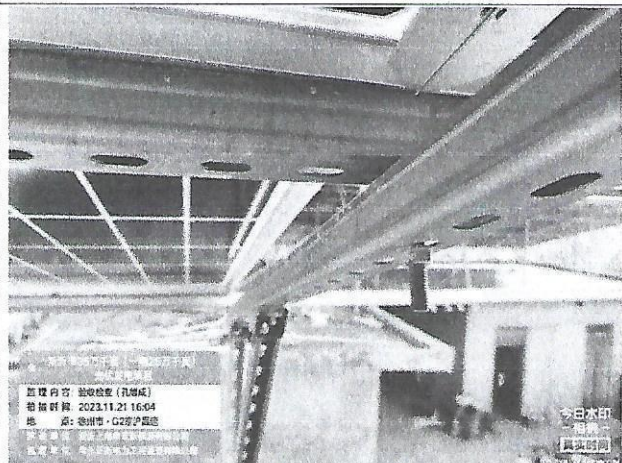


问题 6

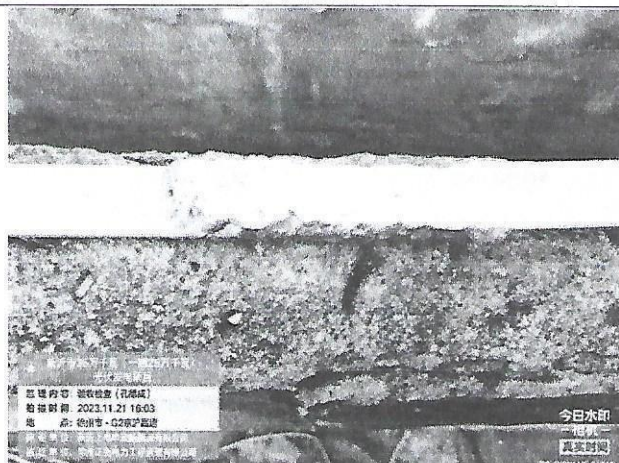


问题 7

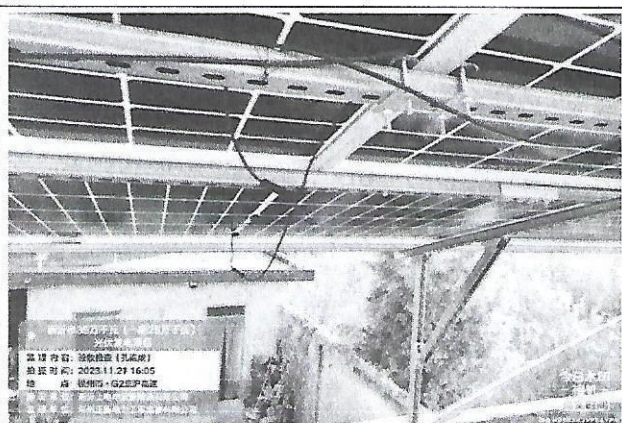


问题 8

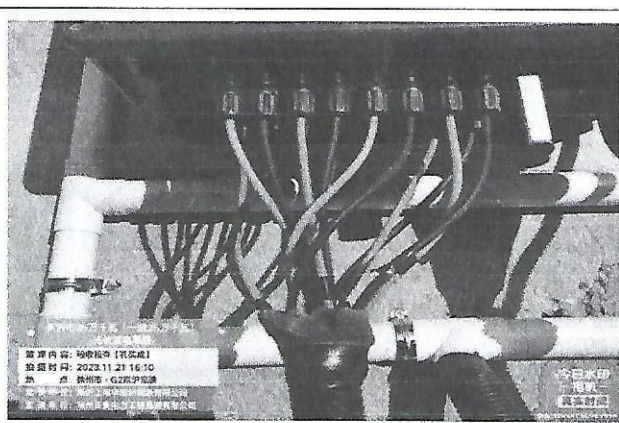


问题 9

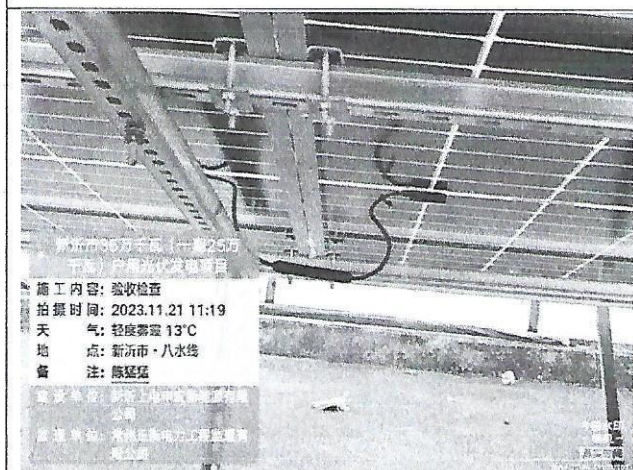


问题 10

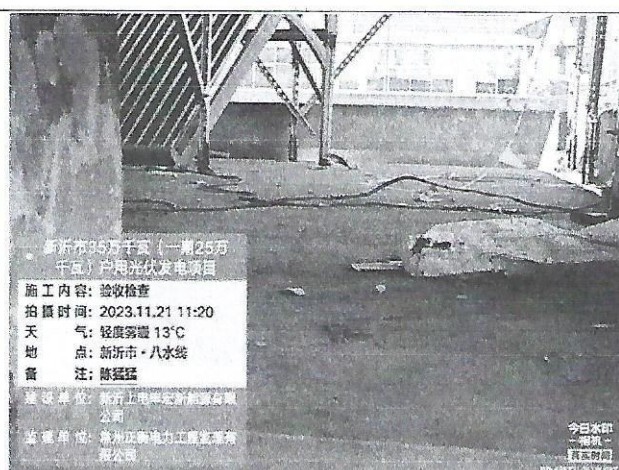

问题 11

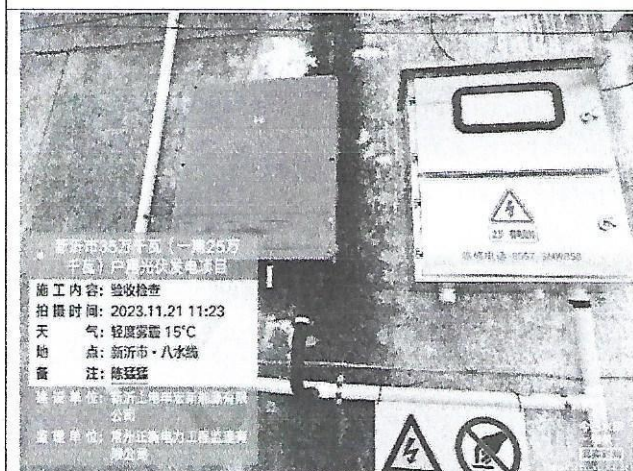

问题 12

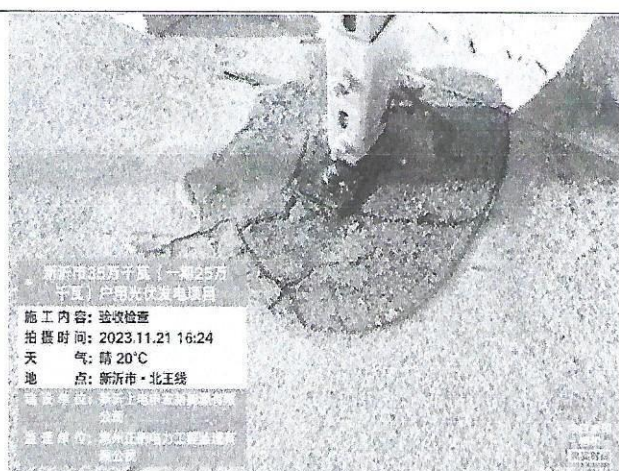

问题 13

