

监理通知单（质量）

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目 编号：AHST/XBGP-DDJL-TZ-017

致：中国水利水电第十一工程局有限公司（施工项目部）

抄送：广西来宾上禾通达新能源有限公司

事由：关于城厢镇关家岭户主林元春并网后现场存在的相关质量问题

内容：

2023年9月11日，我监理部对城厢镇关家岭村户主林元春现场接地电阻检测见证时发现该站点已并网运行，但现场仍存在以下问题：

- 1、组件光伏线缆敷设不规范：（设计要求光伏线缆不得对组件背部造成遮挡情况）
- 2、个别组件压块未压实；
- 3、支架螺栓防滑标记未落实；
- 4、线管封堵不到位：（个别未封堵、防火泥脱落等）
- 5、现场实测接地电阻值不符合设计要求。（设计要求不大于4欧姆，现场实测值15.66

欧姆）

针对此类问题，我监理部现要求你单位自接收本通知单起3日内完成现场整改消缺工作，否则我监理部将根据工程建设管理制度相关条例进行经济考核。

另：若因此类问题造成相关损失由你单位全责承担。

上述问题见附图

项目监理机构（章）

总/专监理工程师（签字）：[Signature]

日期：2023. 9. 11

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。




扫描全能王 创建


附图:



光伏线敷设不符合设计要求

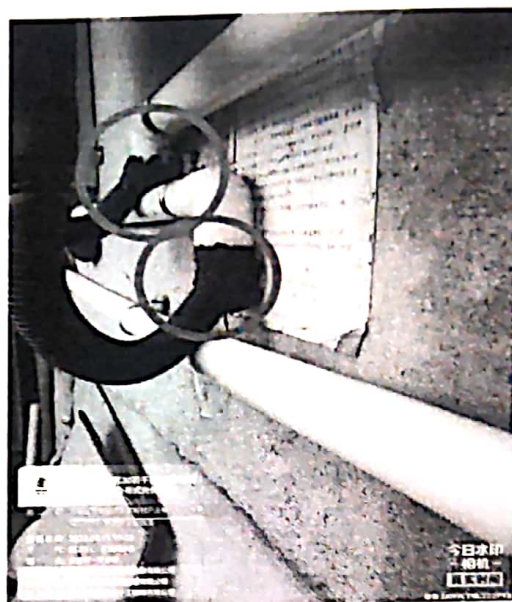

防火泥脱落

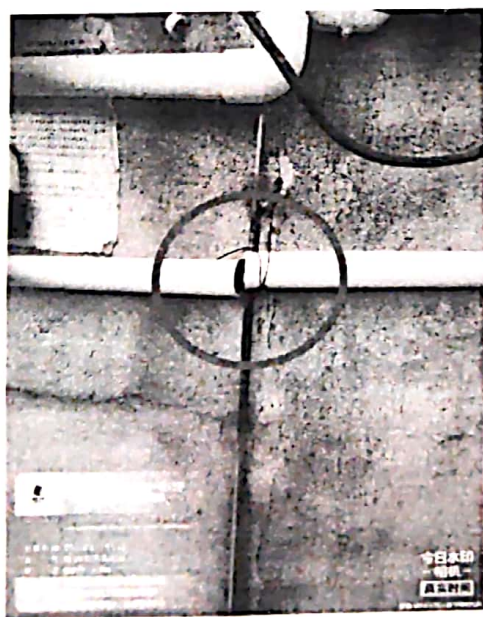

线管未封堵



接地电阻实测值不符合设计要求

