

监理通知单（质量）

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目 编号：XBCF-DDJL-ZL-0029

致：中国水利水电第十一工程局有限公司（施工项目部）

抄送：广西来宾上禾通达新能源有限公司

事由：关于支架安装完成报验事宜

内容：

2023年11月27日，经我监理部人员在巡查厢城镇施工过程中存在以下问题：

- 1、立柱支架连接螺栓短，未按图纸要求施工；
- 2、安装支架部分未安装弹簧垫片；
- 3、安装立柱部分立柱底板未使用结构胶、防水材料与图纸设计不符；

为确保工程质量，避免出现返工现象。针对上述问题，我监理部现要求你单位认真落实整改，做好相关技术交底。待整改经自检合格后报监理部进行验收，并及时报送《监理通知单回复单》进行确认，如下次发现类似问题将对你司质量考核。

（见附图）

项目监理机构（章）

总/专监理工程师（签字）

日期 2023.11.27


注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份



立柱支架连接螺栓短



未安装弹簧垫片

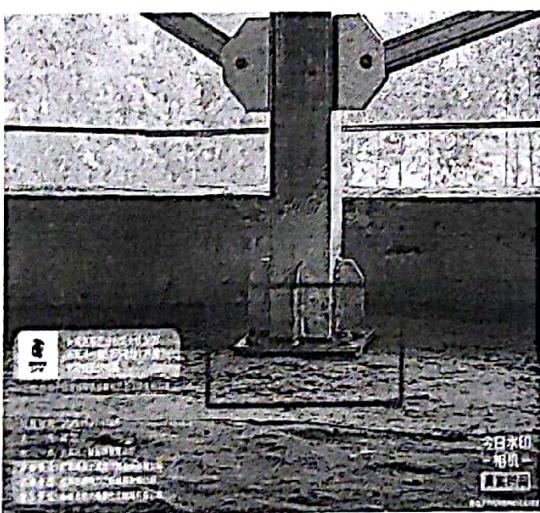

未使用结构胶
