

表 A.0.7 监 理 通 知 单

工程名称: 东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号: DYGF-ZHJL-TZD-018

致: 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 (施工项目经理部)

事由: 关于海边区域锚杆施工存在的质量问题事宜



内容:

2025 年 04 月 13 日经监理部人员巡视检查发现, 海边区域 27、52、61 号塘锚杆施工存在以下问题:

- 1、现场搅拌池水泥浆比重不符合要求, 现场比重计检测数据为 1.4~1.6 之间。
- 2、61 号塘 4#搅拌池没有配备比重计进行检查。
- 3、27 号塘发现锚杆水泥浆搅拌用水直接抽取鱼塘的水, 不符合要求。

以上问题要求总包方按照设计及规范标准进行及时整改, 对于现场搅拌不合格的水泥浆不允许进行灌注, 必须重新进行配比搅拌合格才能施工。

限期 2 日内整改回复。

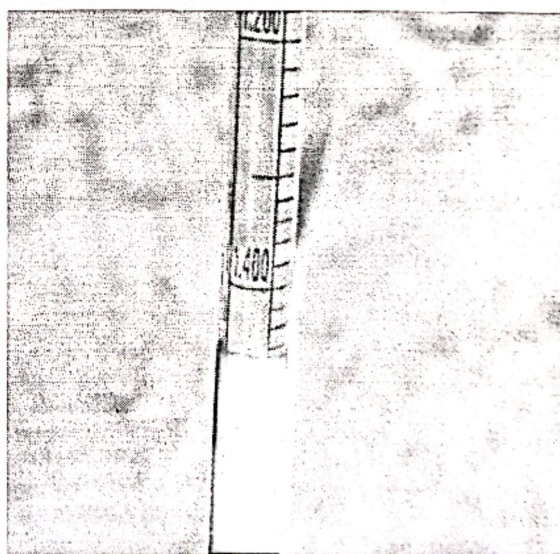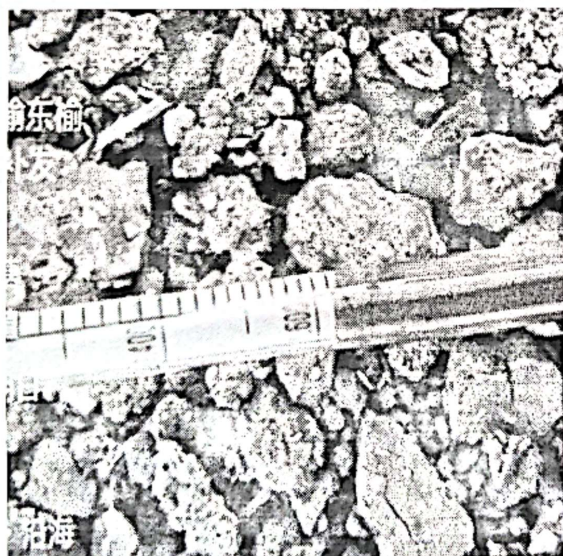

项目监理机构 (章):

总/专业监理工程师 (签字):

日期: 2025.04.13.

注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
