

## 表A.0.7 监 理 通 知 单

工程名称：江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目

编号TXGF-CZZH-TZ-A07-002

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司施工项目部

事由：关于现场施常规支架质量事宜；


内容：EPC合同钢支架斜梁及立柱大于2.5mm。



连接件高度与图偏差15mm



连接件厚度图2.5mm偏差0.24mm

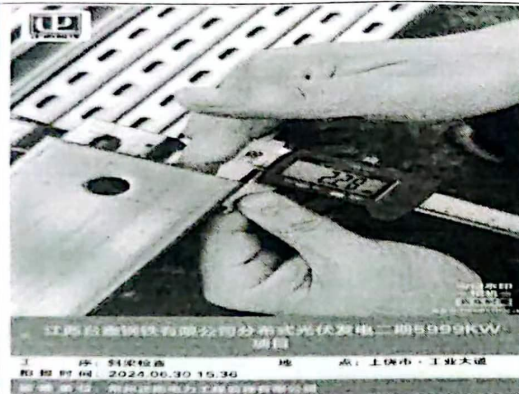

斜梁合同2.5mm图纸2.0mm实际2.28mm



底座立柱图2.0mm实际2.25合同2.5mm

请严格按照合同要求采购材料并3日内进行回复。

项目监理机构（章）

总监理工程师（签字）

日期：2024.6.30

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
