

表A.0.7 监 理 通 知 单

工程名称：江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目

编号TXGF-CZZH-TZ-A07-008

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司施工项目部

事由：关于现场施工安全、质量情况：


内容：

1、总包方安全员已离场十余天，尽快安排安全员进场。

2、巡视一分厂光伏安装存在问题：



组件胶条安装位置错误

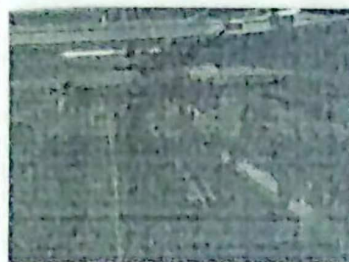

组件光伏线未绑扎



直流线缆未就近绑入组件下方支架



方管未安装连接件禁止铺瓦



一体化盖条个别列缝隙偏大及时调整



组件安装存在踩踏，尽快安排组件检测

为保证项目顺利验收，要求总包方加强现场安全质量管理，禁止踩踏组件，对以上问题进行整改，整改完成后报监理复验合格后再进行后续施工，同时对施工人员做好技术交底。

项目监理机构（章）：

监理工程师（签字）：

日期：2024.8.20

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
