

监理通知单

工程名称: 高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 78MW 渔光互补光伏发电项目

编号:A.0.4-TZ-2024-10-003

主送: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 (总包项目部)
新霖飞 (扬州) 光伏科技有限公司 (总包项目部)



抄送: 高邮市鑫辰新能源有限公司 (业主项目部)

事由: 汤庄项目施工现场管桩质量事宜

内容: 汤庄项目 78MW 区域 15 号、40 号地已陆续进桩, 我监理项目部同时组织监理人员对所进管桩进行外观、管厚、长度及质量证明文件进行检查, 发现如下质量问题:

- 1、管桩质量证明文件尚未提供;
- 2、少部分管桩因施工工艺出现一边壁度超标, 一边壁厚得不到要求情况;
- 3、个别管桩虽圆但壁厚得不到要求情况
- 4、个别管桩底部部分有破损;

以上出现质量问题的管桩, 我监理人员已现场和你方管理人员加以确认, 对不符合要求管桩及时清退出场, 不得用于项目, 同时要求你方派人到管桩供货商执行监造, 把好管桩制造施工工艺关, 制造出质量稳定的产品, 不影响施工质量和进度。质量问题见下图:

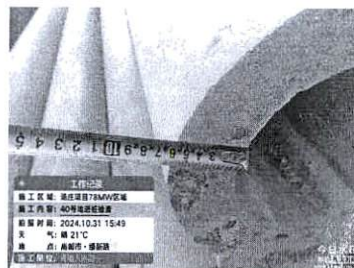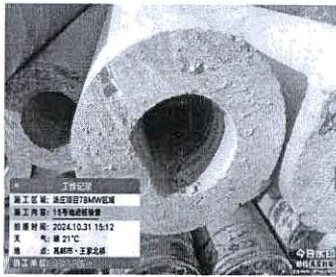

要求贵司在 3 日内完成整改并回复。

项目监理部 (章):

总/专业监理工程师:

日

期: 2024.10.30

本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位存 1 份、项目监理存 1 份, 承包单位存 1 份。
