

监理工程师通知单

工程名称：宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目（D 地块一期、E 地块一期） 编号：ZHJBM04-ZXYDDK01-TZD-20240912

致：福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司

联合体项目部

抄送：宁波海晟能源发展有限公司

事由：关于人员到岗和施工进度缓慢情况。

内容：

2024 年 9 月 12 日我方监理部人员现场巡视检查发现项目施工现场无管理人员和施工人员在场施工，现场已正式进入施工阶段，且施工进度缓慢已影响工程的整体进度计划，具体情况如下：

一、人员不到岗情况

1、多次检查发现施工现场关键岗位人员如项目经理，安全员，技术负责人未按要求到岗履职，

2、施工班组人员数量不足，无法满足正常施工需求。

二、施工进度缓慢问题

按贵公司上报的施工进度计划，9 月 7 号条形支墩摆放就位，支架和组件在 15 号-20 号到货。现场实际情况防水卷材还未平铺到位。对比工程进度计划，目前实际进度已滞后，各工序之间衔接不紧密。

鉴于以上问题，现要求贵单位尽快采取相应措施，以保证高质量完成项目。

限 2024 年 9 月 13 日 18:00 内完成回复，望重视！

附图：

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

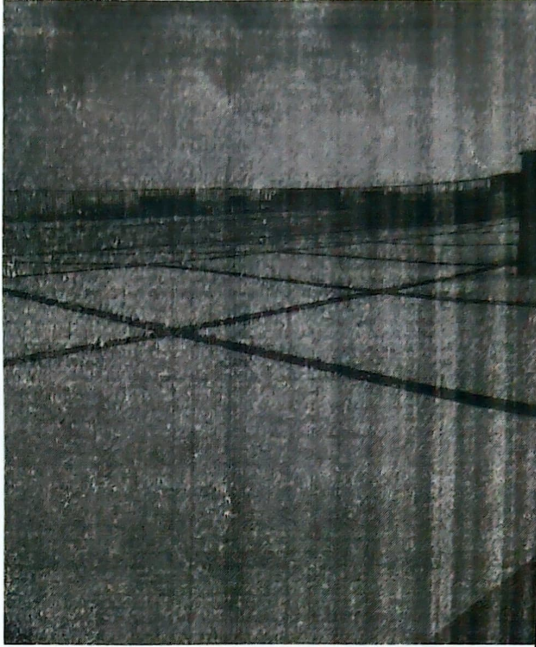
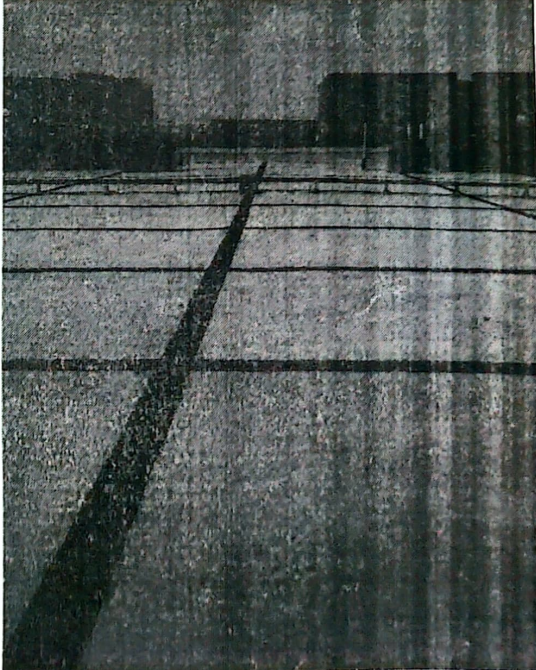
日期：

2024 年 9 月 12 日



本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。

附问题照片：

	
防水卷材未裁剪	防水卷材未铺
	
防水卷材未铺	防水卷材未铺
