

表 A.0.4 监理通知单

工程名称：工程名称：南京国际博览中心 1-3 展馆 16.4MW 分布式光伏项目
编号：CZZH-ZL-表 A.0.4-012

致：天津奥联新能源有限公司（施工项目部）

主题：施工质量

内容：

- 1、7#馆桥架内电缆未绑扎，不符合设计规范要求（建筑电气设计规范要求：在桥架内敷设电缆时，绑扎间距不宜大于 1.5 米，且间距应均匀，不宜绑扎过紧或使电缆受到挤压，在电缆的首尾、转弯及每隔 5-10 米处进行固定）；
- 2、7#馆通讯线缆穿管不规范（穿管接头处未采取相应措施固定或绑扎不到位，导致部分线缆裸露在外。）

请于 2025 年 03 月 19 日 9 时之前整改完成并报监理通知回复单提请复查。

上述问题见下图

项目监理机构（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：孙文龙

2025 年 03 月 17 日

注：本表一式三份，建设单位、项目监理机构、施工单位各一份。

附图:




vivo S18 |

23mm f/1.88 1/1894s ISO50
2023.03.17 09:22




vivo S18 |

23mm f/1.88 1/2200s ISO50
2023.03.17 09:28

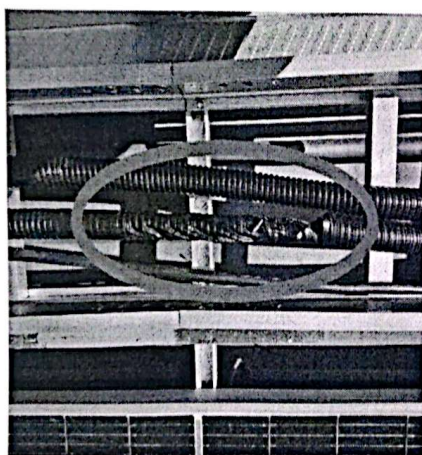

vivo S18 |

23mm f/1.88 1/614s ISO50
2023.03.17 09:22

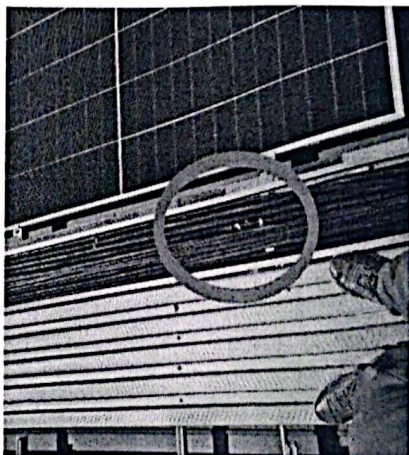

vivo S18 |

23mm f/1.88 1/1000s ISO50
2023.03.17 09:28
