

监 理 通 知 单

工程名称：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司5.99MW分布式光伏发电项目

编号：ZQGF-CZZH-TZ-003

致：宁波兴晟新能源科技有限公司鹏程仓储施工项目部：

事由：关于现场施工质量相关事宜

内容：2025年07月03日经我监理人员对施工现场巡查时，发现如下问题：

- 1、开关站基础和2#箱变基础开挖完成后未按规定进行基坑报验，私自进行下道工序施工。
- 2、开关站基础接地环网未按图施工，且搭接面不足，不符合设计要求。

针对上述问题，现要求你单位即刻进行整改落实，否则后续相关隐蔽工程的资料我监理项目部不予签字盖章，出现一切后果由你单位自行负责。

附：问题照片

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日 期： 2025 年 07 月 03 日



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

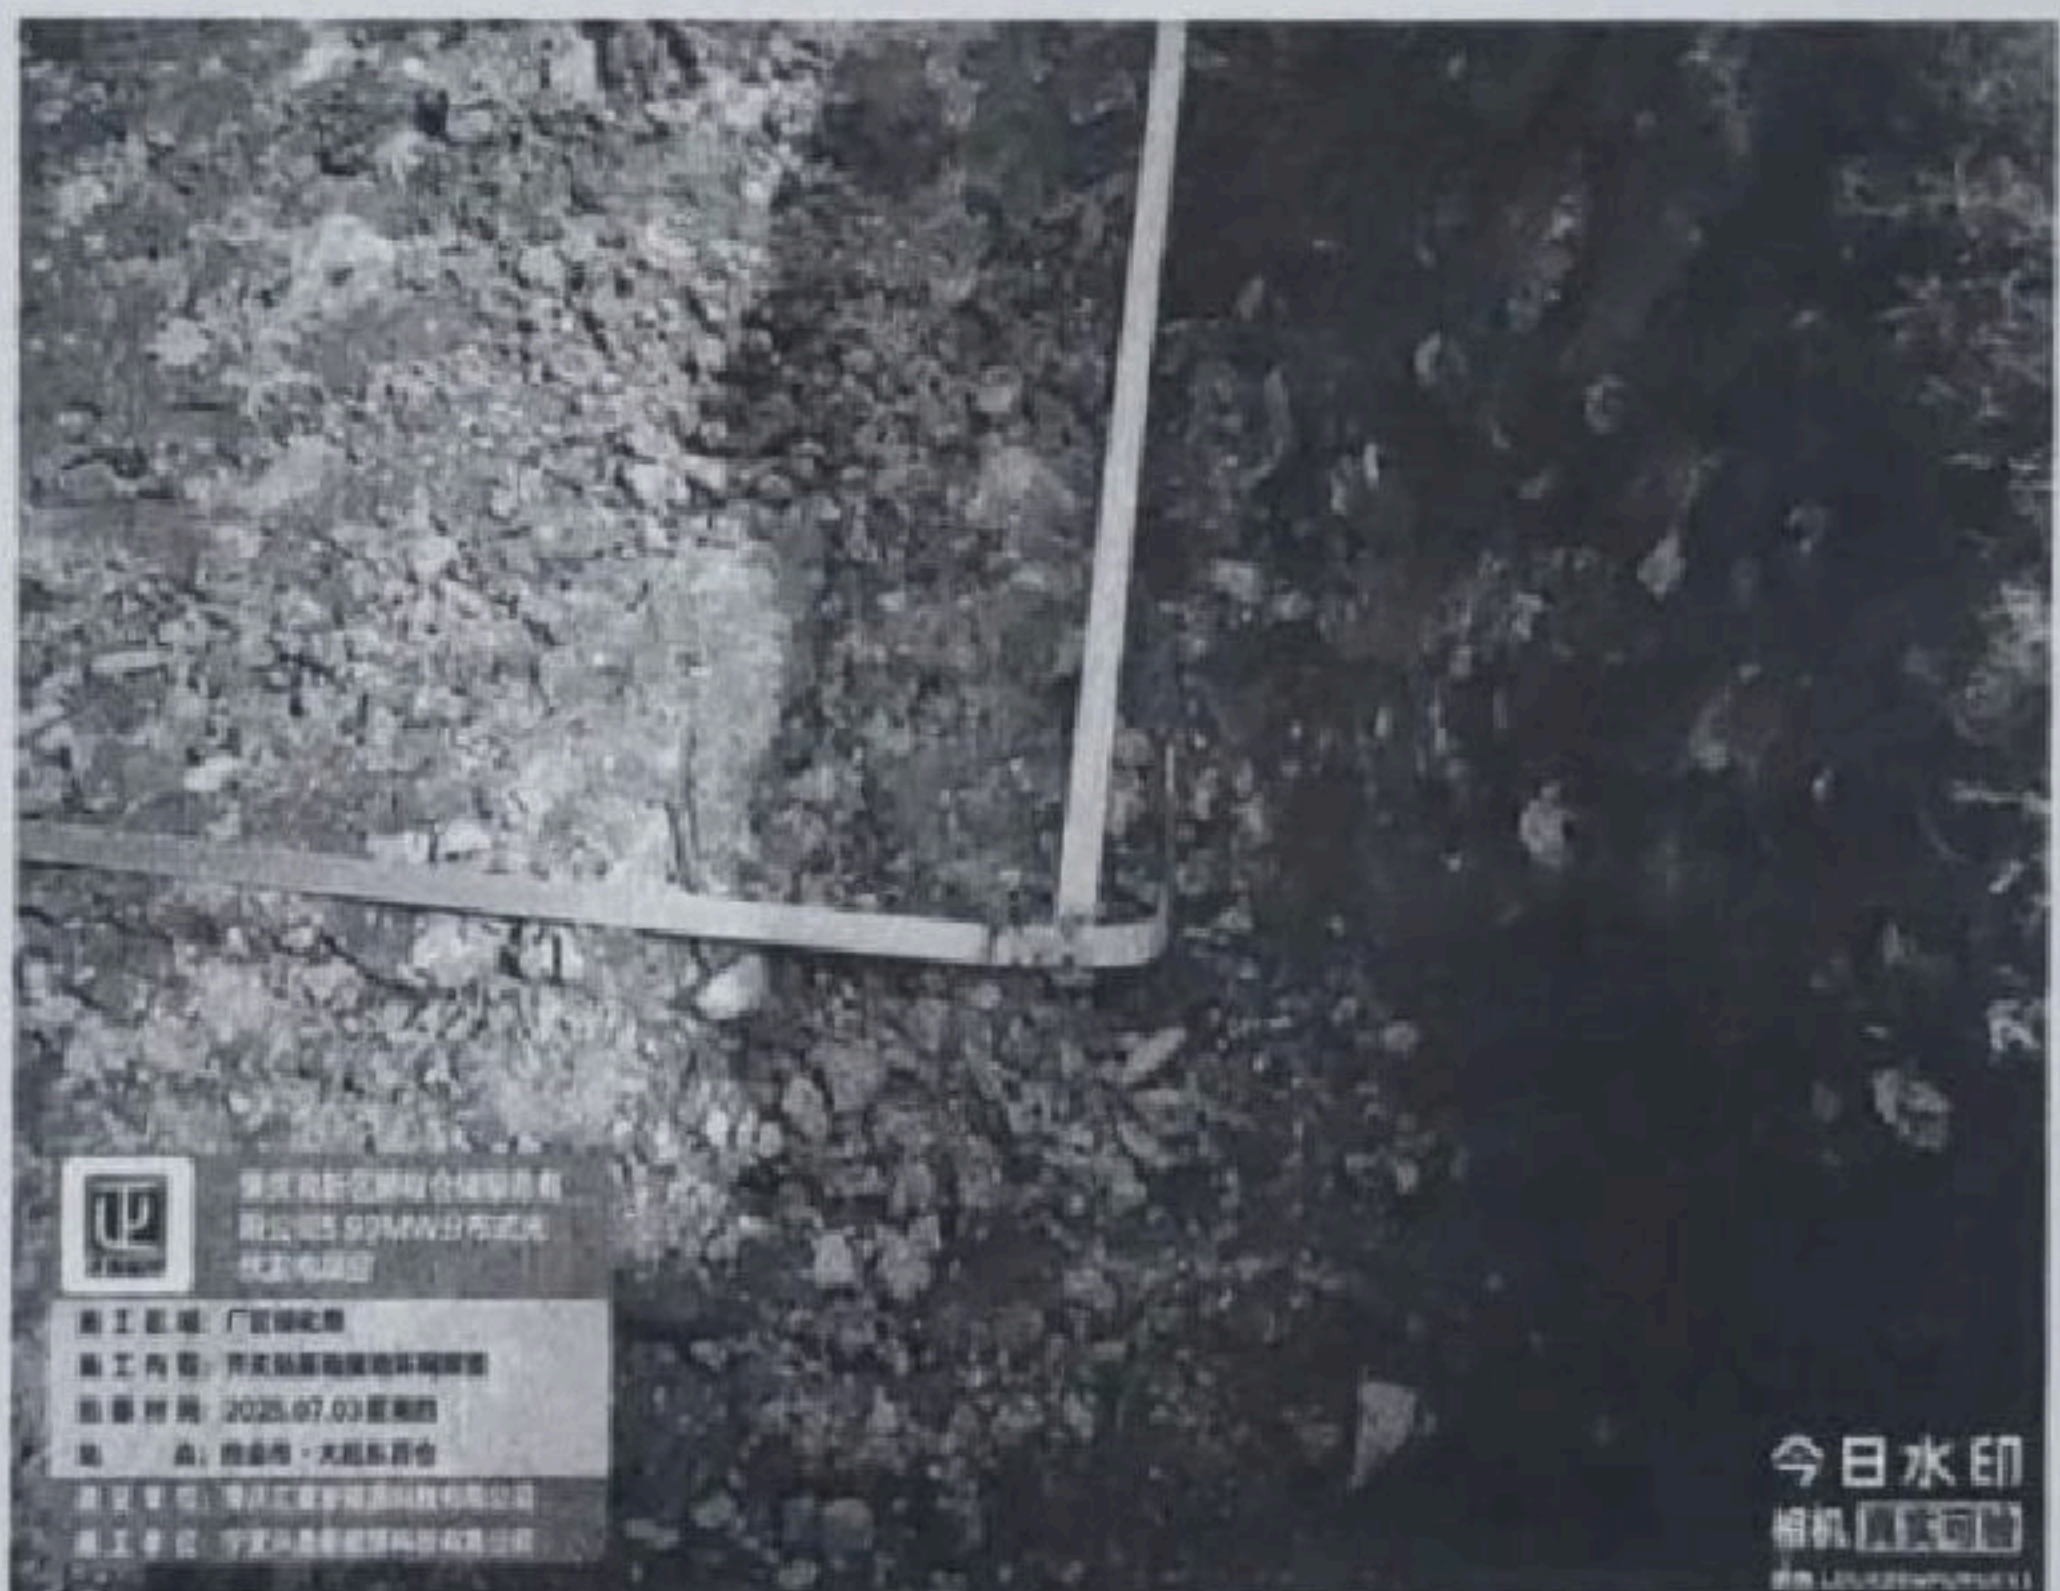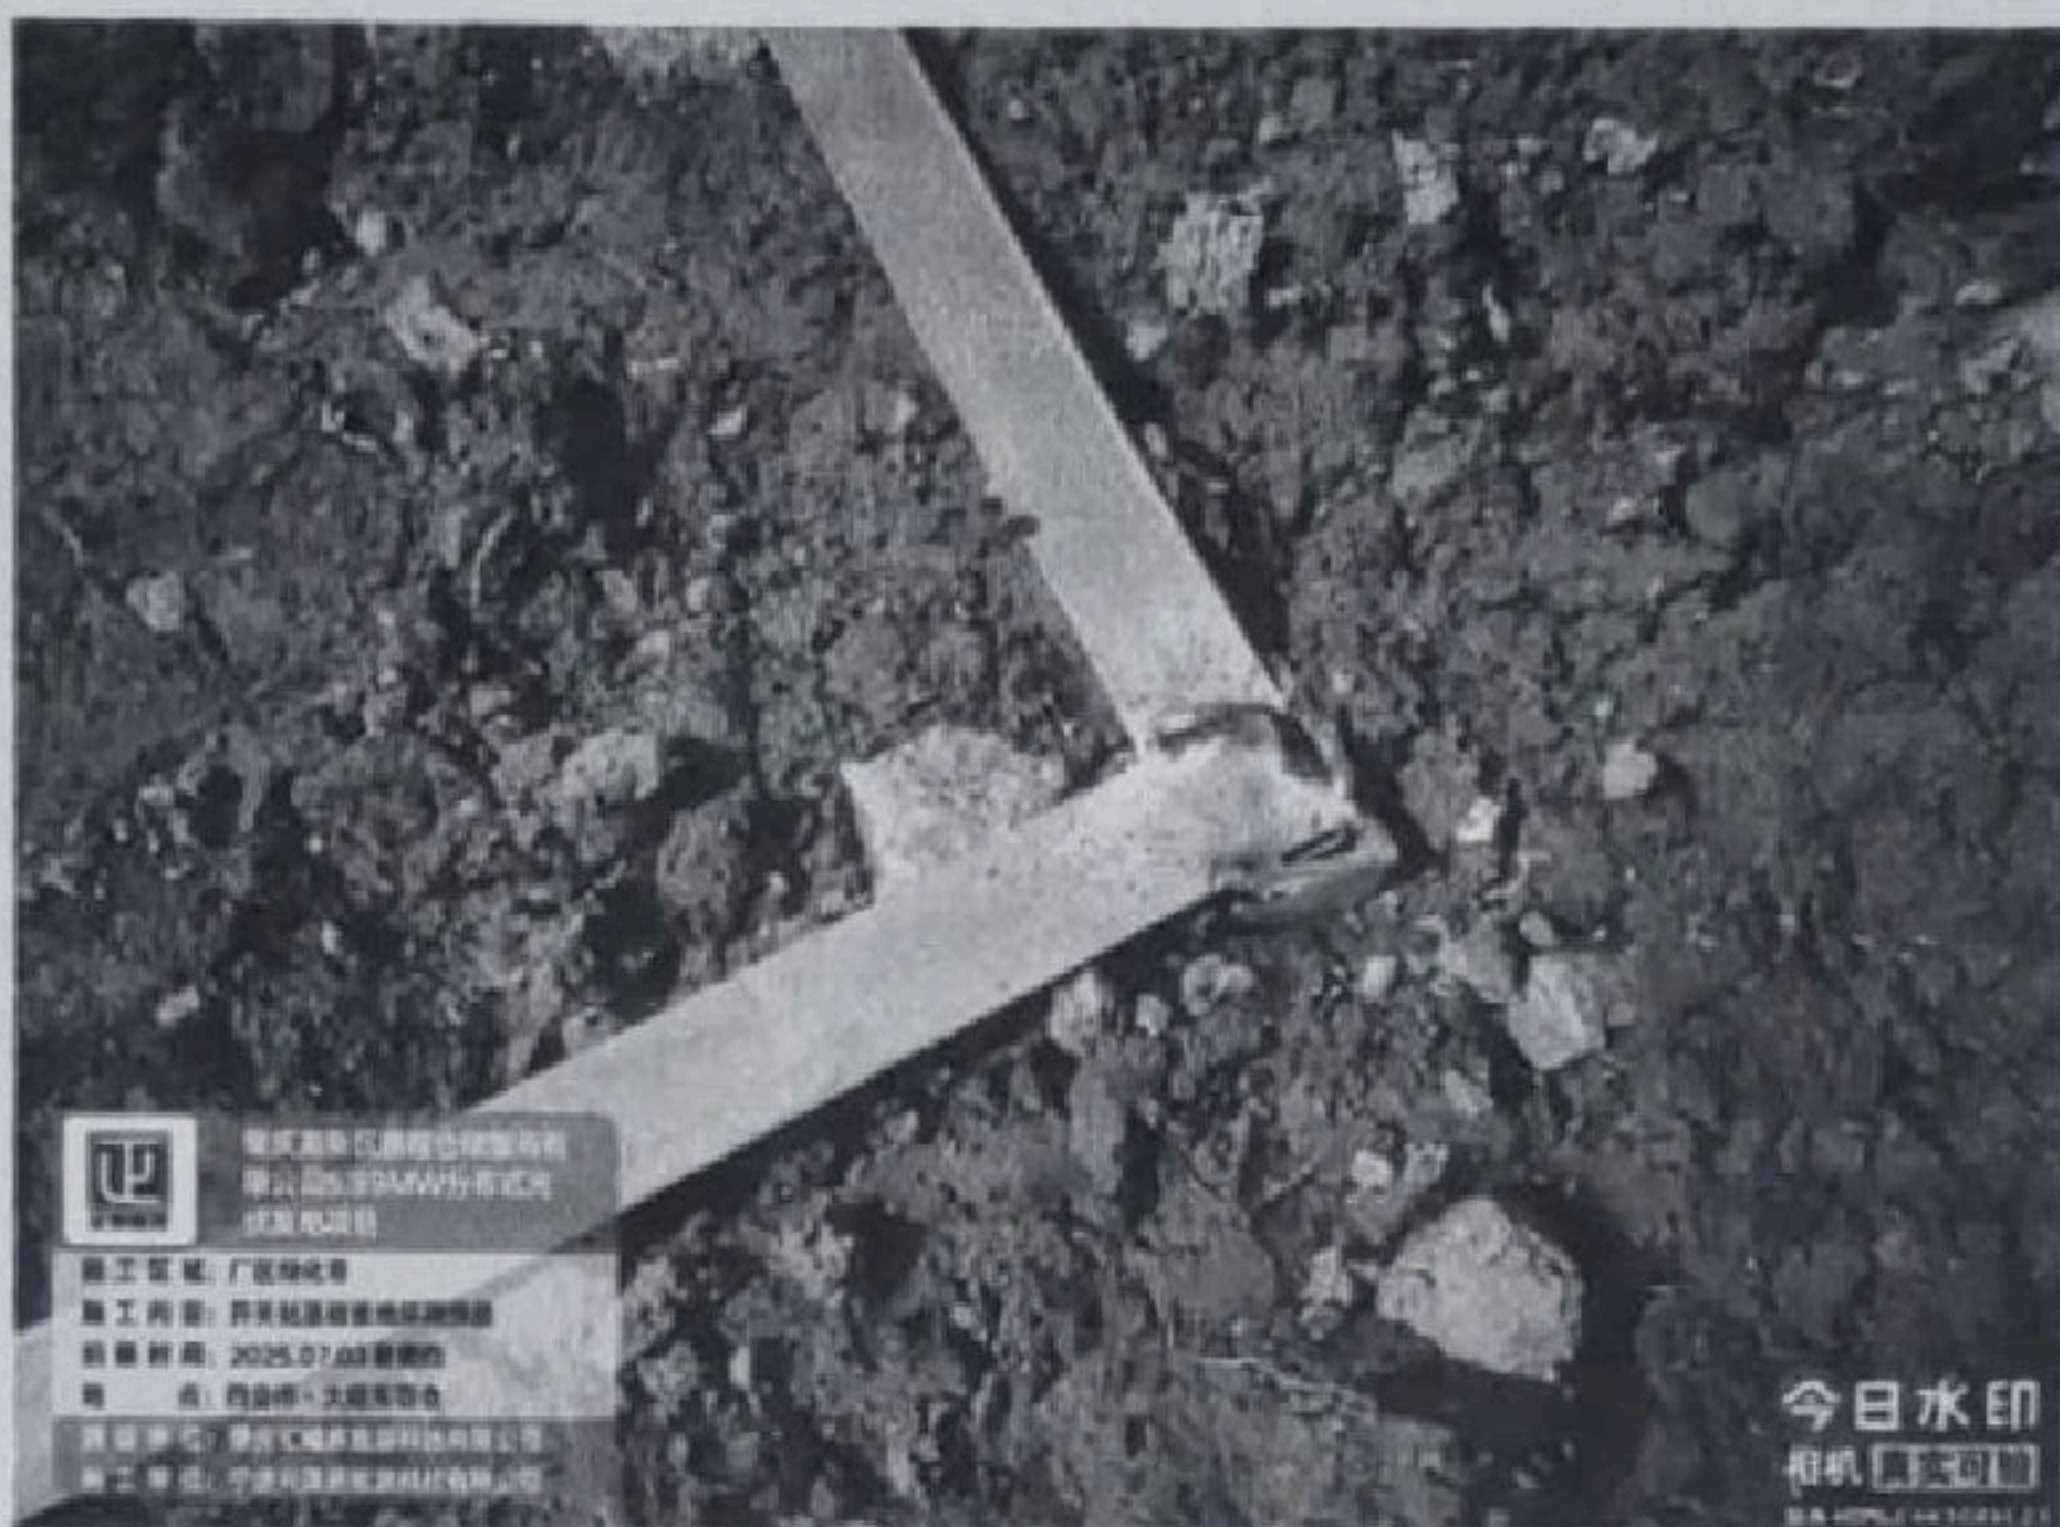

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备
