

整改回复单

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MW 分布式光伏发电项目

编号：NBXJ-QWHTY-HFD-20220818

主送：常州正衡电力工程监理有限公司-宁波前湾新区海拓园 7.0MW 分布式光伏发电项目部


抄送：宁波海晟能源发展有限公司-宁波前湾新区海拓园 7.0MW 分布式光伏发电项目部

事由：关于电缆沟和储能设备基础底部土建施工质量整改事宜

内容：2022 年 08 月 16 日-17 日，监理人员在对宁波前湾新区海拓园 7.0MW 分布式光伏发电项目 3#配电房至主工作井电缆沟施工部位和 2#储能设备基础基坑底部垫层施工部位进行巡视和安全检查。发现现场存在以下问题：1、2#储能设备基础基坑底部垫层施工表面粗制，平整度不够，石子裸露较多。2、3#配电房至主工作井电缆沟底部钢筋绑扎不符合图纸设计要求，横排钢筋绑扎间距超过图纸要求；横排钢筋两端没有进行弯曲，弯钩方向没有朝上。

我施工方接到通知后，立即安排施工人员根据图纸及规范要求，对储能设备基坑底部垫层进行了平整、补浆工作。对电缆沟底部的绑扎钢筋进行修整，增加钢筋两端折弯，调整钢筋间距。

上述整改内容于 2022 年 08 月 18 日 12:00 前整改完毕，今后施工中，严格按照图纸及规范要求施工，杜绝此类质量事件再发生。请监理方进行复验。

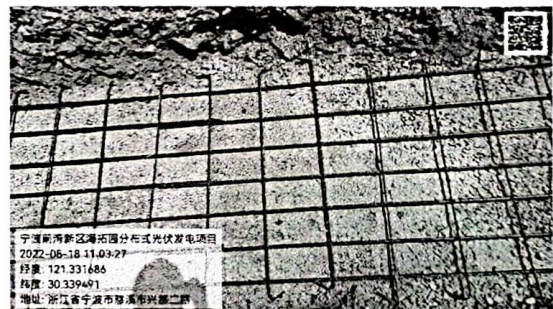

施工项目部（章）

项目经理：

日期：2022 年 8 月 18 日

注：本表一式 叁 份，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存 贰 份。

