

监 理 通 知 单

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目


编 号：ZHJL-QWHTY-TZD-20220817

主送：浙江信基建设有限公司-宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目部

抄送：宁波海晟能源发展有限公司-宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目部

事由：关于电缆沟和储能设备基础底部土建施工质量事宜

内容：2022 年 08 月 16 日-17 日，我监理人员在对宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目 3#配电房至主工作井电缆沟施工部位和 2#储能设备基础基坑底部垫层施工部位进行巡视和安全检查。发现现场存在以下问题：1、2#储能设备基础基坑底部垫层施工表面粗制，平整度不够，石子裸露较多。2、3#配电房至主工作井电缆沟底部钢筋绑扎不符合图纸设计要求，横排钢筋绑扎间距不符合图纸要求；横排钢筋两端没有进行弯曲，弯钩方向没有朝上。为消除隐患要求你部在 2022 年 08 月 18 日 17:00 前加以整改到位，报监理验收后方可进入下一道工序施工。并给予书面回复，确保在以后作业时杜绝质量事件发生。

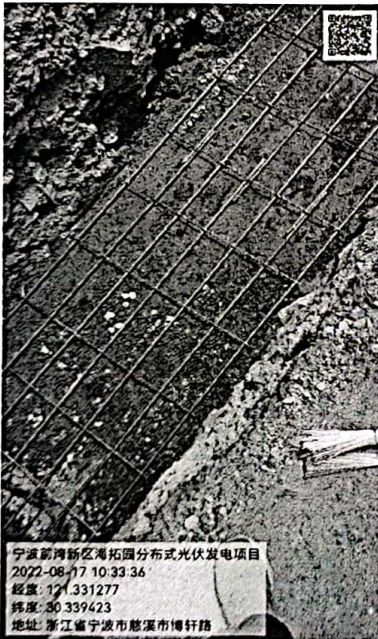

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师

日期：2022 年 08 月 17 日

注：本表一式 叁 份，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存 贰 份。
