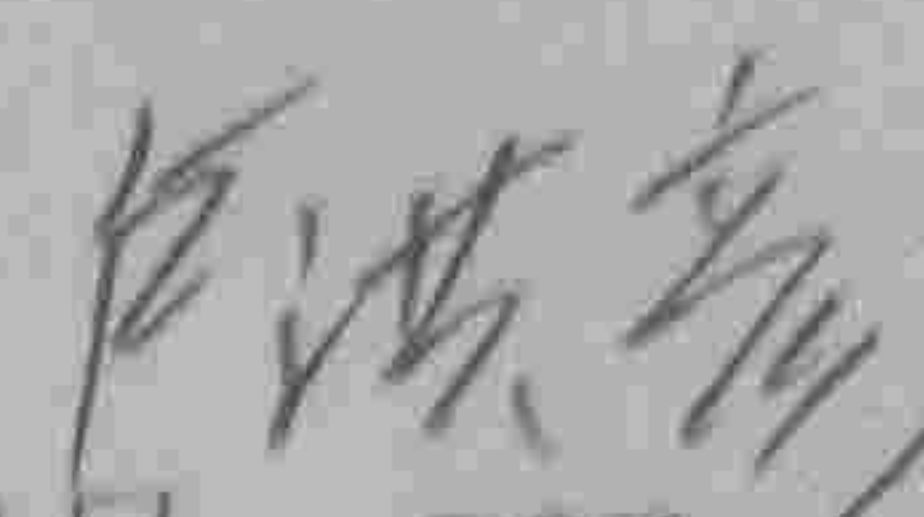


会议纪要

签发: 
编号: 007

工程名称: 大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

会议地点	项目部会议室	会议时间	2016 年 8 月 4 日
会议主持人	高阳	参加人员	见附表

会议主题: 关于安全文明施工、质量、进度的事宜

会议内容:

施工单位:

- 1、截止今日组件共计安装完成 370 组, 下周计划安装 250 组;
- 2、汇流箱支架 2016 年 8 月 5 日到场;
- 3、目前天气炎热、安装工作面不够是影响安装进度的主要原因;
- 4、升压站基础、箱逆变基础保证在 2016 年 8 月 15 日前完成;
- 5、8 月 3 日两名斗殴当事人明日中午前保证让其离场;
- 6、支架间接地焊接在钢立柱上, 焊接时易焊穿立柱破坏立柱整体受力结构及周围镀锌层, 建议设计变更, 焊接在钢立柱底座上;

监理单位:

- 1、场区支架组件安装、汇流箱安装、光伏缆布线、场区接地建议交叉施工;
- 2、综合楼及升压站资料严重滞后, 8 月 7 日前必须做到与工程进度同步并报审;
- 3、综合楼处现场施工有光膀和穿拖鞋情况、已拍照留底, 后期如再次发现将一并进行经济处罚, 施工单位要引起重视及加强安全文明施工教育;
- 4、箱逆变定位放线至今, 仅基础开挖两基, 必须加快箱逆变基础施工;

业主单位:

- 1、近期高温天气炎热, 现场施工要做好防暑工作并配备防暑药品;
- 2、场平推土以支架安装为侧重点, 场平施工要积极配合支架组件施工;
- 3、斗殴的两名当事人, 不允许在本工程施工, 必须做请退处理, 如再次发生打架事件, 该班组直接清退;
- 4、组件安装进度与每周计划进度相差巨大, 必须做到计划与实际进度一致;
- 5、综合楼、升压站、8 个箱逆变基础 8 月 25 日前必须全部完成;
- 6、各班组生活区域必须要有垃圾集中扔放点, 不允许垃圾随处乱扔情况;

5、后期第一台汇流箱安装接线完成后，及时通知监理、甲方到场确认是否符合合格，合格后将以该台汇流箱为样板，照样安装；

上次会议问题落实情况：相关安全警示牌未落实到位；

主送单位	大安市爱康新能源开发有限公司		
抄送单位	吉林白城地建建筑工程股份有限公司松原分公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016 年 8 月 13 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

工程名称: 大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

会议日期 2016年 8月 4日

[illegible]
