



监理例会会议纪要

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目 编号：20171208

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017 年 12 月 08 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李保君
会议议题	安全、质量、进度		

会议内容：

一、总包单位：

1、上周情况：

- 1、消防水池顶板及剪力墙浇筑完成；
- 2、综合楼垫层地圈梁钢筋绑扎安装完成；
- 3、光伏区 $3 \times 150\text{mm}^2$ 高压电缆敷设 477m；
- 4、光伏区 $1 \times 4\text{mm}^2$ 电缆敷设完成 153568m；
- 5、光伏区逆变器安装 124 台；
- 6、光伏区 SC32 管安装 86 根；
- 7、光伏区 $3 \times 240\text{mm}^2$ 高压电缆敷设完成 753m

2. 下周施工计划：

- 1、综合楼总体完成 60%；
- 2、光伏区总体完成 90%；

二、监理单位：

- 1、检查发现光伏区电缆桥架有变形、安装不牢固现象，要求总包单位进行全面检查，避免施工过程中发生安全质量事故；



监理例会会议纪要

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWP 渔光一体光伏发电项目 编号：20171208

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017 年 12 月 08 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李保君
会议议题	安全、质量、进度		

会议内容：

一、总包单位：

1、上周情况：

- 1、消防水池顶板及剪力墙浇筑完成；
- 2、综合楼垫层地圈梁钢筋绑扎安装完成；
- 3、光伏区 $3 \times 150\text{mm}^2$ 高压电缆敷设 477m；
- 4、光伏区 $1 \times 4\text{mm}^2$ 电缆敷设完成 153568m；
- 5、光伏区逆变器安装 124 台；
- 6、光伏区 SC32 管安装 86 根；
- 7、光伏区 $3 \times 240\text{mm}^2$ 高压电缆敷设完成 753m


2. 下周施工计划：

- 1、综合楼总体完成 60%；
- 2、光伏区总体完成 90%；


二、监理单位：

- 1、检查发现光伏区电缆桥架有变形、安装不牢固现象，要求总包单位进行全面检查，避免施工过程中发生安全质量事故；


柱钢筋搭接使用点焊不符合规范要求

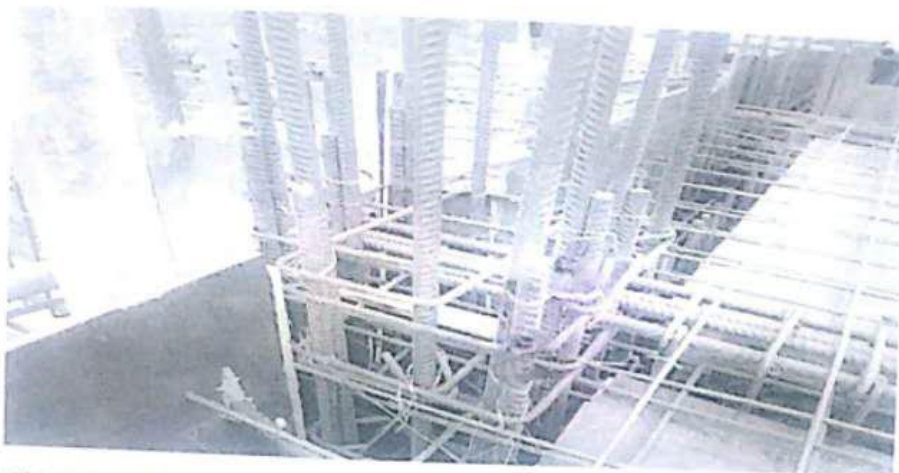


顶部面筋搭接长度不符合规范要求

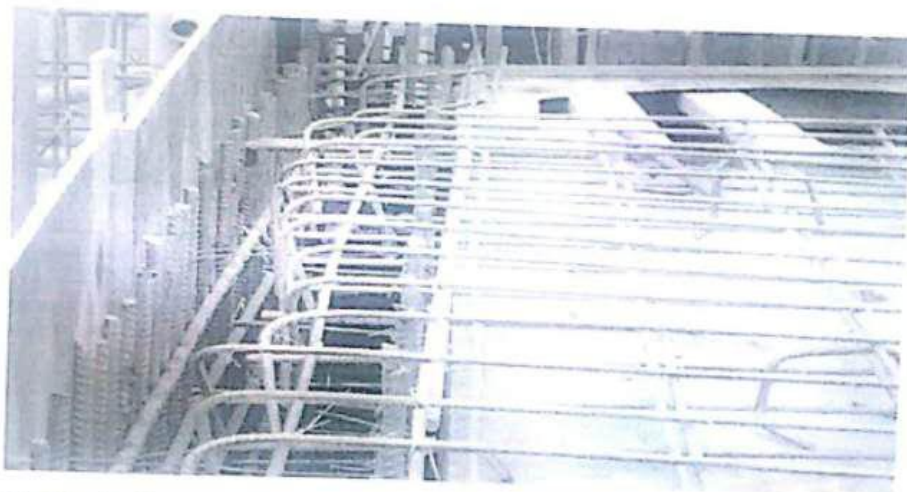

侧墙竖钢筋尺寸不够、无弯钩锚固

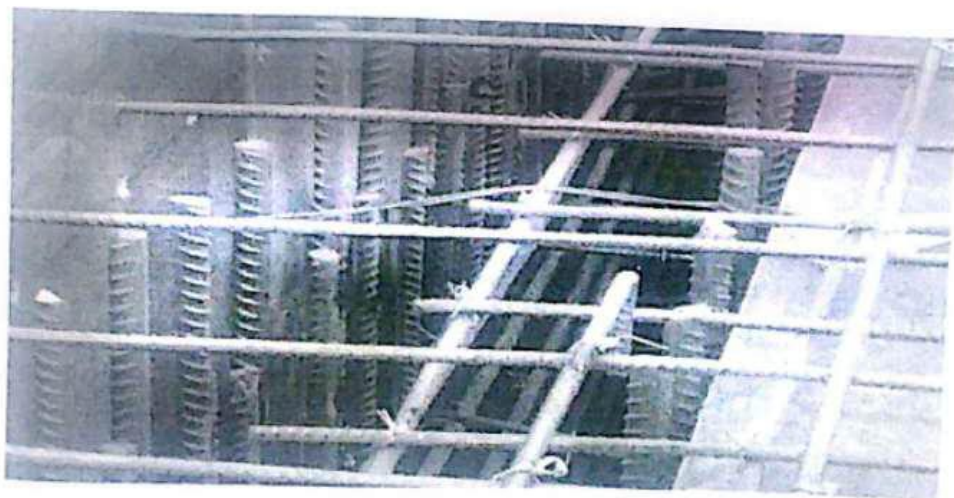

顶部面筋缺少横向钢筋

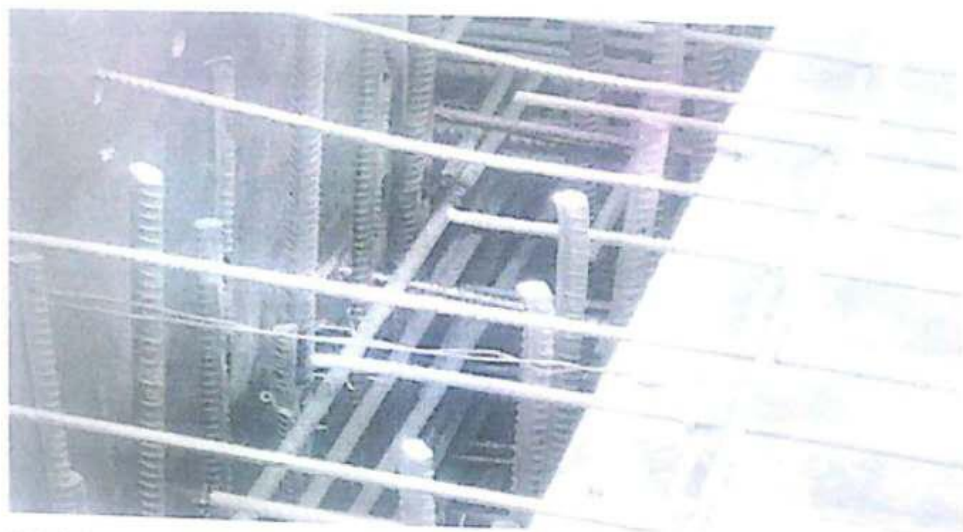

模板未固定牢固



模板安装缝隙过大

