

 正衡监理 ZhengHangSupervision	项目名称	山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目
	文件名称	会议纪要

会 议 纪 要

项目名称：山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号：LH-010
签发：徐彪

会议地点	寿光项目会议室	会议时间	2017 年 06 月 07 日
会议主持人	徐彪		会议签到表附后
会议主题： 工程进度、质量、安全事项。			
1、会议简要： 1、检查施工过程资料不及时报验状况，针对存在的情况提出警告。2、要求总承包方尽快提供外线工程图纸。3、抢进度的前提是确保工程质量和安全，做到安全零事故。			
上次会议问题落实情况： 会议上所提出的事项已完成或已解决。			
会议内容： 一、施工单位： 余彬： 1、光伏组件安装已完成 111242 片，累计完成 94.70%。 2、光伏电缆安装已完工。 3、外线施工 3100 米，已完工。 4、调试工作已完成 95%。 二、监理单位 张喜君： 1、汇流站控制室土建施工抓紧时间进行收尾。 2、抓紧时间合理安排工作确保 6 月 30 日工作节点完成。			

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目
	文件名称	会议纪要

徐锡强:

- 1、自 6 月 2 号发现问题后自检不力，许多事情没落实。
- 2、满足送电要求，进行消缺。
- 3、接地变潮湿问题处理。

徐文平:

- 1、理货区屋顶上的临边防护网需要整理。
- 2、登高工具竹梯有很多已经爆裂，存在安全隐患。
- 3、屋顶上的施工垃圾要及时清理干净。
- 4、夏季防暑措施要做到位。
- 5、安全第一，施工单位在保证施工质量、突击施工进度度的同时，必须高度重视施工安全。

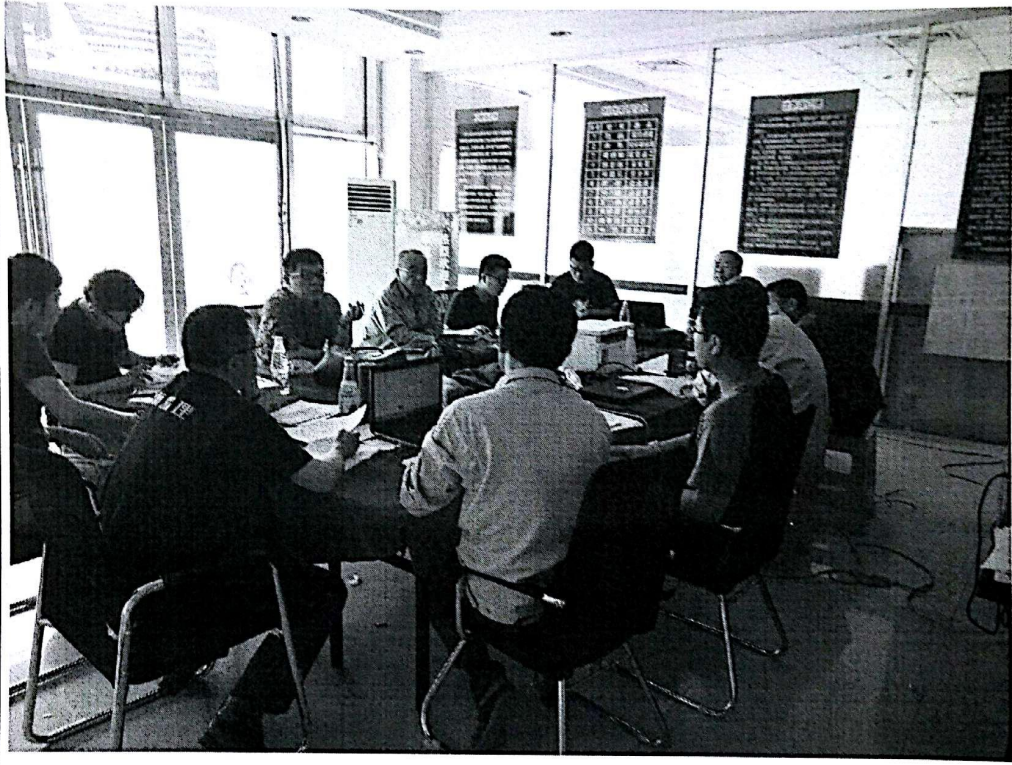
徐彪:

- 1、带电调试提供专项方案，注意安全。
- 2、泽星施工队要按现场需要，调整人员设备。
- 3、土建按要求的时间节点完成所有工作量。
- 4、按时间节点要求，完成所有验收资料准备工作。

三、业主方:

李纪伟:

- 1、带电调试人员要注意安全。
- 2、6 月 27 日前所有工作全部到位。
- 3、扫清一切障碍，为 6 月 30 日并网让路。

 正衡监理 Zhengheng Supervision		项目名称	山东寿光农产品物流园屋顶30MWp光伏发电项目	
		文件名称	会议纪要	
现场开会情况 				
主送单位	寿光森爱新能源有限公司 泰州敬道电力工程有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	 2017年06月08日	

监理例会会议签到表

时间2017年6月7日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
李伟	电新源			
徐君立	常州正衡	总代	18605527881	
徐文平	常州正衡	安全监管	1391276971	
徐文平	常州正衡	安全	13826594172	
张喜春	正衡监理	土建专业	18629981879	
李伟	泰州敬道		1529599595	
刘屏鑫	敬道		18591327884	
成霞	敬道		15307209050	
余彬	泰州敬道		13675205475	
刘玲	正衡监理		18935610799	
陆建忠	常州敬道		13601479826	
常友斌	常州正衡	资料员	13663807545	
