

会议纪要

工程名称：南京熊猫服务业光伏发电 1.54MWp 子项目

编号：TWHJ-CC003-JXMBBZH-020


会议地点	项目部办公室	会议时间	2017 年 12 月 22 日
会议主持人	田同有		
会议主题： 施工前期施工安全、质量、进度开展情况，下周施工重点安排。			
会议内容 监理单位： 本周施工情况： 一：南京熊猫电子 3MWp 子项目： 1、E02 号楼面通讯线整改已完成（原与电缆在 100x100 桥架内同步铺设，应单独线管敷设）。 2、楼面（E01-E05）电缆桥架加宽（部分段落，原 100x100 更换为 200x100）整改完成。 3、光伏组件镀锌螺栓更换不锈钢螺栓整改完成 60%（12 月 12 号开始）。 4、楼面光伏组件清洗施工安装已完成（E01-E05 号楼）。 5、控制室（动力部）一次性电力模拟图完成。 6、E01-E03 号人字梯基础及出入道路混凝土硬化已完成，人字梯进口处安全防护（不锈钢门）已安装制作完成。 二：南京熊猫现代服务业光伏发电 1.54MWp 子项目： 进度： 1）、E01、E02、E04、E05、E06、E07 号楼面光伏支架及光伏组件已安装完成。 2）、E01、E02 号楼面光伏支架、光伏支架已于 12 月 18 日安装完成。 3）、E04、E05、E06、E07 楼面电缆桥架安装制作完成。 4）E04、E05、E06、E07 楼面光伏组件连接线已完成制作、敷设。 5）、场区直埋光伏电缆、通讯线铺设完成（电缆沟已铺沙）。 6）、箱变、一次、二次舱防水处理完成，土方回填夯实完成，符合设计要求。 7）、箱变、一次、二次舱电缆头制作、防雷接地焊接完成，符合设计要求及规范。 8）、光伏支架与光伏组件安装较慢，未按周计划进度完成安装施工。 9）、电缆桥架制作进度较慢。组件线连接较慢，未按周计划进度完成安装施工。 10）、楼面接地未开始施工，未按周计划进度完成安装施工。 下周工作安排： 1、E01-E07 号楼面于 12 月 27 日防雷接地完成安装。			



2、箱变、控制室一二次舱基础墙面抹灰。 3、E01-E07 号楼电缆铺设完成。 4、场区直埋电缆铺沙、盖砖、土方回填，预埋电缆桩完成。 5、光伏组件水清理系统安装开工。 6、箱变、控制室一二次舱地面混凝土硬化，围栏施工开工。 7、竣工资料完善。 8、格把控现场安全及质量，确保机械、人员安全零事故。 时清理施工现场材料垃圾，保持文明施工。 业主单位（李晨）： 1 严格按图施工，确保施工质量达到技术条款要求。 2 确实落实监理部所提出的各项问题。 3 1.54MW 施工计划安全，安全三级教育。 总包单位（胡健）： 1：对业主方、监理方提出的施工现场问题一定落实，安排到各施工班组。 2：后续图纸进行完善。 3：施工过程严格注意安全事项，安全帽、劳保用品穿戴到位施工，安全员履行职责，发现问题立即整改，对屡教不改的施工人员进行撤场处理。			
主送单位	南瑞电力设计有限公司		
抄送单位	南京彩虹新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司熊猫电子、南京熊猫服务业发电监理项目部	发文时间	2017 年 12 月 22 日

附：会议照片及会议人员签到表



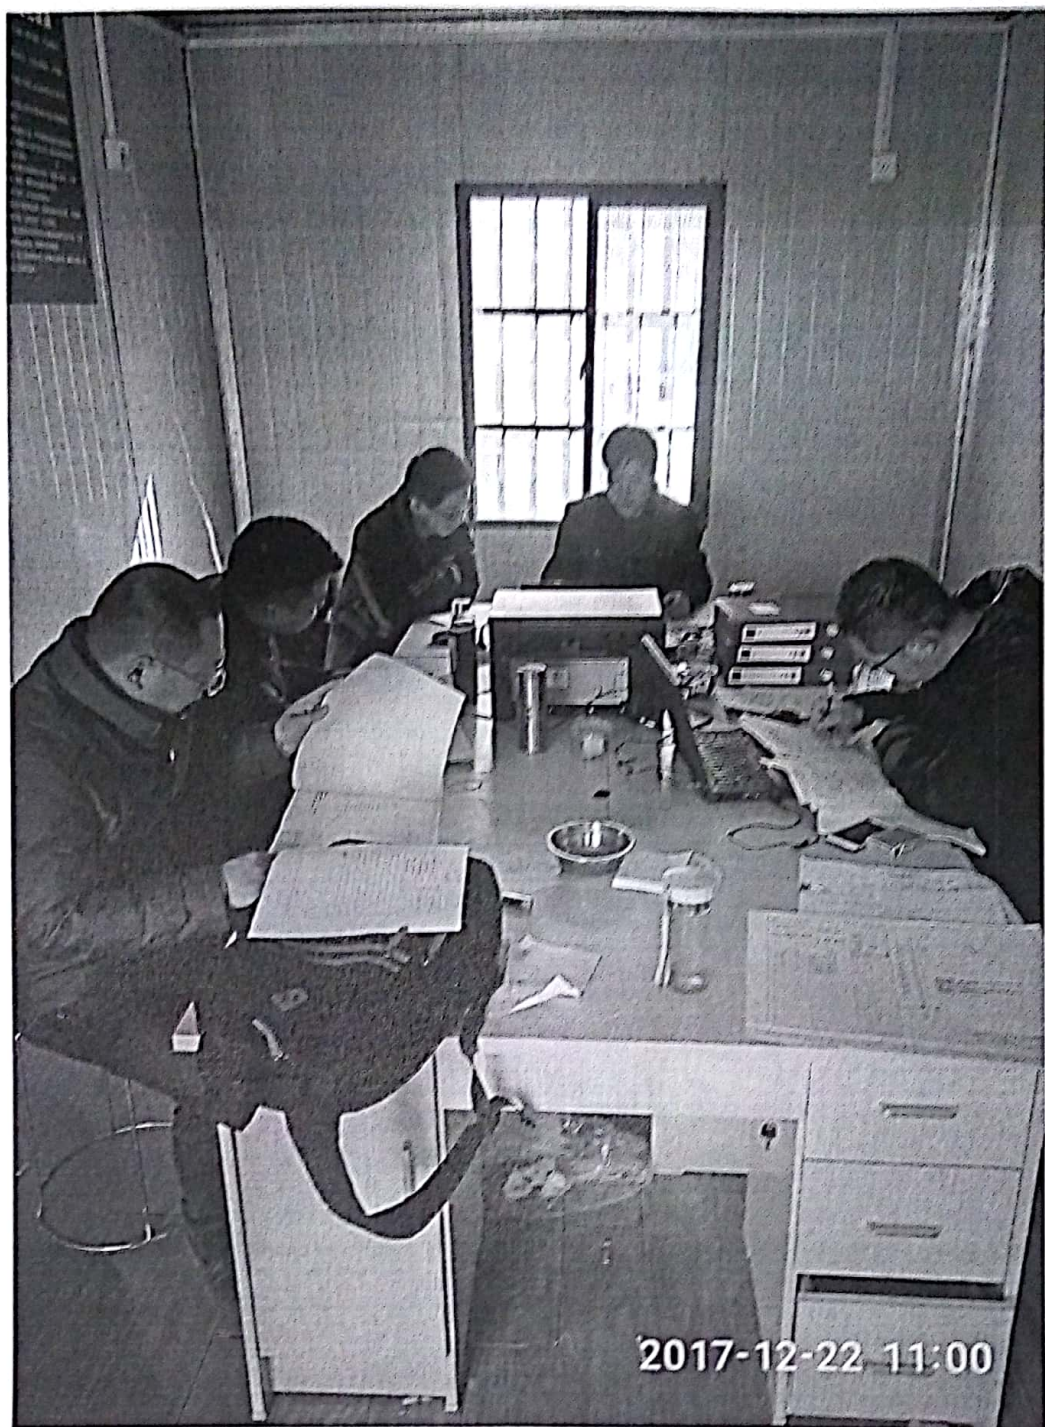

会议人员签到表

日期: 2017.12.22.

姓名	单位名称	职务	联系电话	备注
田国友	正街监理	电务所长	15978737925	
李成林	南瑞	项目负责人		
李晨	彩虹			
李林	江建			
张永平	南瑞	安全员	13057543665	

