


会议纪要

工程名称：南京熊猫电子、熊猫现代服务业屋面分布式光伏电站项目 编号：TWHJ-GC003-JXMBBZH-012

会议地点	现场项目办公室	会议时间	2017年10月10日
会议主持人	田同有		
会议主题：并网前施工、调试工作汇报及并网工作安排			
会议内容 监理单位（田同有） 本周监理检查工作汇报： 1、自10月1日起施工进度缓慢，未达到上周进度计划，严重滞后（接连几天下雨，无法施工，双节期间，施工人员休假，人员减少）。 2、E02号楼面缺少光伏支架前后立柱已进场，安装完成，经检查符合设计要求。 3、E01至E05号楼面组件接地连接完成40%，要求二日内完成（10月12日）。 4、E01至E05号楼面电缆桥架盖板完成60%，要求二日内完成（10月12日）。 5、控制室内防火封堵、挂牌、未完成，要求二日内完成（10月12日）。 6、E01至E05号楼面未有逆变器（62台）、汇流箱（总计12台）防雷接地施工图纸，请总包方（南瑞电力设计有限公司）尽快联系设计部门（南瑞电力设计有限公司）尽快出图。 7、调试报审资料严重滞后，望10月12日下午五点之前报验监理部。 并网期间工作安排 1、本日（10月10日）开始成立项目并网工作小组： 组长：刘阳阳 副组长：胡健、田同有 组员：吕姣、苏利、张永平 2、建设方负责人、承建方负责人要密切配合，充分协调好厂区物业方以及其它合作单位关系，确保顺利并网成功。 3、并网期间由组长同一指挥，同一安排、同一调度。 4、各分项负责人并网前（10月12号）要加班加点完成各分项施工任务。 业主单位（刘阳阳） 1、并网前各项施工必须完成，确保具备并网一次成功。 2、核对、检查施工进度及调试资料完成情况。 3、对南京彩虹集团运维部所提出的施工安装问题整改情况进行了查验、落实。 4、检查、审阅E01至E03号楼外墙人字梯图纸及工作量，并提出了有益建议，方便后期电站运动维人员楼面零部件更换通行。 总包单位（胡建）			



- 1、需落实监理方及业主提出的问题，并安排施工人员进行整改。
- 2、及时完善竣工资料报审。
- 3、施工时注意施工安全，并做好技术交底。

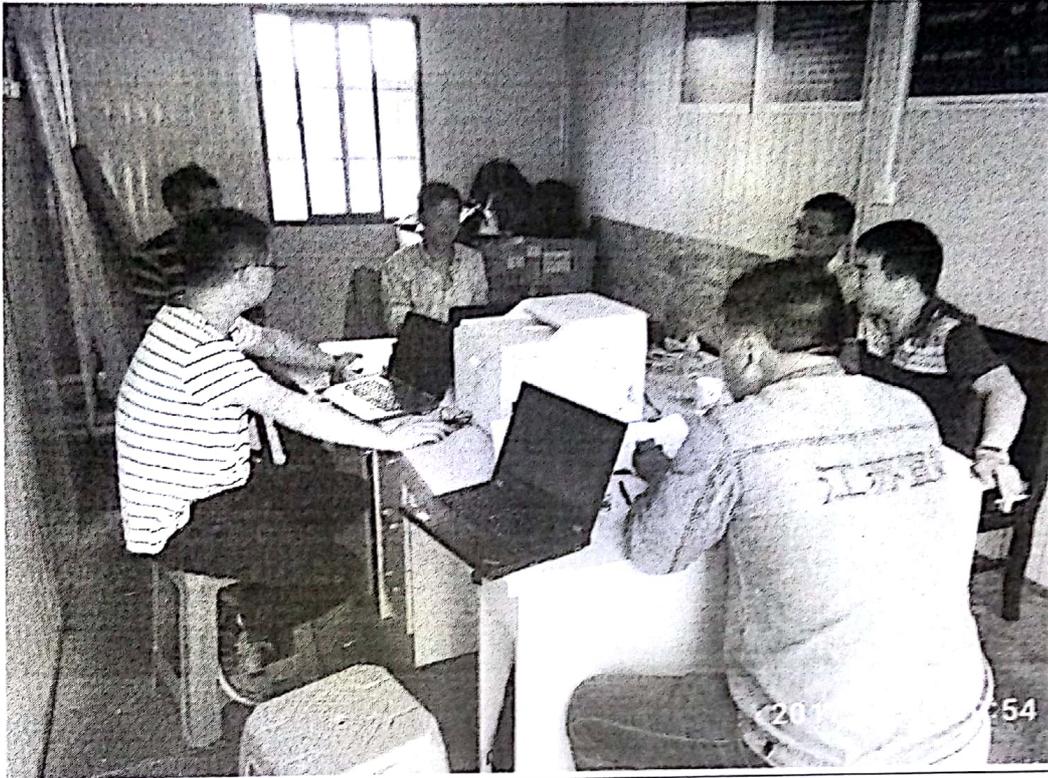

主送单位	南瑞电力设计有限公司		
抄送单位	南京彩虹新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力监理工程有限公司、南京熊猫电子屋面分布式光伏发电监理项目部	发文时间	2017年10月10日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。一式3份



