

 正衡监理 Zhengheng Supervision	项目名称	滕州市优上新能源有限公司 5.6MW 分布式光伏电站项目
	文件名称	会议纪要

会 议 纪 要

项目名称：滕州市优上新能源有限公司 5.6MW 分布式光伏电站项目



会议地点	滕州项目会议室	会议时间	2017 年 10 月 20 日
会议主持人	常庆斌	会议签到表附后	
会议主题：工程进度、质量、安全事项。			
会议内容： 一、施工单位： 一队： 1、2 号和 3 号屋顶除锈、放线工作完成，具备作业条件。 2、三个屋顶的脚手架安装作业完成。 3、1 号屋顶除锈工作完成了 30%。 4、下周预计屋顶开始安装支架以及箱变基础进行开挖。 二队： 1、加固材料已全部到场。 2、下周预计加固完成 10 根。 二、监理单位 1、各施工区域至少要配 1 名专职安全员。 2、施工机械（如吊车、升降机、起重机械、叉车等）周围必须要设置警戒线和警示标牌。 3、发电机周围要配备灭火器材。 4、施工单位的材料、构配件进场资料要及时报验。			



正衡监理
Zhengheng Supervision

项目名称

滕州市优上新能源有限公司 5.6MW 分布式
光伏电站项目

文件名称

会议纪要

- 5、施工机械资质及其相关的施工人员资质没有上报。
- 6、材料进场必须及时通知监理进行查验。
- 7、仓库物资摆放整齐、分类、设标牌，做好安全预防工作。
- 8、每道工序完成后必须自检自验后，报监理部查验后方可进行下道工序。
- 9、加大安全管理力度。
- 10、完善进度计划。
- 11、各施工队要做好安全巡视记录。

三、业主方：

- 1、目前工程项目资料以四川信美公司的格式为主。
- 2、预计本月 25 日左右进行图纸会审。



正衡监理
Zhengheng Supervision

项目名称	滕州市优上新能源有限公司 5.6MW 分布式 光伏电站项目
文件名称	会议纪要

- 5、施工机械资质及其相关的施工人员资质没有上报。
- 6、材料进场必须及时通知监理进行查验。
- 7、仓库物资摆放整齐、分类、设标牌，做好安全预防工作。
- 8、每道工序完成后必须自检自验后，报监理部查验后方可进行下道工序。
- 9、加大安全管理力度。
- 10、完善进度计划。
- 11、各施工队要做好安全巡视记录。

三、业主方：


- 1、目前工程项目资料以四川信美公司的格式为主。
- 2、预计本月 25 日左右进行图纸会审。



正衡监理
ZhengHengSupervision

项目名称	滕州市优上新能源有限公司 5.6MW 分布式 光伏电站项目
文件名称	会议纪要

现场开会情况。

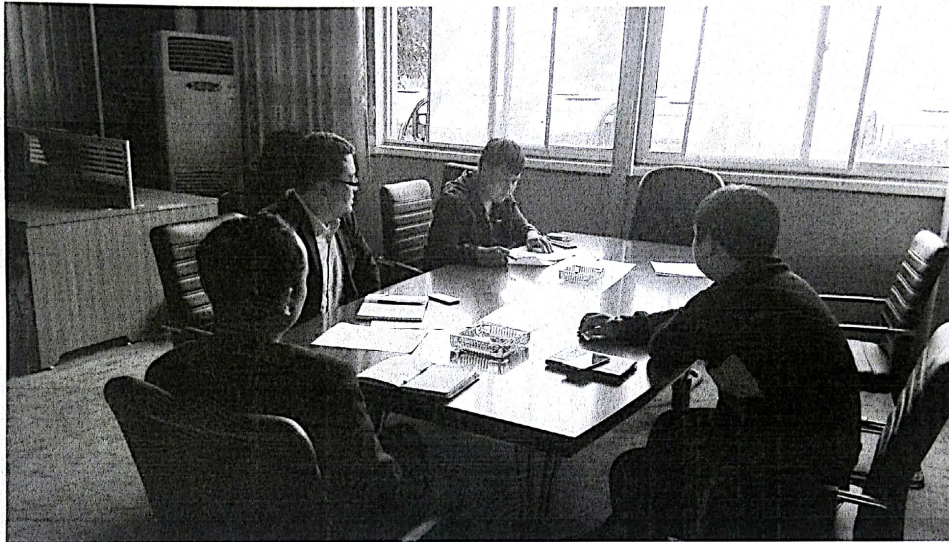

主送单位	滕州优上新能源有限公司 四川信美电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 10 月 20 日

监理例会会议签到表

时间: 2017年10月20日

[illegible]
