

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	滕州优上新能源有限公司 5.6MW 分布式光伏电站项目
	文件名称	会议纪要

会 议 纪 要

项目名称：滕州优上新能源有限公司 5.6MW 分布式光伏电站项目



会议地点	滕州项目监理项目办公室	会议时间	2017 年 11 月 17 日
会议主持人	常庆斌	会议签到表附后	
会议主题：工程进度、质量、安全事项。			
会议简要： 1、上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因。2、检查分析过程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实情况。3、检查分析质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施。			
上次会议问题落实情况： 1、施工单位的前期资料要尽快上报。（未完成） 2、施工单位的材料、构配件进场资料要尽快上报。（未完成） 3、计划下周 5 个箱变地梁浇筑完成。（未完成） 4、工程进度计划要尽快上报。（未完成） 5、其余问题均已完成或已解决。			
会议内容： 一、施工单位： 1、3 号厂房屋顶组件安装完成。 2、1 号厂房屋顶支架安装完成 95%。 3、2 号厂房屋顶组件安装完成 90%。 4、2 号厂房过道屋顶加固完成 60%。 5、箱变基础底板浇筑完成 1、4、5 号；3 号箱变消防管道改完；2 号箱变改挖基础且底层浇筑完成。 6、开关站筏板基础浇筑完成。			

 正衡监理 Zhengheng Supervision	项目名称	滕州优上新能源有限公司 5.6MW 分布式光伏电站项目
	文件名称	会议纪要

- 7、3 号厂房屋顶 1*4 电缆放线完成 70%。
- 8、计划下周 2 号厂房过道屋顶加固完工，1 号厂房过道加固完成 60%。
- 9、计划下周开关站基础完成。
- 10、计划下周 5 个箱变基础完成。
- 11、计划下周 1 号厂房屋顶支架完成。
- 12、计划下周三个厂房屋面组件安装完成。
- 13、现场场内业主阻工问题需要尽快协商解决。
- 14、现场施工人员不够需要尽快增加。

二、监理单位

- 1、施工单位的前期资料要尽快上报。
- 2、施工单位的材料、构配件进场资料要尽快上报。
- 3、下周 5 个箱变基础要完成。
- 4、实际进度要与工程进度计划各时间节点相符合。
- 5、新来加固人员要及时学习屋顶加固和临时用电的技术交底，并签字。
- 6、本周下发 1 份监理通知单，要求施工方及时进行回复。
- 7、要求总包单位给监理一套完整的纸质和电子版设计图纸。
- 8、监理项目部下发的联系单与通知单，施工单位要及时进行整改。其中监理通知单要求总包方尽快回复。
- 9、各区域的灭火器材要认真检验其合格性能。
- 10、本周没完成进度原因有场内业主阻工问题；施工人员不够。
- 11、甲方与场内业主尽快完成协商，以便解决阻工问题。

三、业主方：



正衡监理
ZhengHengSupervision

项目名称


滕州优上新能源有限公司 5.6MW 分布式光伏电站项目

文件名称

会议纪要

- 1、要求施工单位要及时清理自己所在区域的垃圾。
- 2、要求施工单位尽快增加施工人员。
- 3、要求施工单位必须把 5 个箱变基础及开关站基础做完。
- 4、要求施工单位做出一套完整的施工计划。
- 5、要求施工单位对于本周没完成的进度认真反省。

现场开会情况

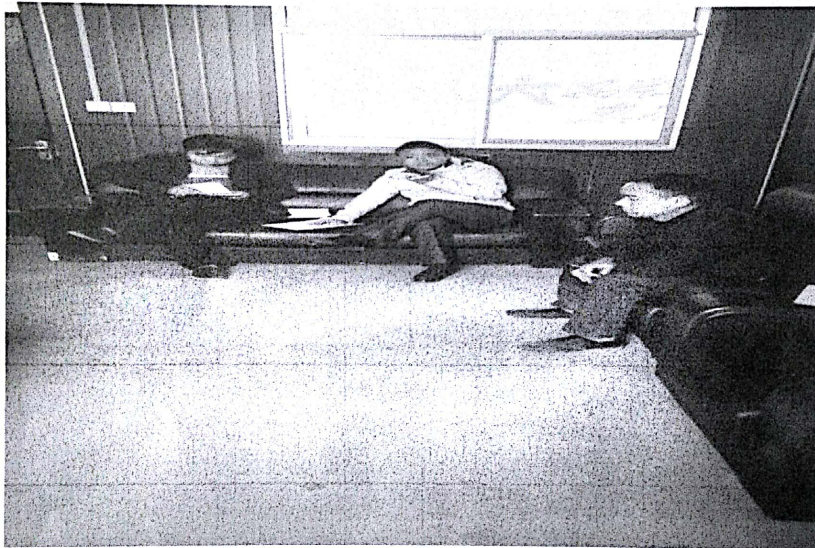

主送单位

滕州优上新能源有限公司
四川信美电力工程有限公司

发文单位

常州正衡电力工程监理有限公司

发文时间

2017 年 11 月 17 日

监理例会会议签到表

时间: 2017年11月17日

[illegible]
