

第十五次例会会议纪要

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZHJL-015

会议地点	办公楼一层 103 会议室		会议时间	2018 年 7 月 13 日
会议主持人	晏鸿飞		参加人员	见签到表
会议议题	进度、安全、质量			
单位	姓名	内容		备注
施工 单位	汤纪祥	1、组件吊装底下安全指挥人员玩手机，对此进行了现场教育；		
	彭为国	1、三期安全部围栏安装 9 天后完成（22 日），11#12#接地扁铁完成 50%；施工人员 4 人。 2、接地扁铁安装 10#车间屋顶完成，一期三期 10 后可以验收； 3、8#车间屋顶组件吊装完成；		
	余江华	1、8#车间通风管道处彩钢瓦更换，通风管道支架是否更换，更换时提前通知我们准备材料；彩钢瓦更换完成防水做法及谁做； 2、7#车间彩钢瓦更换 18 日完成交付彭为国； 3、明天开始安排人员更换 8#车间东头彩钢瓦更换；		具体事宜有陈俊华负责此事 此处下方是油漆车间不准动明火、要做好防护
监理 单位	黎建光	1、各工种施工要相互配合好，不准上道工序没有完成验收，进入下一道工序施工； 2、8#车间屋顶今天组件吊装，彩钢瓦涂层损坏修补未完成开始吊装，没有涂层的彩钢瓦几年就烂掉了，对吊装完成的 3 跨将记录到工程质量台账里面，请业主协助进行重点检查。 3、安全问题，临边作业和彩钢瓦更换一定要把安全带及安全帽都用上，安全用品是保护自己不是应付我们检查，端正施工人员心态； 4、光伏发电单元最后两个屋面安装，管理人员抓好安全质量关口，该报验的进行工序报验； 5、消缺根据现场情况做了一份消缺记录，按照此内容整改完成，消缺过程施工发现不符合要求的也一并消缺完成； 6、现场管理人员一定要注意安全质量管理，站好最后一班岗，不要让我们提出安全质量问题来找上好几家单位，到业主这里才能解决问题； 7、截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需要；		吊装完成几跨有我们安装时整改、未完成部分余江华做
	金涛	1、箱变内温度高，是否增加降温设备； 2、会议内容商定的事情，及时传达实施，不要参加会议人员知道不说，下面人员不知道不执行，造成不必要的损失；		会后现场检查箱变温度

晏鸿飞	<p>1、施工方介绍本周完成情况； 2、施工方介绍下周施工计划安排完成情况； 3、通风管道处彩钢瓦更换注意施工安全； 4、9#车间高跨底部返水在外面固定打胶，上面天沟损坏的怎么修，确定你们施工方案； 5、本项目以外通风管道更换、防水、漏雨、消缺整改及彩钢瓦更换等工程有陈工与施工方定方案； 6、三期高跨脊瓦、彩钢瓦更换提上施工日程；</p>	光伏发电项目完成在进行施工
江建松	<p>1、施工人员进场安全带一定用好，安排专职人员进行盯防； 2、组件吊装下面施工人员无安全意识，施工时玩手机，监理对吊装安全开罚款单； 3、高温天气中暑也不是小事，处置不当也可导致死亡，对安全施工要盯牢，该停工就停损失由施工队自己承担，一定要有这个安全意识 4、安全罚款一次 200 元，类推加倍重罚，正泰要管理好；罚款有意见直接找我； 5、彩钢瓦施工人员一定要有高空作业证，无证人员不准施工； 6、施工人员出现异常立即停止施工；</p>	会后开出

此次会议主要时间节点承诺安排：

- 1、7#车间彩钢瓦更换 18 日跟安装交接；
- 2、做好安全工作，安全罚款有意见找江总；
- 3、光伏发电项目以外工程，施工对与陈俊华订方案；
- 4、接地扁铁 10 日（7 月 23 日）可以验收，三期安全国栏安装 9 日（7 月 22 日）完成；

浙富控股富春水电厂房 5.1MWp 分布式

光伏发电项目监理部

2018.7.13


业主项目经理签字：



总包负责人签字：

陈银钦

2018.7.15

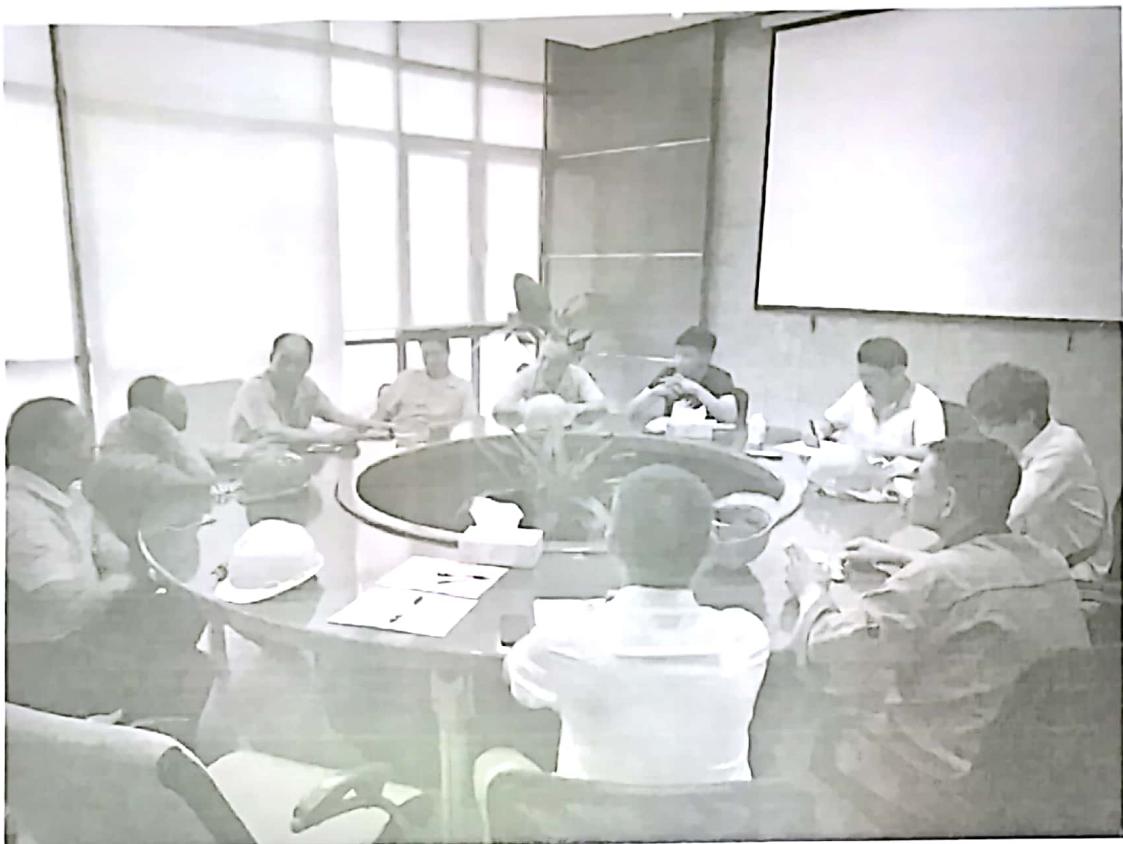

工程例会



工程例会

第十五次 监理例会会议签到表

时间：2018年7月12日

姓名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
江建松	许富			
孙晓军	许富			
黎建光	常州正衡监理	总代	15762835718	
孙金龙	常州正衡监理	监理员	15350396331	
秦江平	伟都			
桂永才	强生电气		13817827724	
彭志国	正泰		1590626061	
汤纪祥	正泰电气		18269988587	
孙银华	正泰电气		13761033133	
