

# 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

## 会 议 纪 要

(第二十八期)

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部



# 会议纪要

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-MLXM-028

签发：李元堂


|                                                                                                       |        |      |          |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|-------------|
| 会议地点                                                                                                  | 项目部会议室 |      | 会议时间     | 2018. 9. 21 |
| 会议主持人                                                                                                 | 李元堂    | 会议主题 | 进度、质量、安全 |             |
| 本次会议内容：                                                                                               |        |      |          |             |
| 一、孚尧电力工程设计（上海）有限公司                                                                                    |        |      |          |             |
| 1、开关站已经恢复施工，各项工作要严格按照相应计划抓紧落实，人员、材料及相关设备要及时跟进，确保在 11 月 20 日前完成整个开关站的竣工验收工作，争取提前完成任务。                  |        |      |          |             |
| 2、在 10 月 8 号业主领导来检查前，要把开关站配电楼的所有地面处理好，电缆沟处理完成，外墙保温完成；办公楼外墙装修完成，前期站场消缺工作完成。                            |        |      |          |             |
| 3、光伏区要抓紧施工和消缺整改，三日内人员必须进场施工，优先把 5MW 合同的工作任务完成，有什么要求，书面通知总包项目部。总包单位下一步将进行进度考核，因进度缓慢、擅自停工而影响进度的将给予经济处罚。 |        |      |          |             |
| 4、对光伏区内浸泡在水中的电缆要抓紧时间整改好，避免因长时间浸泡而损坏电缆，影响电缆的正常运行。                                                      |        |      |          |             |
| 5、各分包单位在施工的过程中要确保施工的质量，严格按图纸和规范要求施工。                                                                  |        |      |          |             |
| 6、各分包单位要加强物料的管理工作，专职材料员要抓紧配备到位，做好物料巡检、材料台账、材料盘点和材料归置存放等工作，要及时做好与总包单位的对接工作。                            |        |      |          |             |
| 7、各分包单位要做好进场材料的报验工作，材料要有合格证明，需经第三方检测的材料要及时通知监理人员到场见证取样工作，所有材料要报总包单位经监理检验合格后才能进场使用。                    |        |      |          |             |
| 8、各分包单位的单位资质、主要管理人员资质、特殊工种资质、新进场材料的合格证明、材料及工序的报验报审要抓紧报总包单位，相关资料总包单位汇总后报监理项目部审核。                       |        |      |          |             |
| 二、监理单位：                                                                                               |        |      |          |             |
| 1、总包单位要尽快完成 9 月 12 日会议纪要中有关的内容要求，相关资料要以文件报审表的形式报监理项目部，经监理项目部审核后，及时上报业主。                               |        |      |          |             |

- 2、总包方要加强施工进度的协调力度，开关站人员、设备要尽快增加，确保 11 月 20 日能竣工验收；光伏区要尽快恢复施工，确保整个进度计划不受影响。
- 3、总包单位要加强进场材料的管理，材料要有合格证明书，需经第三方检测的材料要通知监理人员见证取样，经检测合格后才能进场使用，严禁不合格的材料进场使用。
- 4、现场材料要加强规整管理工作，做好防风、防雨、防火等措施，个别不合格材料及时清理出场。
- 5、总包单位要加强向监理方的材料报验工作、阶段工程完成报验工作、工序完成报验工作，隐蔽工程等报验工作，严格按规范要求进行现场管理工作。
- 6、施工单位要加强施工质量的管理，开关站和光伏区的各项工作要保质保量的完成，严格按计划、标准整改，按规范和图纸要求施工。
- 7、总包单位及分包单位要加强施工安全方面的管理工作。安全帽、救生衣、安全带等防护用品要落实到位，高空作业必须系安全带，脚手架、爬梯等登高设备一定要在确认安全、牢固可靠后才能使用；监理项目部将加强安全方面的巡查和处罚力度，以确保各项工作的安全进行。
- 8、随着季风的逐渐加大，支架、组件等要加固好，以防遭到损坏；当日施工完成后，特别是湖内施工人员要将剩余材料和工器具等要及时回归仓库存放，不能存放在施工现场，以减少不必要的损失。
- 9、光伏区的防腐工作要严格按防腐施工工艺要求和标准整改施工，对防腐不合格的部位要重新施工，整改完成三级自检合格后，报监理项目部检查验收。
- 10、针对光伏区料场码头的部分塌陷情况，施工方虽已进行了初步整改，但还未整改彻底，仍有较大隐患，因此施工单位要尽快制定一个切实可行的整改方案，报设计、监理等相关方审核，审核通过后严格按方案整改，把这一问题彻底解决好，确保无任何安全隐患。
- 9、总包单位的项目划分表要抓紧制定，制定完毕后报请业主和监理审核。
- 10、监理项目部已发出的监理通知单所提出的相关事项要尽快整改完成，并及时回复监理项目部复查。
- 11、参加会议的人员要准时到场，不准迟到、早退，有事提前请假，严格遵守会议制度。

12、监理项目部会同总包单位计划 9 月 25 日上午 9 点对开关站和光伏区施工现场及员工宿舍的安全情况进行一次全面检查，各单位主要负责人、安全员要准时参加，不得缺席，望各单位先做好自查自纠工作。

|      |                  |      |           |
|------|------------------|------|-----------|
| 主送单位 | 孚尧电力工程设计（上海）有限公司 |      |           |
| 抄送单位 | 汨罗上电柏棠新能源有限公司    |      |           |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司   | 发文时间 | 2018.9.21 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

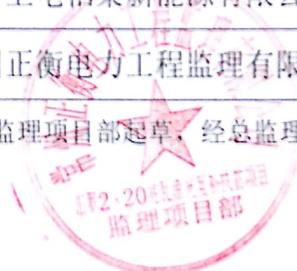

汨罗 2×20 渔光互补扶贫项目会议签到表

日期:

[illegible]
