

会 议 纪 要

编号: GFDZJBM09-008

工程名称: 张北光伏电站容配比优化改造工程项目

签发: 田同有

会议地点	张北光伏电站容配比优化改造工程会议室	会议时间	2018年07月13日
会议主持人	田同有		
会议主题: 本周施工情况总结以及下周施工安排。			
本次会议内容: 运维部(代业主): 1、保证安全文明施工、做到工完料尽场地清。 2、确保安全前提下加快施工进度。 3、开工前必须完成工作票办理流程后方可进场工作。 4、新增汇流箱并网前必须测量开路电压和摇线绝缘。 监理项目部(常州正衡): 一、本周施工现场安全、质量、进度情况: 电气班组: 1、新增光伏组串电缆(1X4mm² 黑、红线)至汇流箱处MC4插头、号码管制作。施工质量符合设计要求,新增光伏组串M4插头制作、连接,经监理检查符合设计要求。 2、新增光伏组串组件直流电缆线绑扎固定(2X21光伏组串)符合要求,(3X7光伏组串)未绑扎固定(绑扎固定方式需运维部、总包项目部、监理项目部三方商讨,确定一个可靠的绑扎固定方案)。 3、新增光伏组串接地镀锌扁钢(5X50mm)现场开始焊接(新增光伏组串与相邻原有的光伏组串横梁),施工人员安全着装、光伏组件防护、消防配置齐全,焊接质量符合设计要求,无安全隐患。 4、2018年7月10日由监理项目部组织,运维部三人、总包项目部二人、施工方三人参加,对已安装完成的光伏组串(50串)安装、三台新增汇流箱(04#、02#、01#)内的出线(2X50\2X70)挂牌编号、新增组串号码管、接地(16mm²黄绿线)、防火封堵进行了初检。 5、2018年7月12日下午由运维部组织,监理项目部、总包项目部等有关人员参加,对新增的11台汇流箱至逆变器电力电缆绝缘行了检测。 6、2018年7月13日,运维部组织,监理项目部、总包项目部等有关人员参加,对新增光伏组串开路电压进行测试(27串),对新增的光伏组串,(77串)复查后、进行了并网发电。 7、监理项目部对本周施工现场日常检查以及各项目部联合检查中,发现施工安装存在以下问题: (1)、新增光伏组串支架前后立柱地脚螺栓、斜梁与后立柱螺栓、横梁连接件螺栓都不同程度存在松动、缺少平垫等问题,监理项目部已多次督促进行安装截止2018年7月12日未安装。导致新增的光伏组串发电滞后。 (2)、个别光伏组件中垫片未紧固(3X7),(2X21)光伏组串边压块缺失,光伏组件表面(低铁钢化玻璃)存在不同程度的人为划伤。			



由 扫描全能王 扫描创建

2、坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，督促施工单位在进度、质量、安全方面保质、保量、保安全无事故。

主送单位	张北光伏电站容配比优化改造工程项目部		
抄送单位	上海上电工程有限公司项目部		
发文单位	张北光伏电站容配比优化改造工程 监理项目部	发文时间	2018年07月03日

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。



由 扫描全能王 扫描创建



周监理例会



新增光伏组串开路电压测试

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


© 1 + WS2-Y ALsA@URF Miel



由 扫描全能王 扫描创建




新增光伏组串接地扁铁焊接


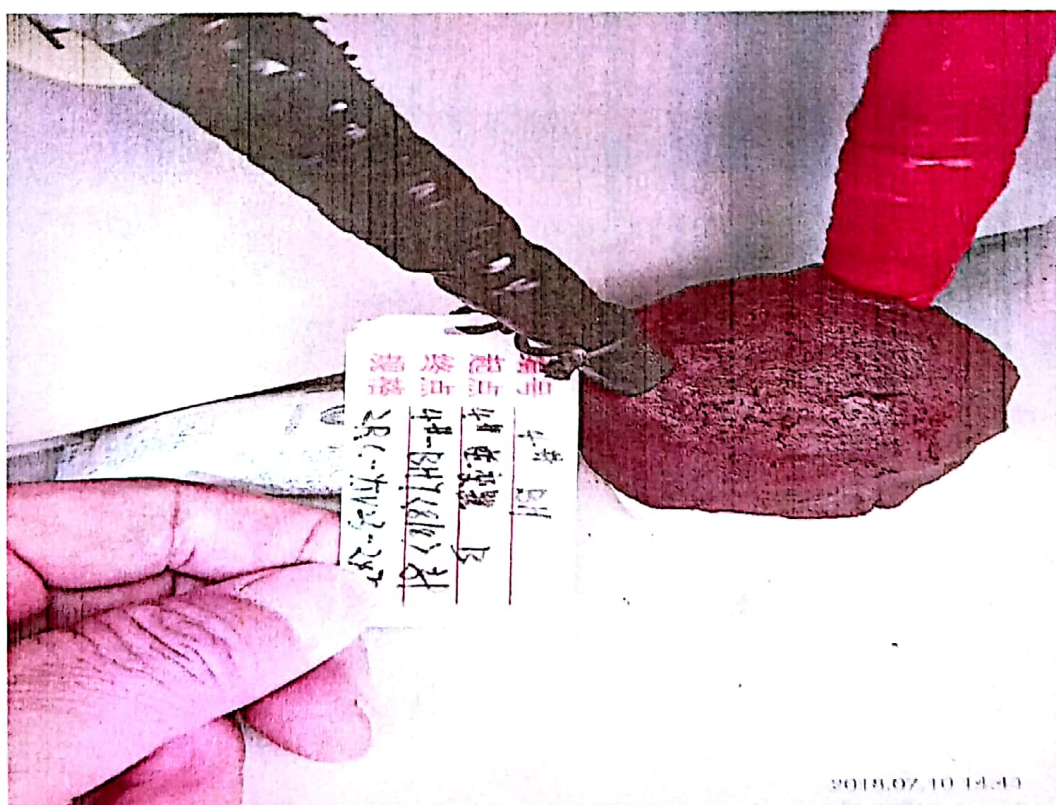


新增汇流箱出线挂牌、防火封堵



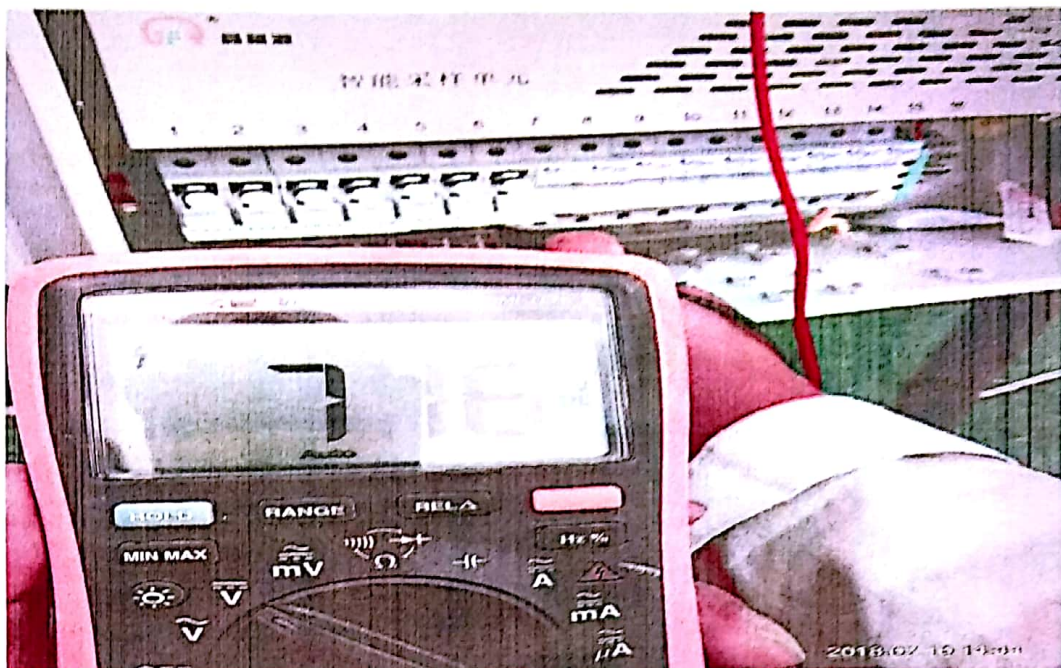

新增汇流箱开路电压检测

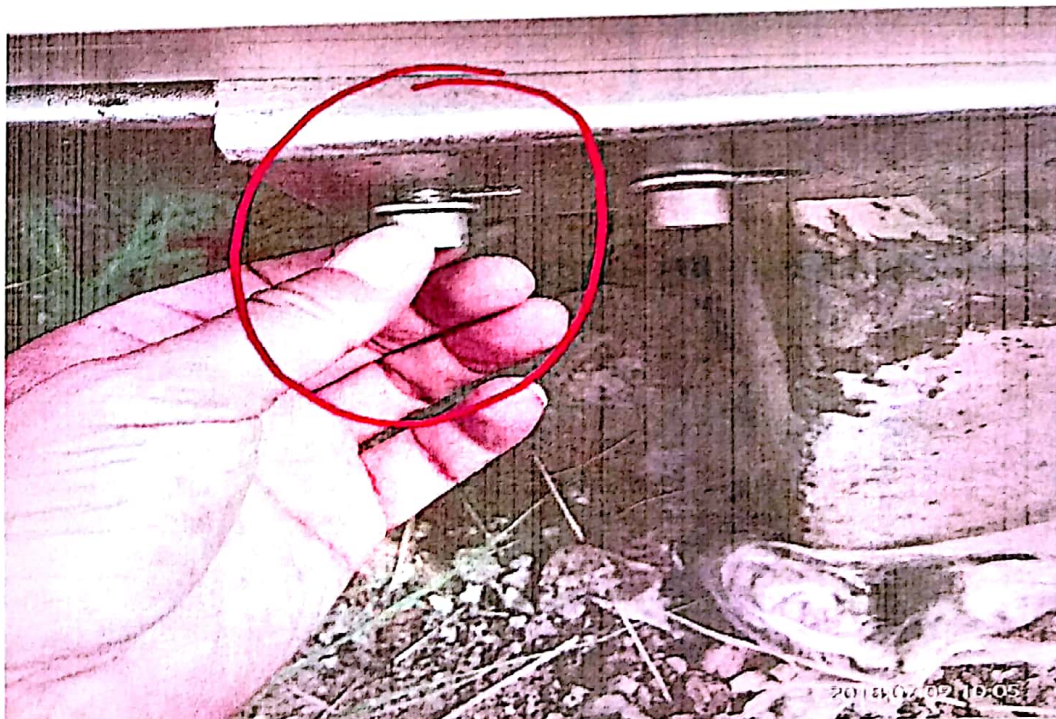


新增光伏组串支架安装横梁连接件螺栓紧固不到位

江苏太阳能光伏科技有限公司



由 扫描全能王 扫描创建

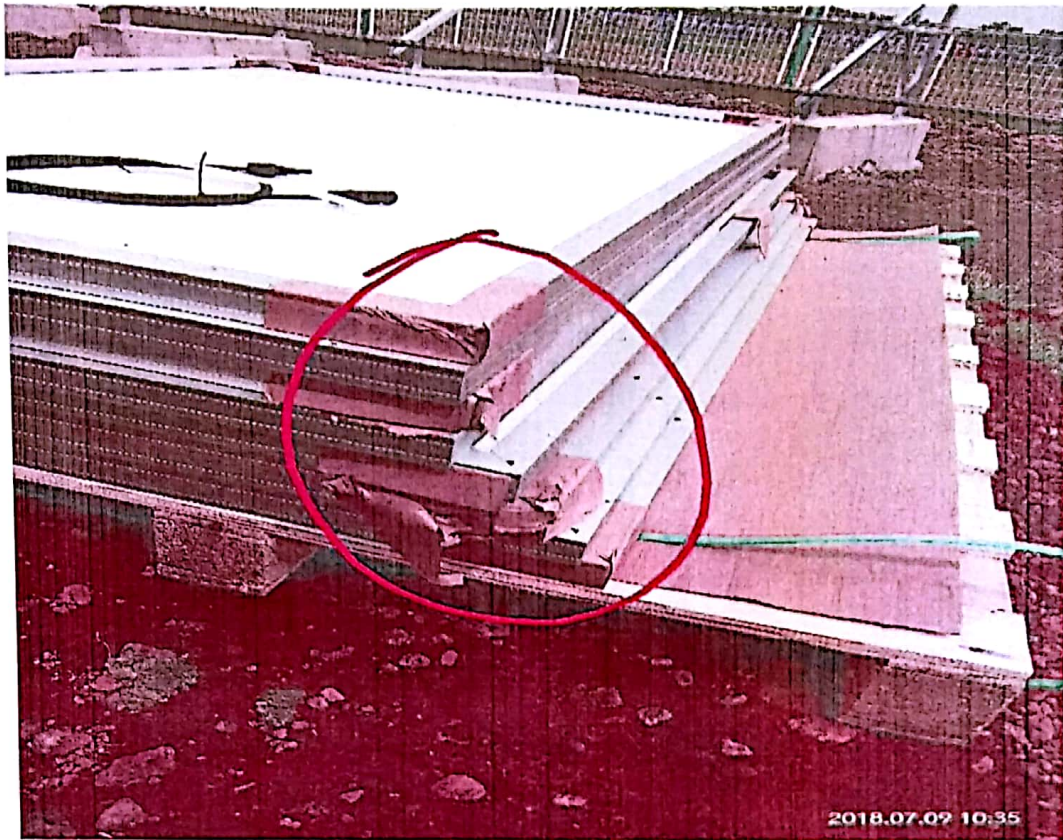

施工现场光伏组件叠放不规范，未做防雨防护

[illegible]

由 扫描全能王 扫描创建

张北光伏电站容配比优化改造工程项目会议签到表

日期: 2018.7.13

[illegible]
