

会议纪要

工程名称：南京长安发动机厂光伏发电项目

编号：ZHLJ-HVJY-002


签发：徐耀生

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018.7.16
会议主持人	张良玉、陈晓鹏	会议主题	周例会
本次会议内容： 一、施工单位 对现阶段施工情况进行阐述： 1、制定施工计划，进行施工。 2、屋面安装组件，于7月11日安装完成。7月12日开始安装桥架与接地扁铁7月15日安装完毕；7月12日安装汇流箱、逆变器，于7月13日安装完成。 3、7月14号破路，安装墙面桥架，7月15号敷设电缆。 4、7月15号开始敷设通讯电缆并完成。 二、本周计划内容： 1、ZC-YJV-3*25+1*16 电缆敷设； 2、ZC-YJV22-3*120/150+1*70 电缆敷设； 3、4mm² 光伏电缆敷设。 4、通信电缆的敷设 5、逆变器、汇流箱的接地 三、监理项目部 1. 着重强调安全问题，施工人员进场必须佩戴安全帽，高空作业必须佩戴安全带。 2. 进行吊装作业时，周边必须做好安全防护，拉好警戒带。 3. 组件安装完成后插头不能裸露在外。 4. 电缆敷设或者吊装过程中必须采取保护措施，防止电缆损坏。			

5. 合理安排电气安装人员，进行施工。
6. 屋面安装好的支架夹具需做拉拔试验，提供实验室报告。
7. 要求施工方在每次监理例会之前做好施工周报与计划。

截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需求。

相关标准 JGJ59-2011、JGJ46-2012、NB/T32004-2013、Q/SP19709-2016

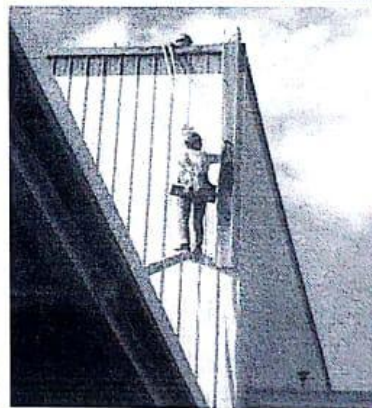

主送单位	南京科电能源科技有限公司		
抄送单位	中机国际工程设计研究院有限责任公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018. 7. 16

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

南京长安发动机厂光伏发电项目第二次会议签到表

日期: 2018.7.16

[illegible]
