

南京长安发动机厂光伏发电项目

会 议 纪 要

（第四期）

常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

编号: ZHJL-HYJY-004


工程名称: 南京长安发动机厂光伏发电项目

签发: 徐继生

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018.8.2
会议主持人	张良玉、张小雄	会议主题	周例会
本次会议内容: 一、施工单位 对现阶段施工情况进行阐述: 1、制定施工计划,进行施工。 2、桥架盖板安装完成。 3、通讯电缆敷设完成。 4、步道板安装完成。 5、汇流箱、逆变器安装完成。 6、并网柜安装 50%。 7、气象站安装完成。 二、本周计划内容: (1) 并网柜安装; (2) 通讯设备安装; 三、监理项目部 1. 着重强调安全问题,施工人员进场必须佩戴安全帽,高空作业必须佩戴安全带。 2. 并网柜接线前必须确定电源闭闸后方可施工。 3. 并网柜接线前必须确定测量电缆绝缘性。 4. 并网柜安装后必须做好接地。 5. 热缩处理母排或者电缆时,作业必须办理《动火作业许可证》,动火作业点必须配备一个灭火器,作业完成后,组织检查现场,确认无遗留火种后方可离开现场。			

截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需求。

相关标准 JGJ59-2011、JGJ46-2012、NB/T32004-2013、Q/SP19709-2016

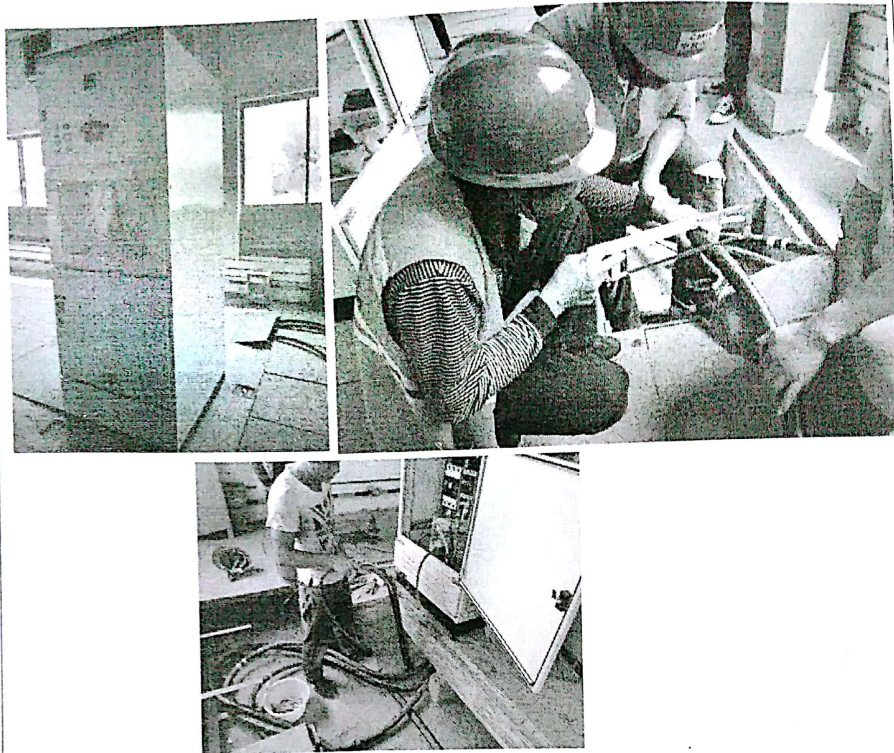

主送单位	南京科电能源科技有限公司		
抄送单位	中机国际工程设计研究院有限责任公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.8.2

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

南京长安发动机厂光伏发电项目第四次会议签到表

日期: 2018.8.2

[illegible]
