


会议纪要

编号: GFDZJBM09-07

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目 (皮阿诺 3.5856MW) 签发: 

会议地点	会议室	会议时间	2018 年 11 月 30 日
会议主持人	田同有		
会议主题: 上周周例会问题落实情况和本周施工情况总结以及下周施工重点。			
本次会议内容: 监理项目部: 一、上周监理周例会提出的问题落实情况: 1、施工班前会 (未落实)。 2、屋面施工垃圾清理不及时, 多余材料未收集保管 (落实不到位)。 二、本周施工现场安全、质量、进度情况: 1、D 号屋面光伏区接地扁铁焊接个别焊接处存在漏焊、焊渣未清理等现象, 且接地扁铁安装固定不符合设计要求。 2、D 号屋面光伏组件连接线绑扎固定不到位、不规范。 3、D 号屋面光伏组件连接线绑扎固定时仍有个别施工人员坐光伏组件上面。 4、屋面施工垃圾清理不及时, 多余材料未收集保管。 5、C、E 号楼面采光带未做安全防护。 6、屋面吊装时, 道路两端未做安全防护以及警示标志。 7、施工单位负责人未对施工人员进行早班会。 三、下周施工工作要点及施工进度、质量、安全安排如下: 1、继续进行三个屋面检修通道玻璃钢格栅安装。 2、C、E 号屋面采光带安全防护进行制作, 安装须符合项目部要求。 3、D 屋面电缆桥架进行安装制作, 光伏组串接线, 汇流箱安装固定以及接线 (须制作号码管编号)。 4、光伏区接地镀锌扁铁焊接、防腐处理。 5、每日要进行早班会。 6、清理施工区域施工垃圾, 收集归拢已安装完成区域多余施工材料。 业主项目部: 1、要求施工单位对三个屋面以及集装箱办公室周围卫生进行清理 (包装袋、纸箱), 特别是烟头, 以免下雨时堵塞屋面下水道。 2、D 号电缆、桥架、接地进行施工安装。			



由 扫描全能王 扫描创建


- 3、动火作业资料要及时申请报备，经有关单位批准同意后方可进行动火作业施工。
- 4、确保安全文明施工，施工人员要安全帽佩戴整齐，反光背心着装规范。
- 5、施工现场必须严格遵守严格安全规范、制度，确保安全无事故。

施工单位：

- 1、监理项目部、业主项目部所提出的问题，认真落实、积极整改。
- 2、坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，督促施工单位在进度、质量、安全方面保质、保量、确保安全无事故。

抄送单位	湖南鸿源电力建设有限公司		
发文单位	兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2018年11月30日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

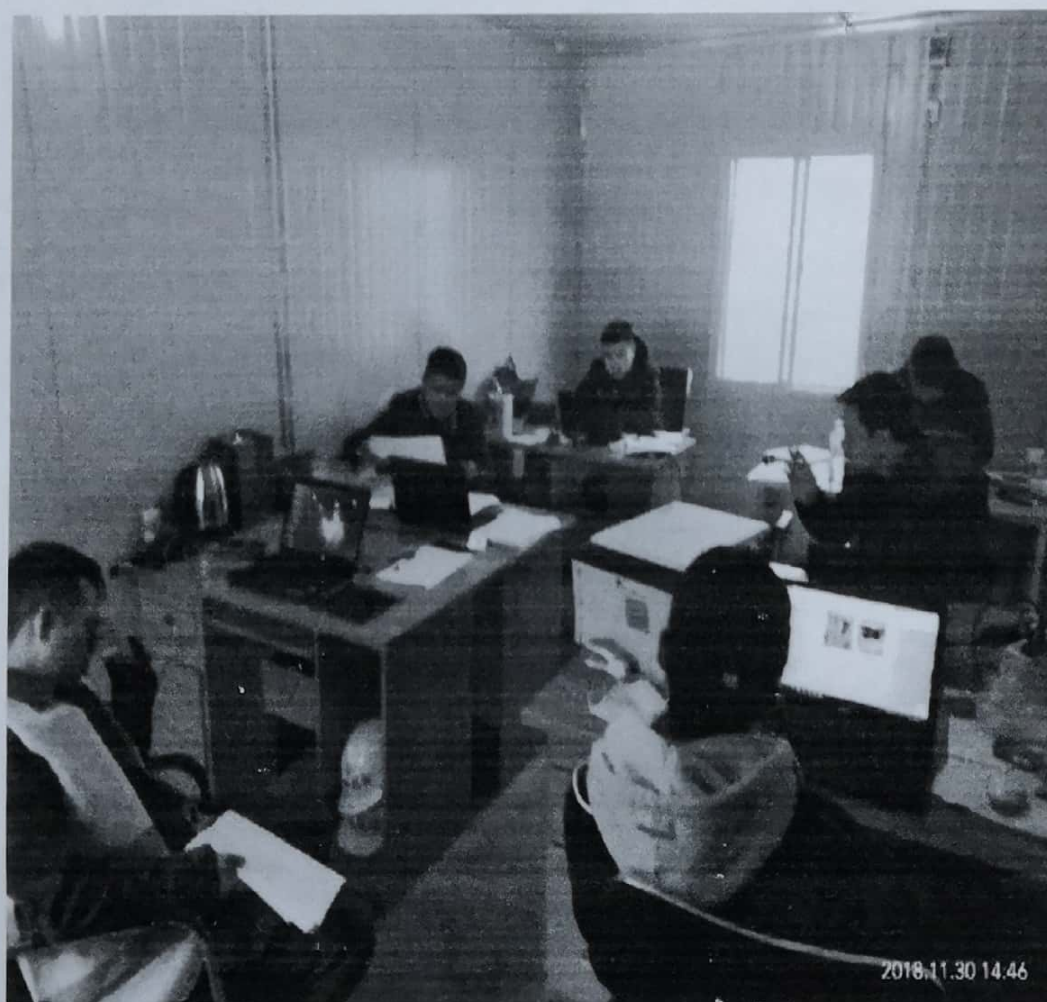

周监理例会



会议签到表

年 月 日

[illegible]
