

会议纪要

编号: GFDZJBM09-07

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-曲美 1.971MW 签发: 苗守明


会议地点	工地项目部	会议时间	2019年4月27日
会议主持人	李云		
会议主题: 下步工作安排			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 一、监理项目部: 本周施工现场安全、质量、进度情况: 1、喜临门 2.8944MWW 项目: (1)、1#、2#、3#箱变基础挑檐混凝土浇筑, 监理人员进行现场旁站。保持每日养护。 (2)、一、二次舱基础底部混凝土浇筑, 监理人员现场旁站。 (3)、7号屋面光伏区光伏组件搬运、安装。 (4)、7号屋面光伏区光伏组件安装, 完成 1.07MW。 (5)、7号屋面光伏区支架、檩条安装, 完成 100%, 共 1.56MW。 (6)、2019年4月21日材料进场(混凝土 18方), 2019年4月23日材料进场(沙子 10方), 2019年4月24日材料进场(砖 4000块)。 (7)、现场安全检查无重大安全隐患。 2、曲美 1.971MWW 项目: (1)、1号屋面光伏区敷设 2×95 直流电缆, 约 1800 米。 (2)、1号屋面光伏区通信电缆穿管绑扎, 完成 0.25MW。 (3)、1号屋面光伏区通信电缆组串接线, 完成 0.42MW。 (4)、1号屋面镀锌接地扁铁焊接, 完成 0.35MW。 (5)、2019年4月23日材料进场(绝缘桥架 24米)。 (6)、1号屋面下墙绝缘桥架安装。 (7)、2019年4月26日 3×95 高压电缆敷设, 监理人员全程旁站确保施工无安全隐患。 (8)、现场安全检查无重大安全隐患。 二、业主项目部: 施工工作要点及施工进度、质量、安全安排如下:			



扫描全能王 创建

1、施工项目部要保证施工中施工质量，确认保质保量。 2、施工项目部做好设备物资管控，专人看管做到每日检查，确保物资安全。 3、近期项目所在地天气多变，阵风有时达到6-7级，施工项目部每日施工注意安全确保人员安全，遵守监理项目部各种联系单内容。 4、曲美项目下周预计撤场，施工项目部做好撤场前的所有工作。 5、曲美项目下周撤场前预计剩余夹具到场，随时做好接受准备。 6、每日要进行早班会（安全、质量进行交底），确保施工现场安全零事故。 三、施工单位： 1、施工项目部对业主项目部、监理项目部提出的各项安排及问题，我方积极安排施工人员进行整改落实完成。 坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，督促施工单位在进度、质量、安全方面保质、保量、确保安全无事故。			
主送单位	临湘市振宇建筑工程有限责任公司		
抄送单位	兰考县杭泰光伏发电有限公司业主项目部		
发文单位	兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-喜临门监理项目部	发文时间	2019年4月27日



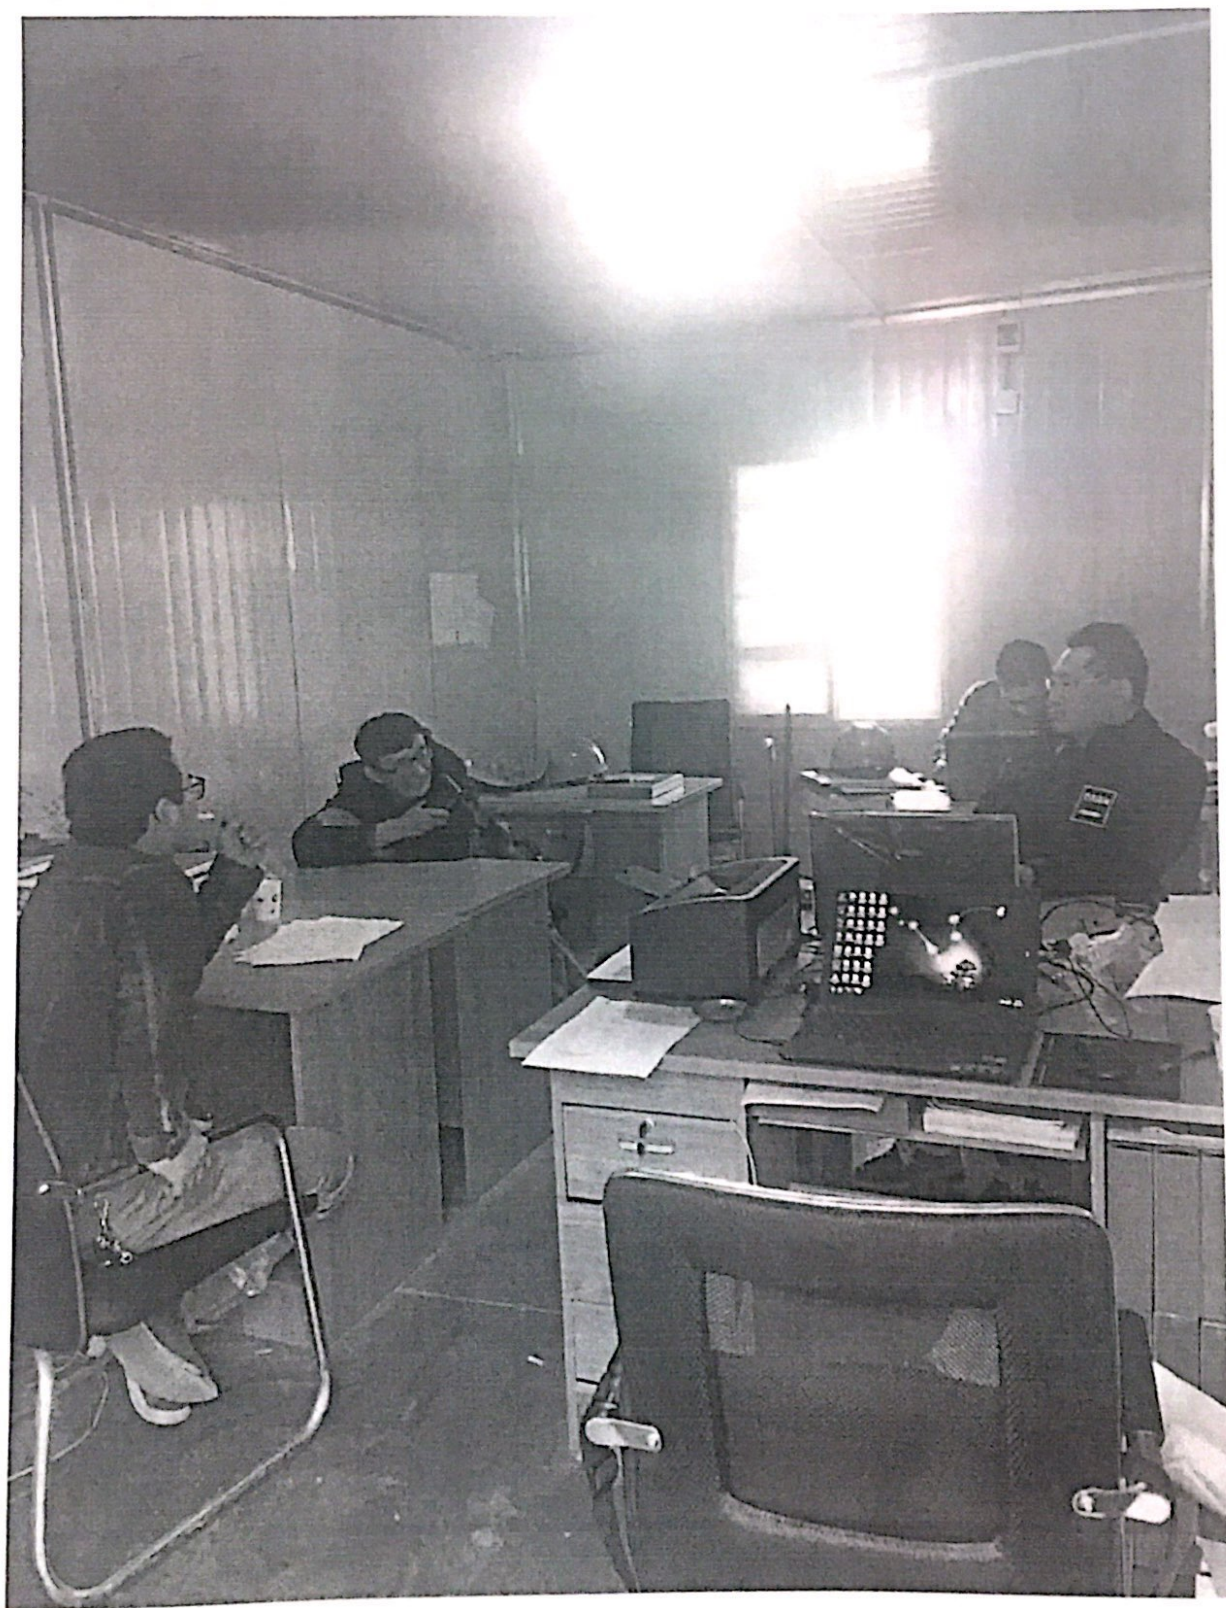

会议签到表

姓名	单位	电话	备注
李云	正衡监理	17353525107	
胡红军	正泰	15139782020	
葛江	江苏中天	18626157902	
罗灿	临湘振宇	15073087866	
任远成	正衡监理	18939364165	

