

会议纪要

编号: GFDZJBM09-005

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-大自然 3.2346MW 签发: 苗宇科

会议地点	工地项目部	会议时间	2019年8月30日
会议主持人	任远威		
会议主题: 下步工作安排			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 一、监理项目部: 本周施工现场安全、质量、进度情况: 大自然 3.2346MW 项目: (1)、2019年8月24日夹具吊装至1#屋面光伏区监理人员对施工现场进行安全旁站(安全旁站监理记录表1份);2019年8月27日夹具、檩条分别吊装至1#、4#屋面光伏区监理人员对施工现场进行安全旁站(安全旁站监理记录表1份);2019年8月28日檩条吊装至1#屋面光伏区监理人员对施工现场进行安全旁站(安全旁站监理记录表1份)。 (2)、2019年8月26日材料进场(夹具:13000个、檩条:1398根、紧固件:25837套);2019年8月28日材料进场(2×70直流电缆:1842米、2×120直流电缆:255米、485通讯电缆:336米、檩条:1886根、铝导轨:1200根)。 (3)、1#屋面光伏区进行放线定位安装夹具。已完成1MWp。 (4)、1#屋面光伏区支架檩条搬运与安装,已完成0.3MWp。 (5)、现场安全检查,未发现重大安全隐患。 下周施工工作及现场安全、质量、施工进度安排如下: 1、严格按照施工图纸进行施工,如遇施工现场与设计图纸有冲突的地方应及时与业主负责人进行联系,经同意后方可继续施工。 2、现场施工过程中每道工序完成后,应及时通知监理项目部进行检查验收,经检查验收合格后方可进行下一道工序施工,否则造成不良后果及费用施工单位承担。 3、每天早晨施工前,施工负责人进行召开班前会;对施工人员进行安全技术交底。 4、施工人员进入厂区应遵守厂规厂纪,严禁出现施工人员在厂区抽烟现象;进入施工区域必须佩戴安全帽,确保人员安全无事故。 5、临时用电应严格按照安全规范,例如过路线路必须进行线路保护。 二、业主项目部: 施工工作要点及施工进度、质量、安全安排如下:			

1、施工项目部要保证施工中施工质量，确认保质保量。

2、施工项目部做好设备物资管控，专人看管做到每日检查，确保物资安全。

3、天气炎热按照天气现场适当调节施工人员上下班时间，现场需配备各类防暑降温药物、纯净水以防出现施工人员出现中暑现象。


4、每日要进行早班会（安全、质量进行交底），确保施工现场安全零事故。

三、施工单位：

1、施工项目部对业主项目部、监理项目部提出的各项安排及问题，我方积极安排施工人员进行整改落实完成。

2、坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，督促施工单位在进度、质量、安全方面保质、保量、确保安全无事故。

主送单位	湖南鸿源电力建设有限公司		
抄送单位	兰考县兴泰光伏发电有限公司业主项目部		
发文单位	兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-大自然监理项目部	发文时间	2019年8月30日

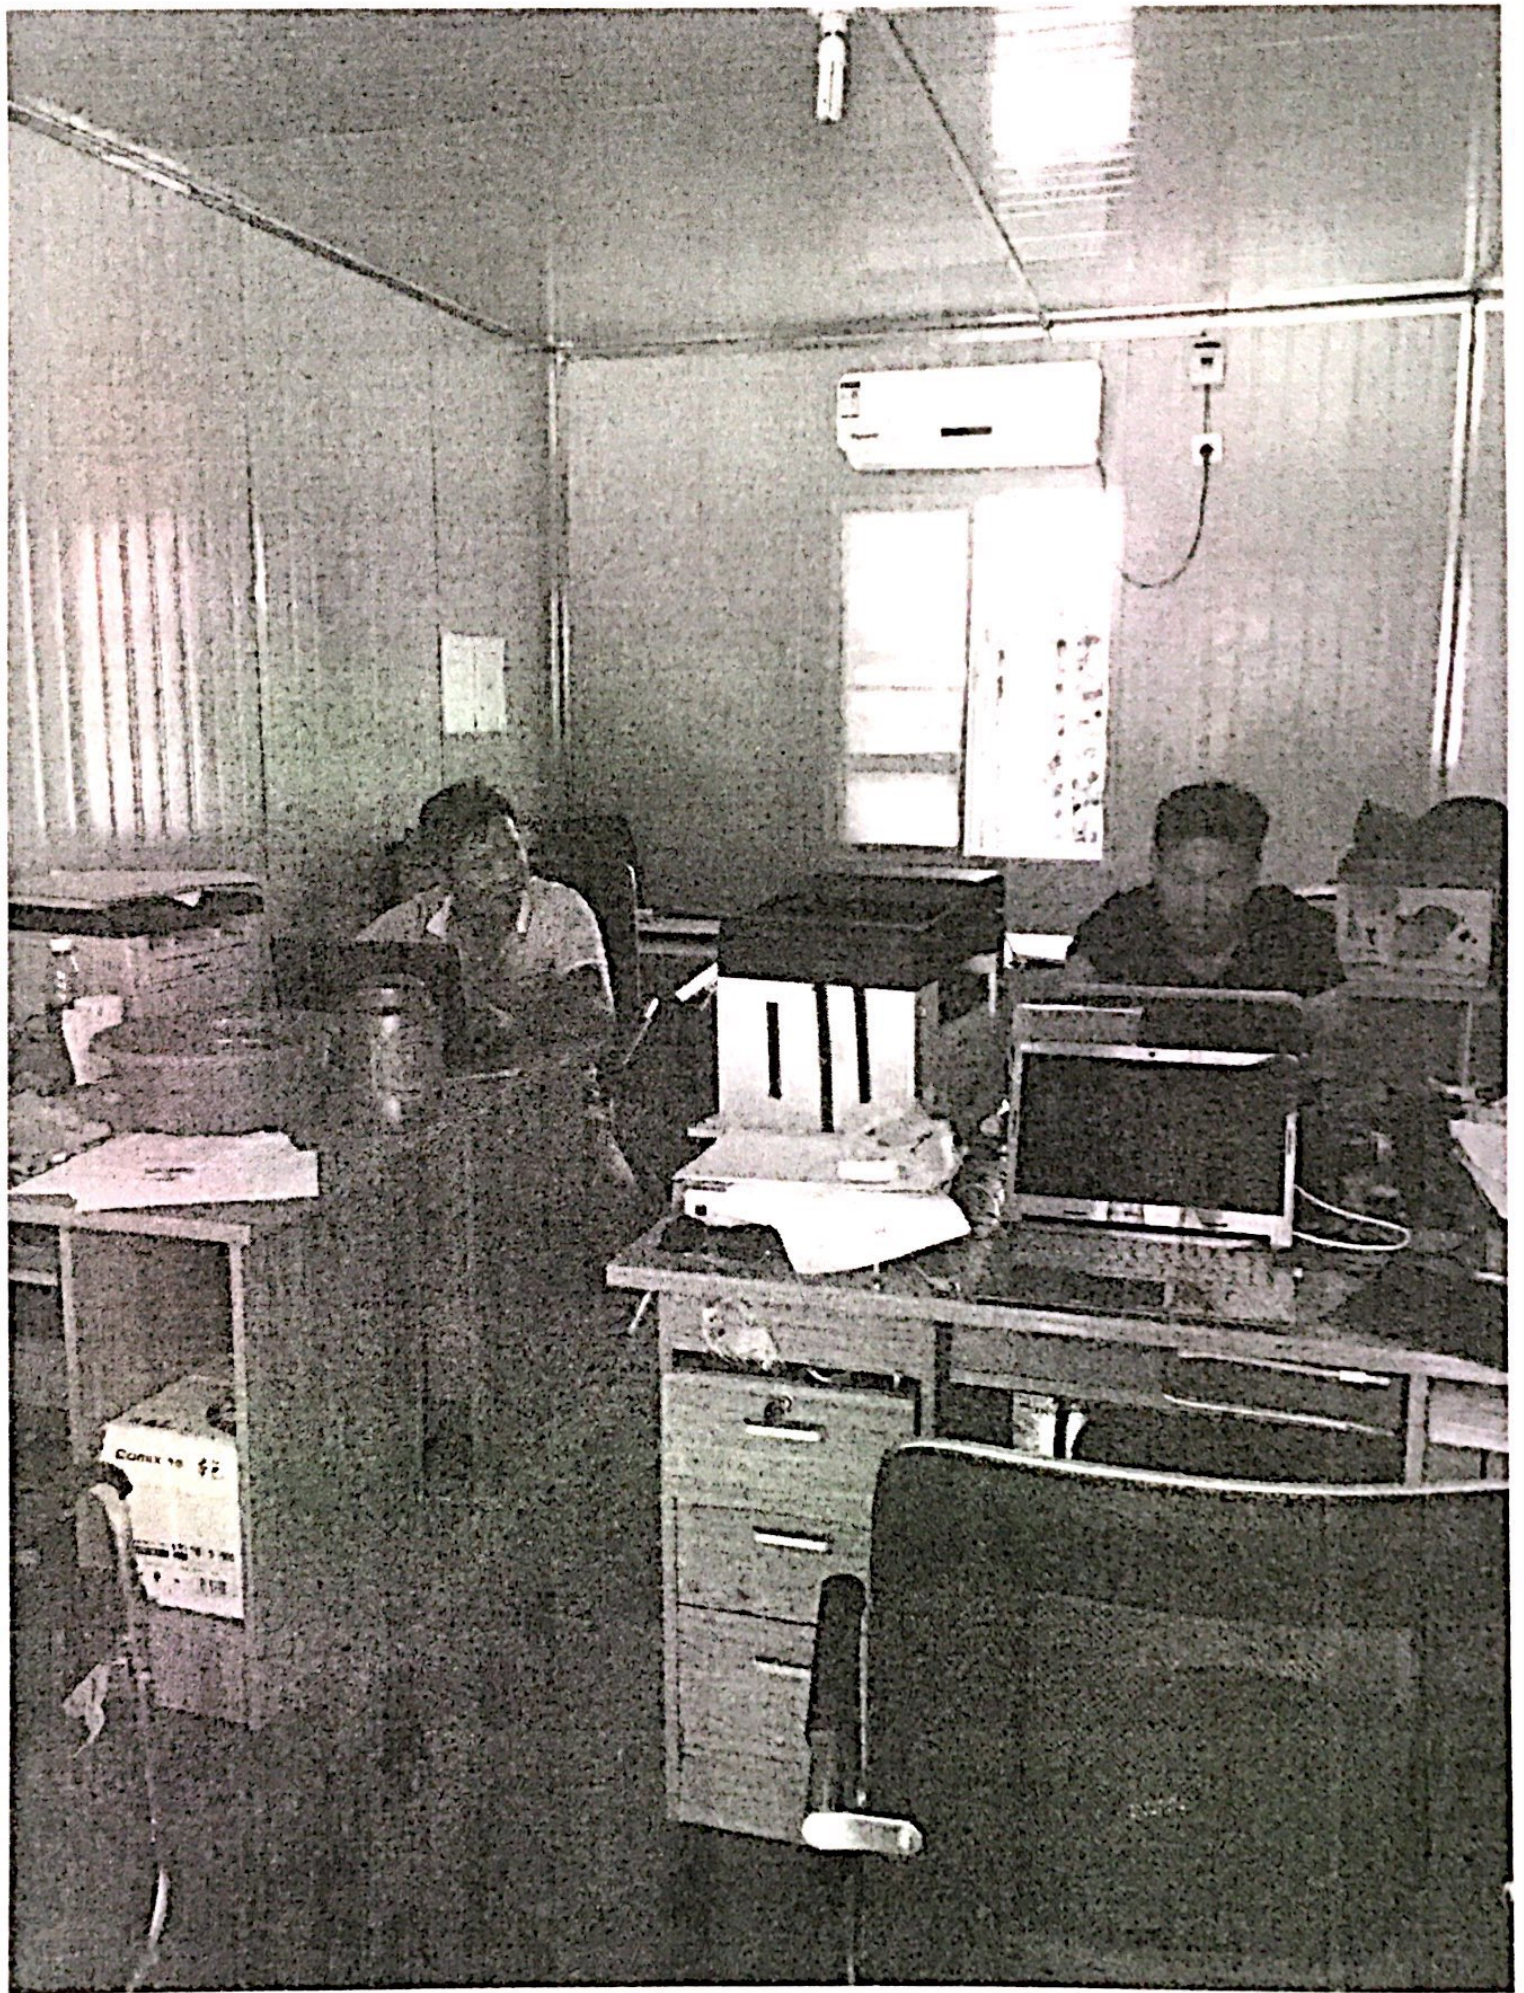

会议签到表

年 月 日

[illegible]
