

# 会议纪要

编号: GFDZJBM09-003

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-欧派 2.997MW 签发: 

会议地点	工地项目部	会议时间	2019年11月08日
会议主持人	任远威		
会议主题:	下步工作安排		
上次会议问题落实情况:	无		
本次会议内容:	<p>一、监理项目部:</p> <p>本周施工现场安全、质量、进度情况:</p> <p>欧派 2.997MW 项目:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1)、2019年11月08日材料进场(夹具: 3575个、法兰自攻螺栓: 14399个)。</li><li>(2)、1-3#箱变基础模板安装; 切割厂房之间预埋管件路面; 电缆井砌设。</li><li>(3)、1-4#屋面光伏区防线定位; 1#屋面光伏区夹具拉拔力检测。</li><li>(4)、现场安全检查, 未发现重大安全隐患。</li></ul> <p>下周施工工作及现场安全、质量、施工进度安排如下:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1、严格按照施工图纸进行施工, 如遇施工现场与设计图纸有冲突的地方应及时与业主负责人进行联系, 经同意后方可继续施工。</li><li>2、现场施工过程中每道工序完成后, 应及时通知监理项目部进行检查验收, 经检查验收合格后方可进行下一道工序施工, 否则造成不良后果及费用施工单位承担。</li><li>3、每天早晨施工前, 施工负责人进行召开班前会; 对施工人员进行安全技术交底。</li><li>4、施工人员进入厂区应遵守厂规厂纪, 严谨出现施工人员在厂区抽烟现象; 进入施工区域必须佩戴安全帽, 确保人员安全无事故。</li><li>5、临时用电应严格按照安全规范, 例如过路线路必须进行线路保护。</li><li>6、因项目所在地环保检查, 商砼站暂时全部关闭基础梁柱无法进行混凝土浇筑, 望施工项目部做好基础防护工作设立警示标牌以防非施工人员受伤现象。</li></ul> <p>二、业主项目部:</p> <p>施工工作要点及施工进度、质量、安全安排如下:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1、施工项目部要保证施工中施工质量, 确认保质保量。</li><li>2、施工项目部做好设备物资管控, 专人看管做到每日检查, 确保物资安全。</li><li>3、项目所在地环保检查较为严格希望施工项目部做好防尘工, 等待商砼站开业后尽快对基础梁柱进</li></ul>		



扫描全能王 创建

行浇筑作业。

4、每日要进行早班会（安全、质量进行交底），确保施工现场安全零事故。

**三、施工单位：**


1、施工项目部对业主项目部、监理项目部提出的各项安排及问题，我方积极安排施工人员进行整改落实完成。

2、坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，督促施工单位在进度、质量、安全方面保质、保量、确保安全无事故。

主送单位	临湘市振宇建筑工程有限责任公司		
抄送单位	兰考县杭泰光伏发电有限公司业主项目部		
发文单位	兰考恒大家居联盟产业园光伏发电 项目欧派监理项目部	发文时间	2019年11月08日



扫描全能王 创建

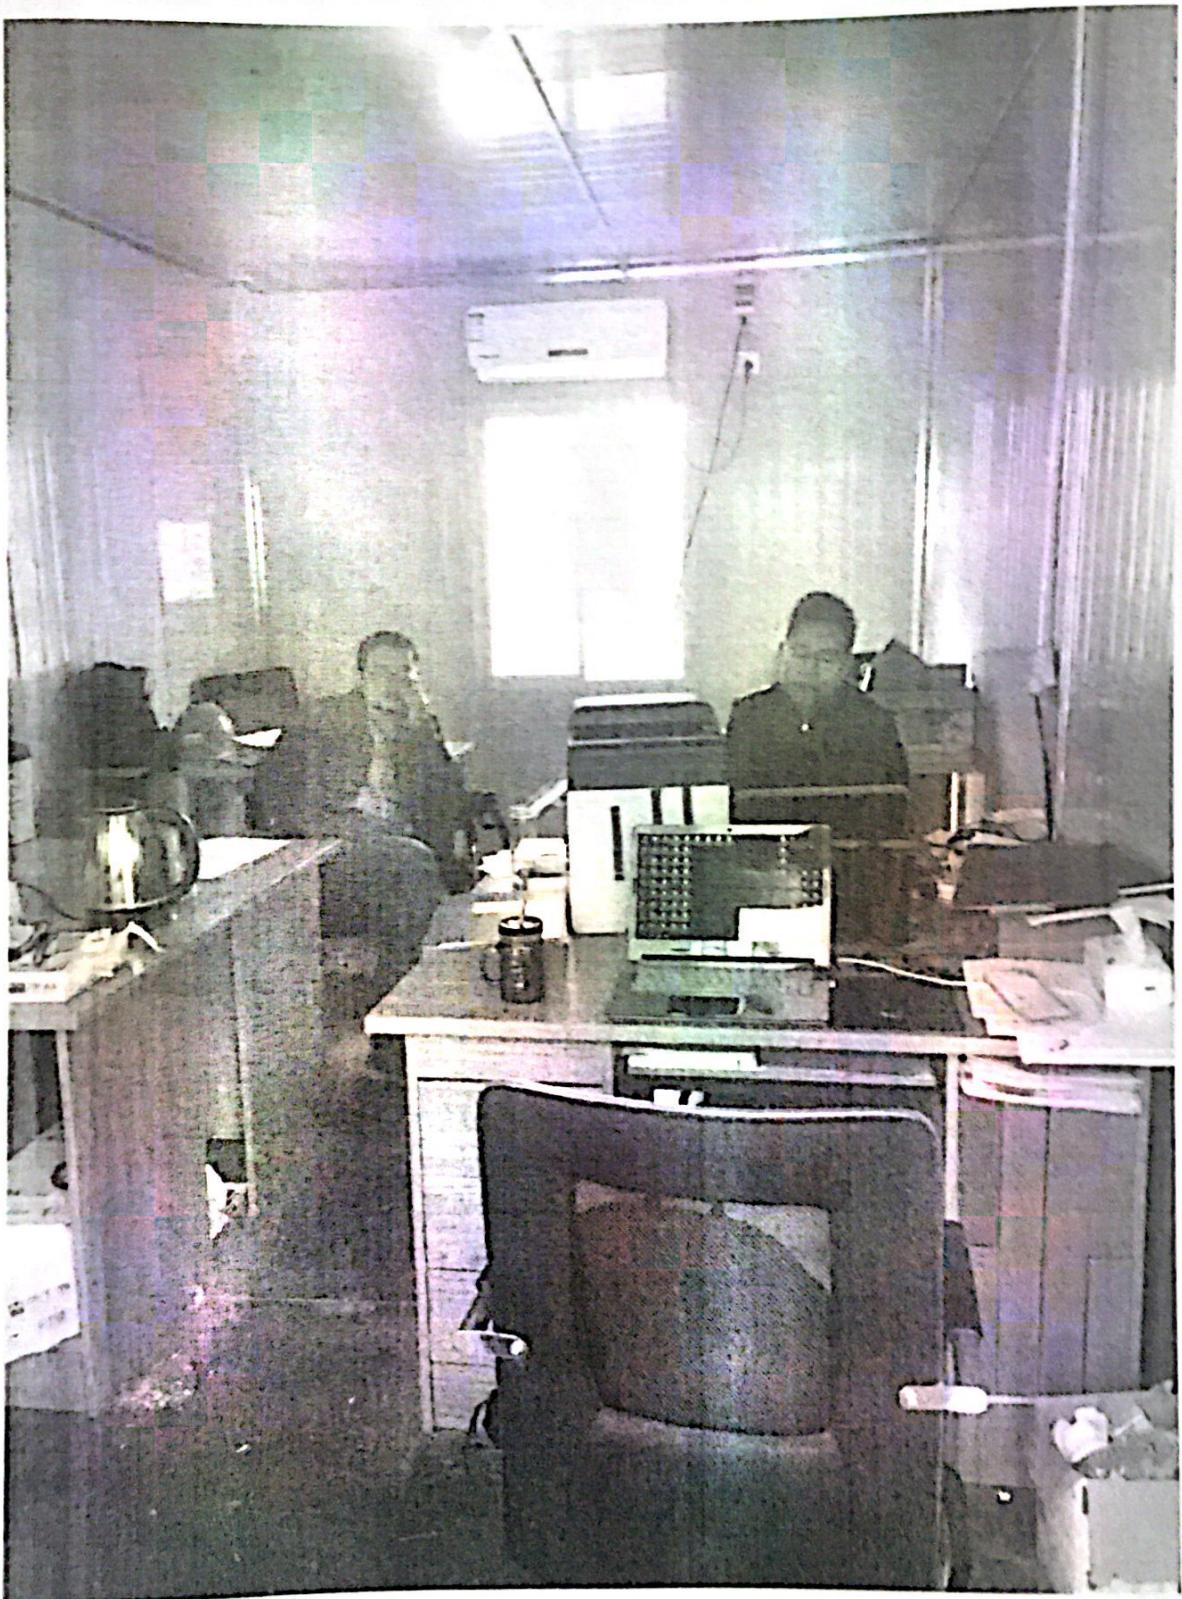

扫描全能王 创建

### 会议签到表

年 月 日



扫描全能王 创建
