

会议纪要

编号: GFDZJBM09-03

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目 (喜临门 2.8944MW)


签发: 南守明

会议地点	会议室	会议时间	2019年03月30日
会议主持人	李云		
会议主题: 下步工作安排。			
本次会议内容: 一、监理项目部: 本周施工现场安全、质量、进度情况: 1、2019年3月21日材料进场(光伏组件1426块), 2019年3月24号材料进场(光伏组件1381), 3月25日材料进场(光伏组件1223块), 3月27日材料进场(光伏支架5533根, 夹具、螺栓、螺母等), 3月29日材料进场(各种型号光伏电缆52718米), 3月30日材料进场(汇流箱35台)。 2、箱变基础因政策原因商混站暂未开业, 箱变基础未浇筑, 四周存在安全隐患, 应该安装指示标牌。 3、施工现场无安全隐患。 二、业主项目部: 施工工作要点及施工进度、质量、安全安排如下: 1、施工项目部二次进场保证施工中施工质量, 确认保质保量。 2、下周准备二次设备土方基础开挖, 做好防尘处理。 3、材料基本到场施工项目部做好材料保管, 以防材料丢失, 要做到专人保管。 4、施工项目部要做好人员管理, 遵守厂区管理。厂区存在吸烟区, 施工人员如需抽烟, 应到厂区规定的吸烟区。 5、每日要进行早班会(安全、质量进行交底), 确保施工现场安全零事故。 三、施工单位(喜临门2.8944MW): 1、施工项目部对业主项目部、监理项目部提出的各项安排及问题, 我方积极安排施工人员进行整改落实完成。 2、坚持对施工现场各个作业点进行常规检查, 督促施工单位在进度、质量、安全方面保质、保量、确保安全无事故。			
抄送单位	江苏中天科技工程有限公司		
发文单位	兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2019年03月30日

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发



扫描全能王 创建

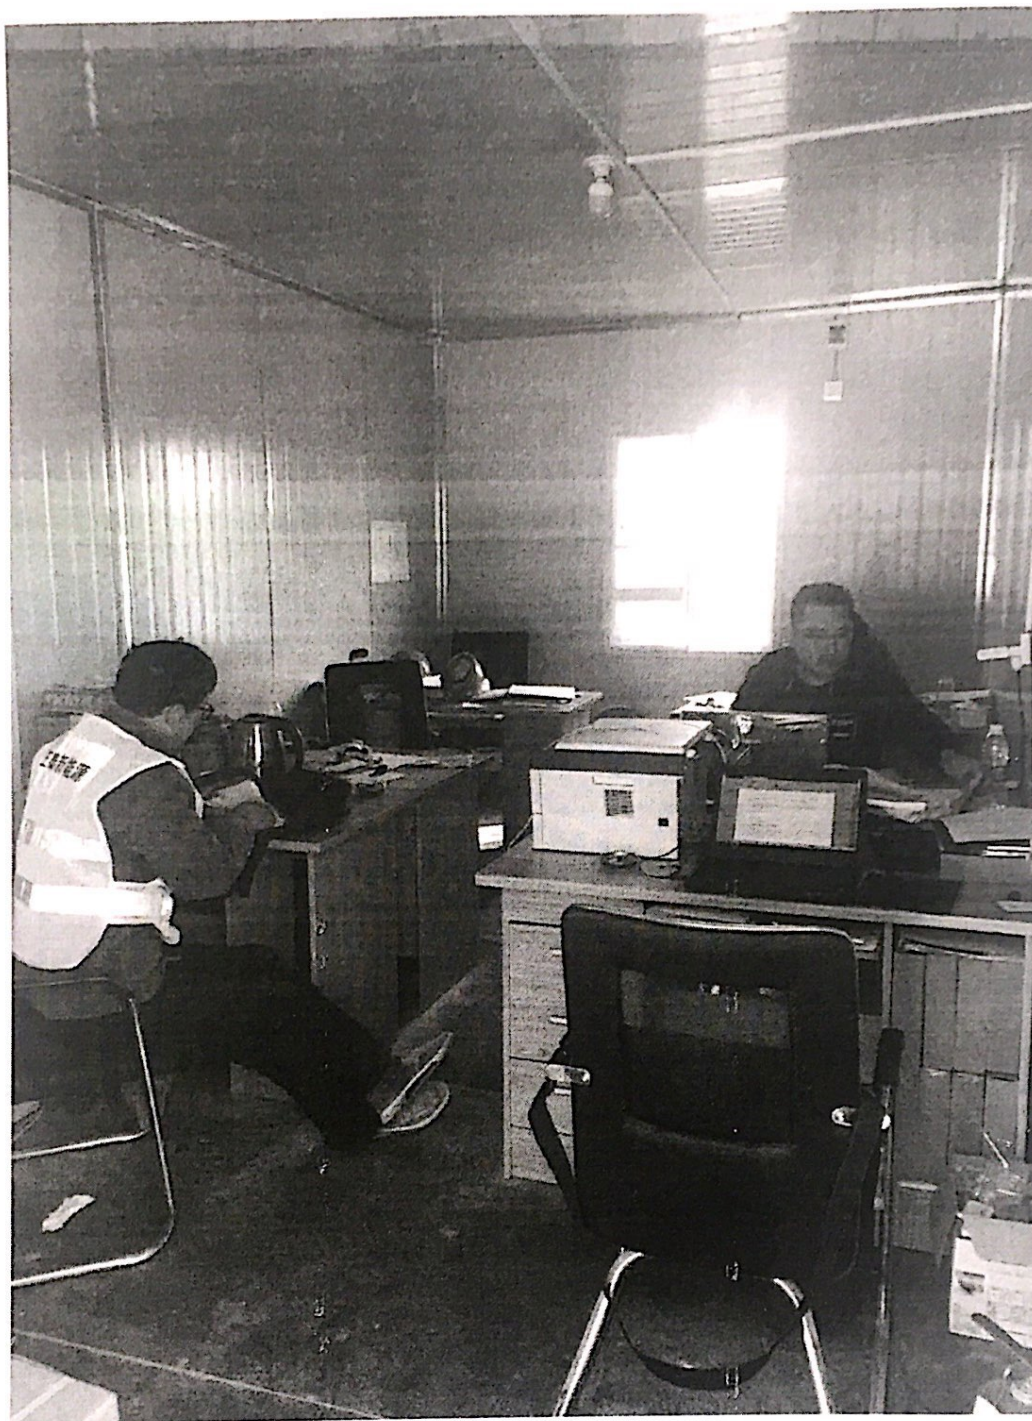

周监理例会



