


会议纪要

编号: GFDZJBM09-10

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-喜临门 2.8944MW 签发: 

会议地点	工地项目部	会议时间	2019 年 5 月 18 日
会议主持人	任远威		
会议主题: 下步工作安排			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 一、监理项目部: 本周施工现场安全、质量、进度情况: 1、喜临门 2.8944MWW 项目: (1)、2019 年 5 月 12 日材料进场 (二次预制舱设备一台), (2)、2019 年 5 月 13 日二次舱设备到场进行吊装作业, 监理人员进行现场安全旁站。 (3)、7 号屋面 4 平方电缆敷设, 本周完成 0.8MW, 2*95 支流电缆敷设, 本周完成 1MW (13 路汇流箱), 485 通信电缆敷设, 本周完成 0.3MW。 (4)、7 号屋面镀锌接地扁铁焊接, 本周完成 0.6MW。 (5)、2019 年 5 月 17 日 3*70、3*95 高压电缆敷设, 监理人员全程旁站确保施工无安全隐患。 (6)、现场安全检查, 未发现重大安全隐患。 2、曲美 1.971MWW 项目: (1)、2019 年 5 月 16 日施工人员进场, 同步进场材料 (夹具等材料 20500 只)。 (2)、2 号屋面光伏支架、檩条安装, 本周完成 0.3MW, 电缆桥架敷设安装, 本周完成 0.2MW。 (3)、2 号屋面汇流箱安装, 本周完成 0.5MW。 (4)、现场安全检查, 未发现重大安全隐患。 二、业主项目部: 施工工作要点及施工进度、质量、安全安排如下: 1、施工项目部要保证施工中施工质量, 确认保质保量。 2、施工项目部做好设备物资管控, 专人看管做到每日检查, 确保物资安全。 3、喜临门项目主高压电缆、直流电缆敷设完毕, 箱变进场日期未确定, 施工项目部做好箱变基础内敷设完毕的各类电缆安全问题。			

4、4、2019年5月16日曲美项目施工项目部进场为下步并网发电进行准备工作，做好下步并网发电的各项事宜。


5、每日要进行早班会（安全、质量进行交底），确保施工现场安全零事故。

三、施工单位：

1、施工项目部对业主项目部、监理项目部提出的各项安排及问题，我方积极安排施工人员进行整改落实完成。

坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，督促施工单位在进度、质量、安全方面保质、保量、确保安全无事故。

主送单位	江苏中天科技股份有限公司施工项目部		
抄送单位	兰考县恒泰光伏发电有限公司业主项目部		
发文单位	兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-喜临门监理项目部	发文时间	2019年5月18日

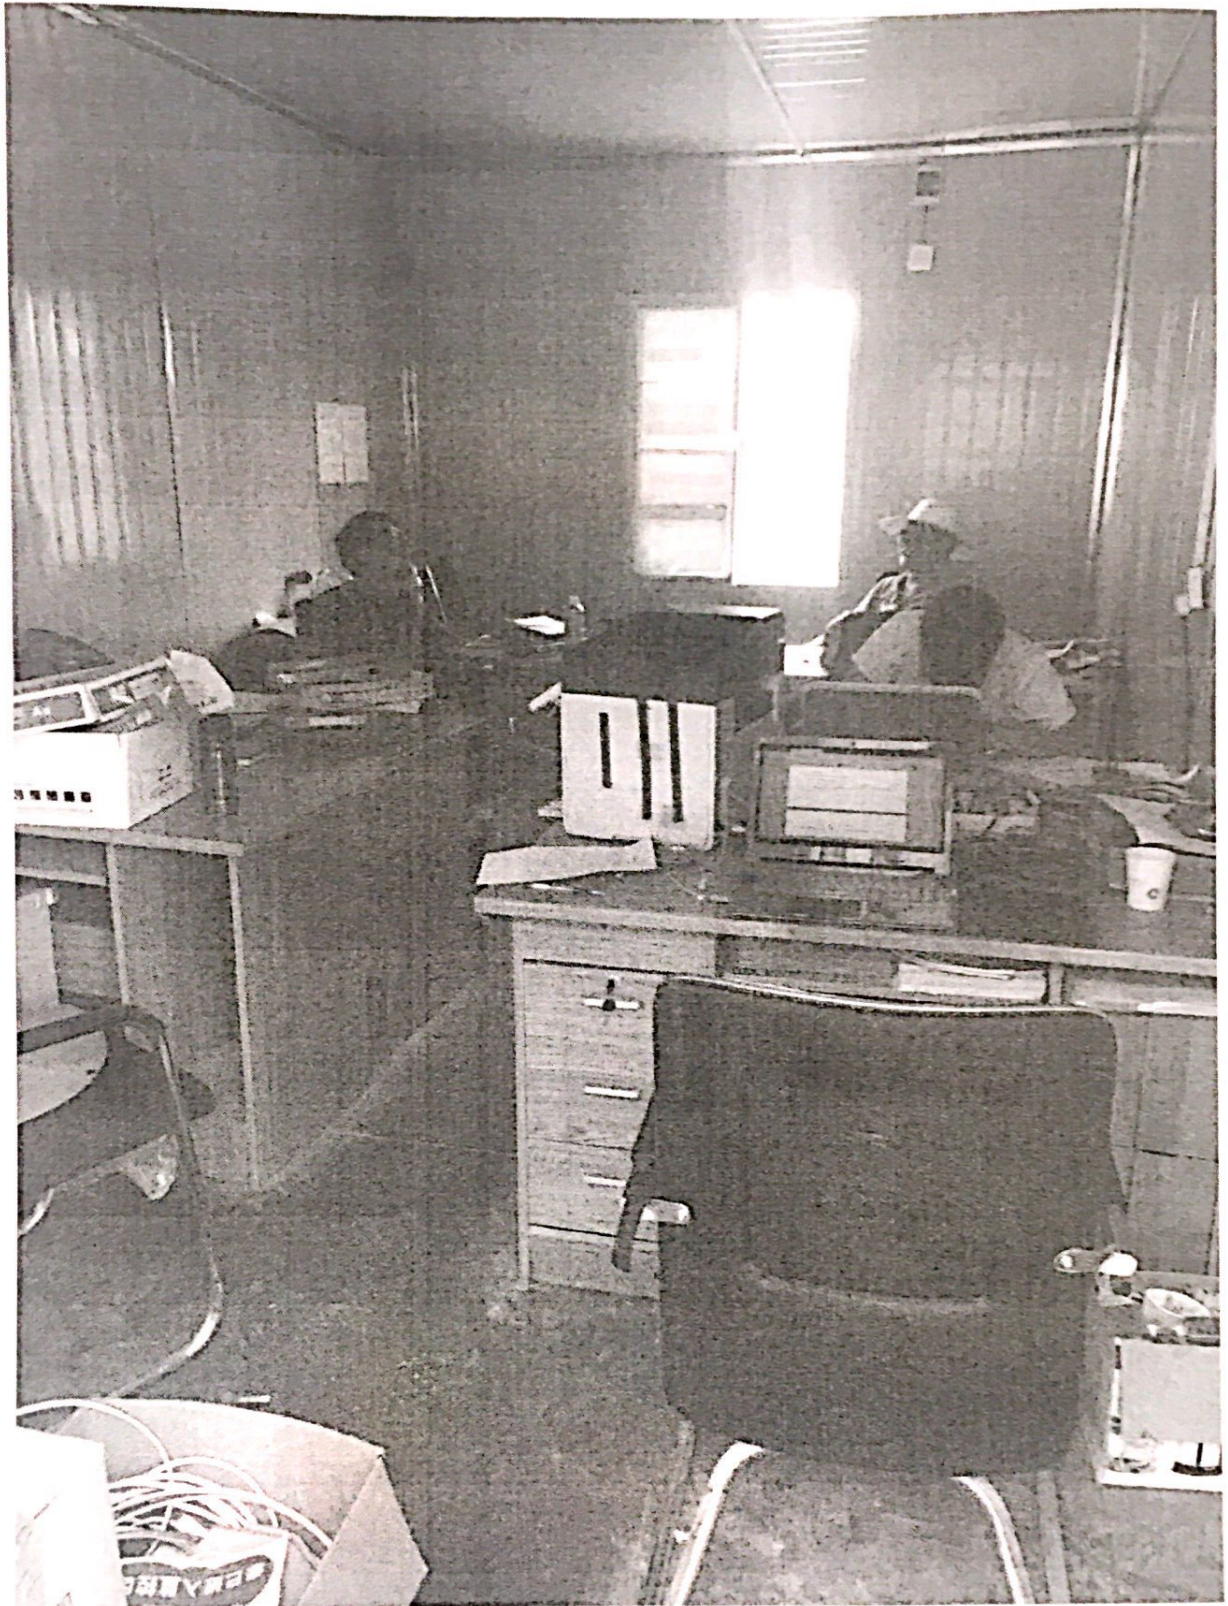

会议签到表

2019年5月18日

[illegible]
