

会议纪要

工程名称：天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp（一期 2WMp）光伏发电项目

编号：GHDZJBM09-TJXM-09

签发：王立成

会议地点	会议室	会议时间	2021年12月03日
会议主持人	田同有		
会议主题： 1、本周施工情况汇报以及下周施工计划；			
本次会议内容： 监理项目部： 本周情况：本周一期 2WM 未施工作业。 二期 3.5WM： 1、草坪光伏场区混凝土基础土方回填，多余的土方清理完成。 2、施工单位执行负责人每天在施工现场进行施工质量技术、安全防护等多管理，本周安全零事故，且无安全隐患。 下周要求： 监理项目部、业主项目部、要求施工项目部下周开展以下施工： 1、今日厂区停电计划以及停电施工方案已发在施工群里了，施工单位要严格按照施工方案进行管理、施工。 2、光伏支架檩条、并网柜进场后，在往屋顶吊装时，一定检查起重设备以及操作员有效证件，并做好安全防护措施。 3、新入场施工人员进场，施工项目部负责人要严格执行当地新冠肺炎防疫政策，进行健康码、出行码检查，并进行登记，报业主项目部备案。 3、各施工作业面每天施工结束后，应做到：“工完料尽、场地清”。 4、凡进入施工现场所有人员必须正确佩戴安全帽，否则以后一经发现，将进行处罚。各施工作业面严格做好安全防护、个人安全佩戴，严格遵守厂区各项要求、规定，要求安全零事故。 施工单位下周施工计划： 1. 安装光伏檩条、光伏组件，电缆敷设。			



扫描全能王 创建


2. 配电室并网柜安装、调试。
3. 光伏支架檩条、并网柜到场。
4. 每日会坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，严把安全质量关，确保安全零事故。

4. 每日会坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，严把安全质量关，确保安全零事故。

项目部、厂区安全部：

- 1、施工单位要严格按照《光伏并网停电施工方案》进行施工。
- 2、施工材料进场严格按照流程报审、并做好材料保护、保管。
- 3、施工单位要严格把控施工质量，按规范和要求进行施工，避免返工。
- 4、对新进场施工人员做好新冠疫情检测、登记工作。

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

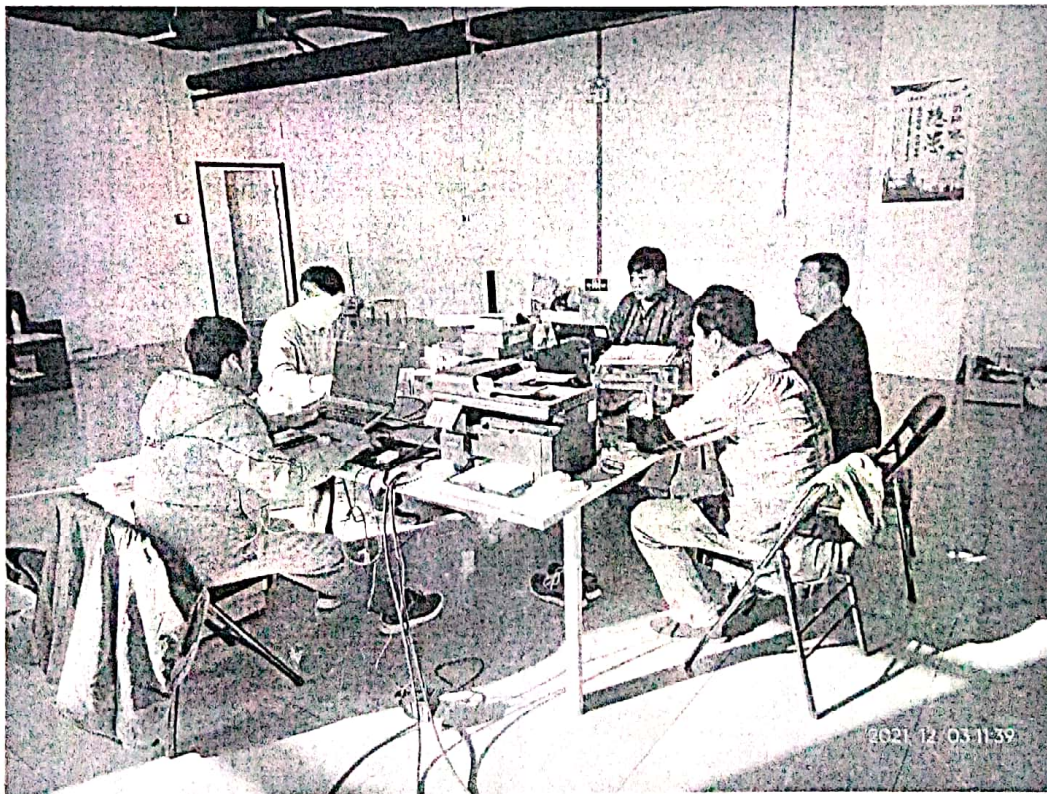

周监理例会



监理周例会会议签到表

时间: 2024年12月03日

序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话
1	田同有	正街监理		1598737925
2	冯海	锦源号		1382003492
3	周敬礼	四川红岩		15000070721
4	李治	=	=	13682401858
5	夏晓武	=	=	15335131581
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

