

第十八次会议纪要

常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部

2022年11月04日



扫描全能王 创建

监理例会

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZJN-FGLH-018

签发：王立才

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 11 月 04 日
会议主持人	田同有		

会议主题：关于安全管理、质量控制、进度推进等事宜；

参会人员签到表：

本次会议内容：对上周布置的工作进展进行检查,施工单位项目负责人汇报了本周施工进度，提出相关问题，监理单位、施工单位负责人例会上提出了要求，纪要整理如下分包单位（河南兴华电力设计有限公司）：

升压站：

本周人员、机械设备、仪器配置：

1、现场管理人员 1 人、技术员 1 人、施工人员 22 人。

2、水准仪 1 台，全站仪 1 台，挖掘机 1 台、25T 吊车 1 台、材料转运车 1 台。

一、本周完成工程量：

1、升压站内储能区高出地面基础拆除完成。

2、升压站内所有设备基础土方回填完成。

3、站内所有施工材料、机械设备转运出站外，并妥善保管。

二、下周的工作计划：

1、等待市国土局复验，准备复工作业。

2、每天对升压站进行安全巡检。

三、需要协调解决的事宜：

无

输出线路：

一、本周人员、机械设备、仪器配置：

1、管理人员 2 人，协调人员 2 人。

2、施工机械水准仪 1 台，全站仪 1 台，GPS 1 台。

二、本周完成工程量：

1、本周无施工作业。2、施工现场（各塔基）安全巡查。



三、下周的工作计划:

- 1、施工现场(各塔基)安全巡查。
- 2、待T接点确认停电事宜协调完成后,展开施工作业。
- 3、严格遵守当地疫情防控政策。

分包单位(河南奥纳电力工程有限公司):

一、本周完成工程量:本周人员、机械设备、仪器配置:

- 1、管理人员5人,特殊工种人员5人,施工人员平均8人。
- 2、1台打桩机、1台拖拉机、1台引孔机。

二、本周完成工程量:

- 1、支架安装0.8WM,累计安装59.35WM。完成率89.20%。
- 2、

三、材料到货:

管桩到货376根,累计到货16861根,到货率91.25%。

四、下周的工作计划:

- 1、打桩600根(根据预应力管桩到货情况)。
- 2、支架安装3MW。
- 3、部分电缆沟整改。
- 4、1#-4#光伏方阵电气安装。
- 5、光伏场区围栏安装1000m。

五、需要协调的相关事项:

- 1、9、10月份施工进度款需尽快支付(今日组团去禹州市劳动局进行上访,劳动局工作人员已电话通知我方、并限期到下周五之前支付工人工资,否则将采取措施)。

总包单位(山东力诺电力设计咨询有限公司):

光伏区:

1、本周光伏区施工进度严重滞后,电气部分8月份已具备施工作业条件(电缆、汇流箱已到货),截止今日光伏直流电缆敷设仅完成13.38%,地理电缆敷设未展开施工。

2、应分包单位要求总包、监理单位对部分段落电缆沟进行了验收,经检验不符合设计要求,要求你单位对电缆沟底部垃圾、渣土进行清理,并标注场内正负零标高位置,截止本周仍然不具备电缆敷设条件。



3、光伏区光伏支架安装方面，一定严格按照设计和规范要求安装，对个别不符合设计要求，要进行调节、整改，为光伏组件安装奠定基础，确保光伏组件安装达到设计要求。

4、光伏区桩位引孔、打桩时，定位仪器、人员必须按设计和规范要求进行施工，偏差要控制在图纸要求之内。

5、光伏区围栏安装，要严格按照设计图纸进行施工安装，对已安装完成的、个别不符合要求的围栏要进行整改。

升压站：

本周升压站要按要求进行整。

输出线路：

本周你单位已具备施工作业条件，尽快组织特种作业人员展开作业，在确保安全的情况下，提高施工进度。

监理单位（常州正衡电力工程监理有限公司）：

因上周当地疫情防护政策升级，个别居住村落封闭管理，故上周末召开监理周例会，本周会议各参建单位连同上周情况一并进行汇报，监理项目部对两周施工现场检查情况汇总如下：

新冠疫情防控方面要求：

- 1、所有人员要遵守当地防疫管控政策，按要求进行核酸检测。
- 2、如需增加施工人员，由许昌市之外地区过来，需向当地有关部门提前三天报备。
- 3、施工区域进出口处设置疫情检测，做好人员登记、测量体温、佩戴口罩。

施工现场安全检查情况：

- 1、本周光伏区施工现场无安全隐患，安全无事故。
- 2、升压站：站内设备人工拆除、机械设备土方回填，安全操作规范，无安全隐患。
- 3、要求施工现场机械设备、转运材料车辆，要定期检查、保养、维修。
- 4、每天早班会要进行安全技术交底，要求所有施工人员要正确佩戴安全帽、系好安全帽带，反光背心拉链要系好，上班时要第一时间检查施工设备安全性能（电焊机等）。

质量方面：

- 1、光伏支架安装螺栓紧固到位，未发现漏安装螺栓、平垫、弹簧垫等现象。
- 2、升压站设备基础钢筋绑扎符合设计要求。

其它：



1、监理通知单 13#、14#未回复单，尽快予以回复，之前缺失报审、报验资料要尽快补齐。

2、材料进场须通知监理项目部参加验收，材料进场需：供货商（生产厂家）资质、厂家自检报告、出厂合格证、送货清单等。


3、各参建单位施工合同里要求自购材料，应尽快采购到场，以免制约施工进度。

4、个别单位图纸到场后未进行图纸会审的，要通知各有关单位进行会审。

5、自购材料进场后，需要第三方检测机构的材料，要及时通知监理项目部到场，进行取样送检，否则后果自负。

建设单位(禹州市晶能光伏发电有限公司):

因特殊情况（道路封控），暂无参加会议。

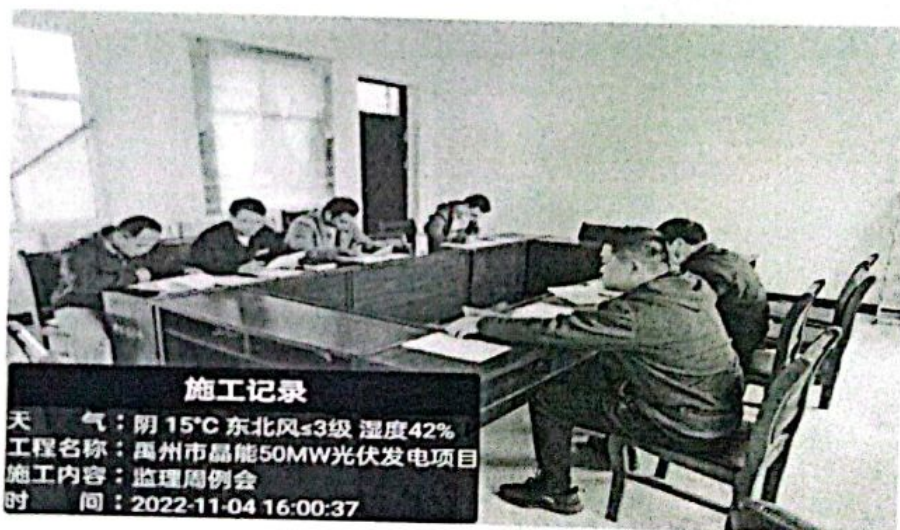

主送单位	禹州市晶能光伏发电有限公司项目部		
抄送单位	山东力诺电力设计咨询有限公司施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间	2022 年 11 月 04 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

