

禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

第三十五次会议纪要

常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部

2024 年 03 月 10 日

监理单位

#

要求施工单位严禁使用，否则一切后果由施工单位承担。

4、电缆、光纤敷设不符合要求，存在间距不规范，个别电缆深度不符合要求，甚至未盖砖就土方回填，且未通知监理、总包进行验收。

5、资料报审仍未落实。

监理单位（常州正衡电力工程监理有限公司）：

一、质量进度方面：

1、11#光伏区支架、组件安装缓慢。

2、13#-16#汇流箱存在的问题整改不到位。

3、10#、11#箱逆变设备及基础内电缆进出处未做防火封堵，电缆未按设计要求进行涂刷防火涂料，箱体与环网接地未制作（计划高压侧带电）。

4、监理项目部要求施工单位多次，把1#、2#分支箱进箱体电缆做防火涂料、保护管保护、踏步砌筑，截止今日仍未开展（要求停电时整改）。

5、电缆沟、接地沟回填严重缓慢，接地扁铁施工人员偏少。

6、尽快采购10#、11#光伏区缺少的支架材料，以免影响施工进度。

7、视频监控单位施工进度缓慢，已立杆部分不锈钢控制箱箱门未关，导致被大风的左右摆动，存在箱体损坏及安全隐患。

二、安全方面：

1、施工区域人员仍有未佩戴安全帽及安全带（支架、支架安装人员）。

2、场区安全巡查不到位，时常丢失施工材料，总包项目部多次要求关键场区进出口安装摄像头，至今未安装。


3、临时用电线路私拉乱扯，动火作业处未配备灭火器等消防设施。

4、机械设备作业处仍未配备安全监护人。

5、已安装完成的光伏方阵，个别损坏的组件、支架未收集。

主送单位	禹州市晶能光伏发电有限公司项目部		
抄送单位	山东力诺电力设计咨询有限公司施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间	2024年03月10日



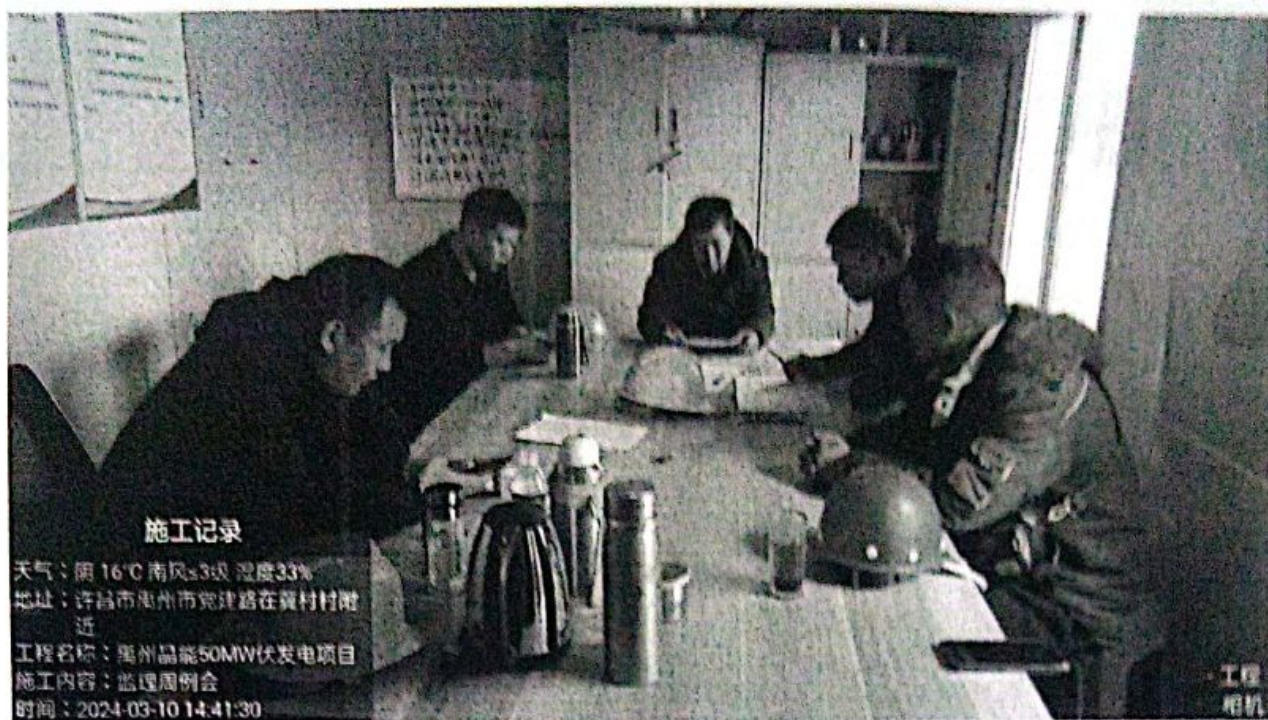

施工记录

天气：阴 16℃ 南风 3级 湿度33%
地址：许昌市禹州市党建路在魏村附近
工程名称：漯河晶能50MW光伏发电项目
施工内容：监理周例会
时间：2024-03-10 14:41:30

工程
相机

监理周例会会议签到表

时间: 2024年03月10日

序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话
1	田国利	工程监理		15978737721
2	杨刚	君成科技		15994091185
3	刘俊强	驻马店怡轩科贸		17740441440
4	袁育强	力诺		18396873319
5	常洪磊	力诺		13949842549
6	胡志峰	君成科技		15443662590
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
