

监理例会

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZJN-FGLH-016

签发：王立东

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 10 月 21 日
会议主持人	田同有		
会议主题：关于安全管理、质量控制、进度推进等事宜；			
参会人员签到表：			
本次会议内容：对上周布置的工作进展进行检查,施工单位项目负责人汇报了本周施工进度，提出相关问题，监理单位、施工单位负责人例会上提出了要求，纪要整理如下 分包单位（河南兴华电力设计有限公司）： 升压站： 本周人员、机械设备、仪器配置： 1、现场管理人员 1 人、技术员 1 人、施工人员 28 人。 2、水准仪 1 台，全站仪 1 台，小钩机 1 台。 一、本周完成工程量： 1、站用变构造柱模板支设完成100%。 2、避雷针正负零以下模板支设完成；综合楼基础清槽完成100%。 3、围墙正负零以上墙体砌筑完成100%，压顶支模完成10%。 4、主变区预埋件安装完成100%，储能区圈梁模板支设完成100%。 5、二次舱，一层舱、接地变基础垫层浇筑完成100%。 二、下周的工作计划： 1、根据国土局要求进行整改。 2、对施工现场坚持每天安全巡查。 3、严格遵守当地疫情防控政策。 三、需要协调解决的事宜： 根据国土系统要求进行整改，整改后需联系国土部门验收。 输出线路： 一、本周人员、机械设备、仪器配置： 1、管理人员2人，协调人员2人。			



2、施工机械水准仪1台，全站仪1台，GPS1台。

二、本周完成工程量：

1、本周无施工作业。2、施工现场（各塔基）安全巡查。

三：下周的工作计划：

1、施工现场（各塔基）安全巡查。

2、待T接点确认停电事宜协调完成后，展开施工作业。

3、严格遵守当地疫情防控政策。

分包单位（河南奥纳电力工程有限公司）：

一、本周完成工程量：本周人员、机械设备、仪器配置：

1、管理人员5人，特殊工种人员5人，施工人员平均60人。

2、2台打桩机、2台拖拉机、1台引孔机。

二、本周完成工程量：

1、打桩491根。

2、支架安装5.16WM，累计安装55.487WM。

3、光伏场区围栏安装100m。

三、材料到货：

光伏支架到货2WM。

四、下周的工作计划：

1、打桩500根（根据预应力管桩到货情况）。

2、支架安装7MW。

3、根据光伏组件到货情况，安装1#-4#光伏方阵。

4、部分电缆沟整改。

5、1#-4#光伏方阵电气安装。

6、光伏场区围栏安装1000m。

五、需要协调的相关事项：

1、升压站需协调事宜：国土系统要求整改，正在整改，整改后需协调国土系统验收。。

2、9月份施工进度款需尽快进入流程。

总包单位（山东力诺电力设计咨询有限公司）：

光伏区：



1、光伏区光伏支架安装方面，一定严格按照设计和规范要求安装，对个别不符合设计要求，要进行调节、整改，为光伏组件安装奠定基础，确保光伏组件安装达到设计要求。

2、光伏区桩位引孔、打桩时，定位仪器、人员必须按设计和规范要求进行施工，偏差要控制在图纸要求之内。

3、施工现场桩头焊接区域，安全防护要按要求进行配置齐全。

4、光伏区围栏安装，要严格按照设计图纸进行施工安装，对已安装完成的、个别不符合要求的围栏要进行整改。

5、关于9月份款项支付，正在审批流程中。

6、电气施工进度已严重延迟，需采取有效措施，加大资源投入进行赶工。

升压站：

本周升压站按要求进行了整改，在停工期间施工现场要做好安全防护措施，并派专人对施工区域进行看护。

输出线路：

本周你单位已具备施工作业条件，尽快组织特种作业人员展开作业，在确保安全的情况下，提高施工进度。

监理单位（常州正衡电力工程监理有限公司）：

因上周当地疫情防护政策升级，个别居住村落封闭管理，故上周末召开监理周例会，本周会议各参建单位连同上周情况一并进行汇报，监理项目部对两周施工现场检查情况汇总如下：

新冠疫情防控方面要求：

- 1、所有人员要遵守当地防疫管控政策，按要求进行核酸检测。
- 2、如需增加施工人员，由许昌市之外地区过来，需向当地有关部门提前三天报备。
- 3、施工区域进出口处设置疫情检测，做好人员登记、测量体温、佩戴口罩。

施工现场安全检查情况：

- 1、光伏区三级配电箱、电焊机接地装置已整改到位，灭火器已更换，符合安全要求。
- 2、施工现场支架安装人员高空作业，仍有个别人员未穿戴安全带，望专职安全员加强对现场施工人员思想教育，提高安全意识。
- 3、施工现场土方开挖、打桩、预应力管桩桩头焊接以及高空作业区域应有专职安全员跟踪作业应配置安全监护人进行现场监护。



4、施工现场孔洞、电缆沟（接地沟）要做好安全防护措施，并设置警示标识。

5、每天早班会要进行安全技术交底，要正确佩戴安全帽、系好安全帽带，反光背心拉链要系好。

质量方面：

1、本周光伏支架安装未出现用铁锤进行调节抱箍偏差，希望保持发扬。

2、个别光伏支架连接处，存在缺少螺栓紧固以及螺栓紧固不到位情况，经监理人员告知现场施工技术管理人员后施工单位进行了排查，并就进行了安装、紧固。

3、围栏安装方面，孔深以及孔洞内虚土要清理干净，围栏基础引孔要掌握立柱之间距离，因地形复杂，出现与图纸要求不符的地方要及时向总包单位负责人汇报。

4、围栏基础混凝土为自拌，要切实按 C30 混凝土配合比进行配料，确保施工质量符合设计要求。

5、桩头支架立柱焊接处焊渣要清理彻底，应及时做防腐处理。

其它：

1、监理通知单 13#、14#未回复单，尽快予以回复，之前缺失报审、报验资料要尽快补齐。

2、材料进场须通知监理项目部参加验收，材料进场需：供货商（生产厂家）资质、厂家自检报告、出厂合格证、送货清单等。

3、各参建单位施工合同里要求自购材料，应尽快采购到场，以免制约施工进度。


4、个别单位图纸到场后未进行图纸会审的，要通知各有关单位进行会审。

5、自购材料进场后，需要第三方检测机构的材料，要及时通知监理项目部到场，进行取样送检，否则后果自负。

建设单位(禹州市晶能光伏发电有限公司)：

因特殊情况（道路封控），暂无参加会议。



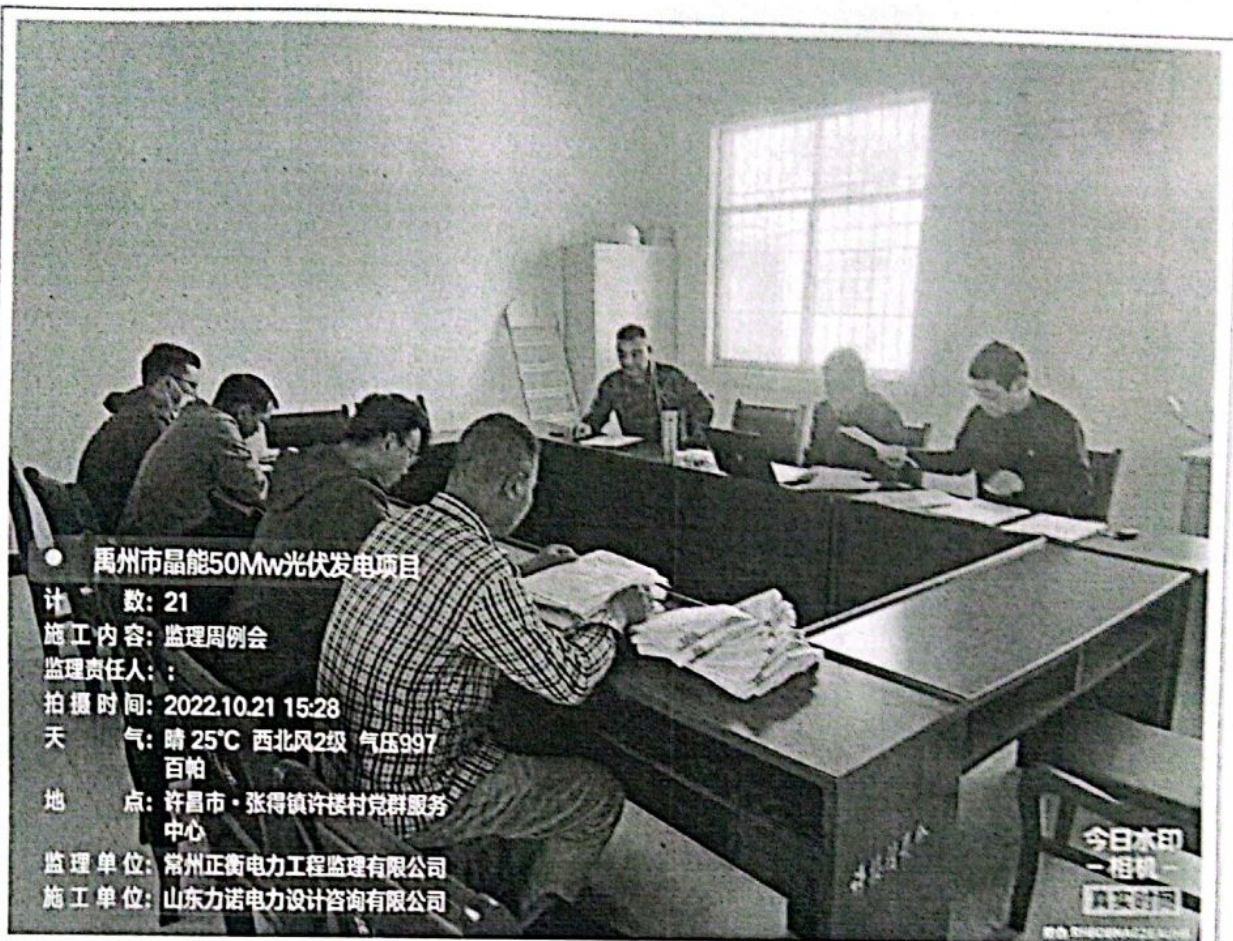

主送单位	禹州市晶能光伏发电有限公司项目部		
抄送单位	山东力诺电力设计咨询有限公司施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间	2022 年 10 月 21 日

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



监理周例会会议签到表

时间 2022年10月24日

序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话
1	袁青波	山东力诺		18396873319
2	裴志杰	山东力诺		12658605933
3	田同有			
4	高晓峰	河南兴华		13623862310
5	张楠	河南兴华		18737416268
6	彭机磊	奥纳电力		1831763702
7	马松涛	奥纳电力		1553113815
8	张锦	奥纳电力		18337146782
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				



禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

第十六次会议纪要

常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部

2022 年 10 月 07 日

