

禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

第 二 十 八 次 会 议 纪 要

常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部

2023 年 10 月 22 日

监理周例会议纪要

工程名称：禹州市品能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZJN-FGLH-028
签发：

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 10 月 22 日
会议主持人	田同有		
会议主题：监理周例会			
本次会议内容：因工作情况，分包单由原《河南奥纳电力工程有限公司》变更为《许昌君诚科技有限公司》，目前施工现场名管理人员 4 名，施工机械设备已入场：打桩机一台、叉车一台、钩机一台、材料转运车一辆。施工单位情况汇报，监理单位、总包单位负责人例会上提出了要求，纪要整理如下： 监理单位（常州正衡电力工程监理有限公司）： 1、施工现场光伏支架撤卸后，檩条、背拉条等材料堆放杂乱，未进行分类存放，不利于二次利用，会造成材料扭曲变形等情况。 2、拆除区域光伏组件码放不符合要求，存在码放数量过多、错台、挤压光伏直流线等情况，且多块光伏组件受损，12#、7#、8#、9#光伏方阵区域光伏组件多处存放不正确，倒伏、倾斜，个别组件仅一块靠在管桩上，易被大风吹到造成组件损坏。 3、施工现场部分人员长期不带安全帽、高空作业不佩戴安全带，存在着人员较大的安全隐患。机械作业未配置安全监护人（拔桩、电缆沟开挖、桩头立柱切割）、动火施工处未配置消防设备，坑洞未设置安全警戒带及安全警示标牌。 4、组件安装存在错台、锯齿状，下沿不在同一直线，个别组件压块紧固不符合要求。 5、施工进度缓慢、人员不满足施工进度需求，施工工序安排不合理，施工机械设备偏少，不满足现场施工作业需求，特别电气工程迟迟未进场开展施工作业。 6、施工日志要安排人员进行汇报，要求尽快配备一名会操作电脑人员，以便于施工资料编制、施工日志汇报、材料登记等事宜。 总包单位（山东力诺电力设计咨询有限公司）： 1、施工项目部管理人员职能分工要明确、安全、技术、电气、土建、资料等人员尽快配齐，各负其责，确保项目顺利开展。 2、要求施工单位每天早上组织召开早班会，对施工人员进行安全技术交底，并拍照			

发至施工群内。

3、光伏支架及组件、预制管桩拔桩拆除方面，在确保损坏率最小的情况下加快进度，目前情况损坏率已超出预算比例，对已拆除的材料要及时收集、安全转运并妥善保管，以便二次利用，拆除现场螺栓螺帽平垫弹簧垫收集不到位。

4、现场安全文明施工方面：（1）1#光伏区电力照明要恢复正常，视频监控连接，路口、高压电缆存放处应设置照明设备（如投射灯）。（2）集装箱晚上需住人值班看守，并进行不间断巡查，以免材料丢失、损坏。（3）各路口要设置指示标牌，光伏方阵要设置标识牌以及施工区域安全警示牌。（4）施工项目部区域以及物料存放区要配置照明系统。（5）施工场地要做到：人走料净场地清（每天下班要收集施工材料、生活垃圾，对已安装完成的区域，多余材料、组件要进行收集存放，组件托盘、外包装纸箱总包项目部要回收）。

5、1#光伏区存放的光伏直流电缆、支架材料等要进行收集并转运材料存放区。

6、对所有入场人员人身保险尽快办理，并项目部留存本案。

7、项目部要建立健全材料存放区（仓库），对不同类型的材料要分类码放并设置材料标识牌，建立健全入库出库登记制度。

8、安全方面：每天项目部负责人要对施工现场排查存在的安全隐患，要做到事前排除隐患，避免发生安全事故，确保安全零事故。

9、施工质量：现场组件安装、电气工程、隐蔽工程必须要按施工蓝图进行施工，每道工序完成后要报监理项目部进行检查验收，合格后方可进行下到工序施工开展。

10、施工进度：施工进度总节点12月30日要全额并网发电，施工单位要制定施工计划（月计划、周计划），供总包、监理项目部审核。

分包单位（许昌君诚科技有限公司）：

自即日起，施工项目部下周工作安排：


1、坚持每天安全巡视场区二次，对无关人员进行排查。

2、建立材料保管区，不同类型的材料分类码放并设置材料名称标识牌，对场内所有的坑洞设置安全警示牌以及安全警示带，光伏方阵、道路标识牌设置完善。

3、1#光伏方阵照明系统完善并派人常驻看护。

4、建立健全各项规章制度，每天定时组织早班会，对施工人员进行当天的施工工序、人员安全等进行交底，并拍照发至施工群内。

- 5、加大施工机械设备投入，满足施工进度需求。
- 6、对已破损的围栏进行加固维修，确保场区内材料物品等被盗。
- 7、现场管理人员既有分工又要相互配合。

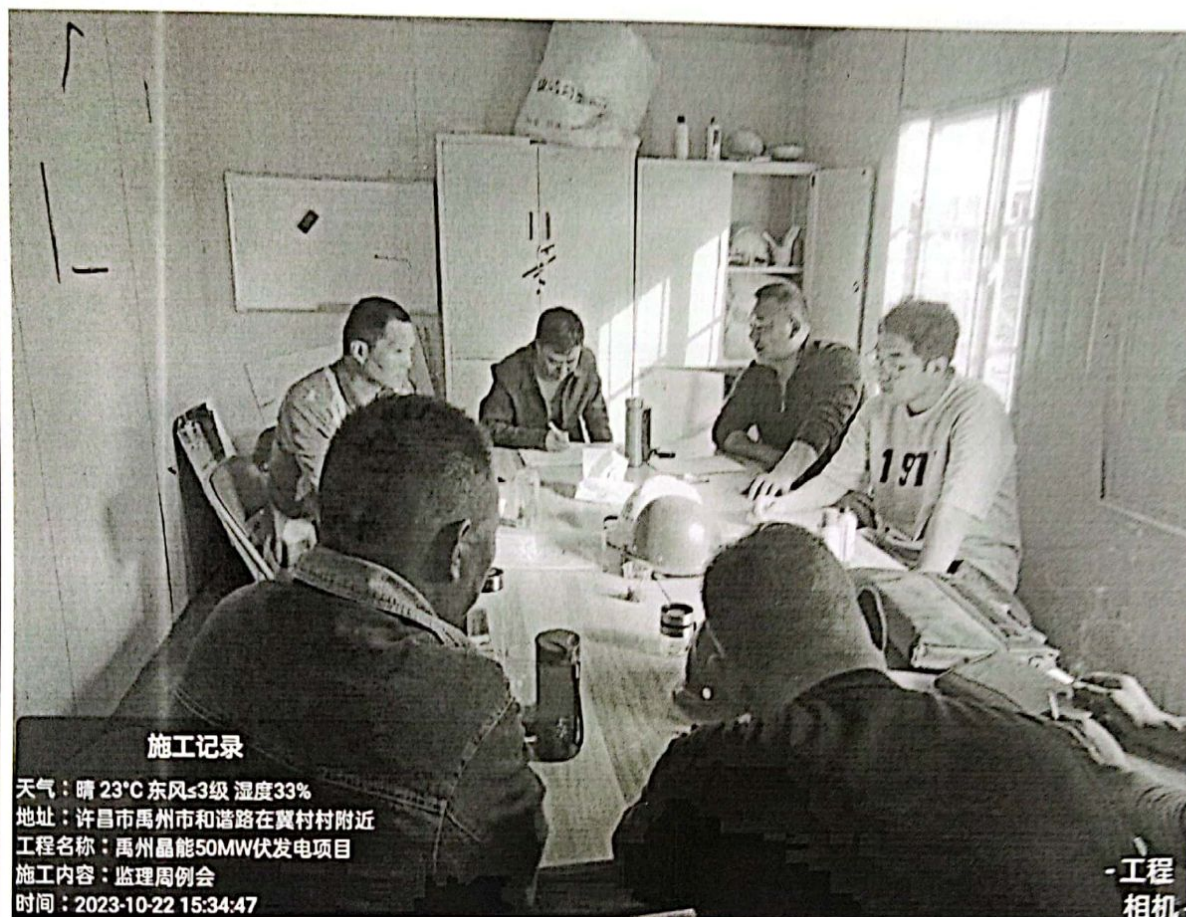

施工记录

天气：晴 23°C 东风≤3级 湿度33%
地址：许昌市禹州市和谐路在冀村村附近
工程名称：禹州晶能50MW光伏发电项目
施工内容：监理周例会
时间：2023-10-22 15:34:47

工程
相机

主送单位	禹州市晶能光伏发电有限公司项目部		
抄送单位	山东力诺电力设计咨询有限公司施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间	2023年10月22日



监理例会会议签到表

时间: 2021年10月22日

序号	姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
1	田国存	正德监理	总代	1597873794
2	袁春波	力诺		18396873319
3	袁吉成	力诺		17854267327
4	杨代	君诚		13569918529
5	苗国成	君诚		13569911096
6	田吉成	君诚		15493662540
7	田文才	君诚		13782388589
8	杨代	君诚		15994091185
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
