

禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

第二十九次会议纪要

常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部

2023 年 10 月 29 日



监理周例会议纪要

工程名称：禹州市品能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZJN-FGLH-029

签发：王立军

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 10 月 29 日
会议主持人	田同有		
会议主题：监理周例会			

本次会议内容：本周光伏区施工进度、质量、安全情况，纪要整理如下：

分包单位（许昌君诚科技有限公司）：

本周：管理人员5人，施工人员90人左右，机械投入：挖掘机3台、叉车2台、打桩机1台、引孔机1台、平板车2台、拖拉机1台、引孔机1台：

- 1、光伏组件安装11万块、光伏直流电缆敷设3万米。
- 2、7#、8#、9#、10#区高压电缆沟电缆沟开挖完成，具备高压电缆敷设条件。
- 3、7#、8#、9#高压电缆沟预制管桩桩头下引、沟内接地扁铁焊接完成。
- 4、4#光伏方阵组件、支架拆除转运、拔桩完成。
- 5、部分安全警示标牌已制作完成。
- 6、确保11月10日7#、8#、9#光伏区并网，否则愿意接受总包项目部考核。

总包单位（山东力诺电力设计咨询有限公司）：

- 1、本周施工情况比上周有所进步，如：施工现场部分警示标牌已制作，1#光伏区已住人看场，拆除的光伏支架存放至少没有直接放在地面，希望继续保持。
- 2、要求下周施工早班会进入正轨，周一、周三所有施工人员必须参加，其它时间可各施工班组长参加，对施工人员进行检查人员安全着装、配置，当日施工安排及施工质量（安全技术交底），早班会时间定于早上7.30并拍照发至施工群内。
- 3、要求技术员、资料员本周到场，以免现场工序与图纸不符，现场施工资料要与现场施工同步（报审、报验等）。
- 4、现场施工进度与安全文明施工方面：11月10日7#-9#发电单元必须并网发电，延迟一天考核2000.00元，进入光伏区人员未戴安全帽者考核200.00元/人，高空作业佩戴安全带者考核3000.00元/人，施工现场安全警示标牌要按要求进行设置，坑基、电缆沟周围要设置安全带及警示标牌，动火作业面要配置灭火器等消防设备。

5、拆除部分要尽快对现场未转运的支架、管桩进行清理，特别是预应力管桩，在二次转运过程中确保管桩不被损坏，损坏率降到最低。

6、关于箱逆变基础底部清理以及施工，要尽快开始动工，特别是01#分支箱基础位置确定，由你方技术员与电气、土建班组结合现场确认，尽快基础开挖、放线等施工。

7、现场高低压电缆敷设人员尽快到场开展施工，并熟悉施工蓝图。

监理单位（常州正衡电力工程监理有限公司）：

1、13#、15#光伏组件安装个别阵列存在上下错台、锯齿状，下沿不在同一直线，中压块未压满，易被大风吹落等情况存在安全隐患。


2、管桩桩头接地扁铁焊接处除锈不到位，个别扁铁焊接焊渣未清理以及未做防腐处理，动火作业处（扁铁焊接、桩头切割）未配置合格的灭火器及铁锹等消防设施。

3、施工现场部分人员长期不带安全帽、高空作业不佩戴安全带，存在着人员较大的安全隐患。机械作业未配置监护人（老问题）。

4、7#、8#、9#光伏区汇流箱至箱逆变以及高压电缆沟已具备敷设条件，电气班组迟迟未进场，土建班组对分支箱基础位置未进行定位，现严重制约施工进度。

5、施工现场接地角铁、防腐漆及其它辅助材料。

6、施工现场要配置一名资料员，未向监理项目部进行施工工序报审、报验，施工日志编制不规范（总包项目部有模板）。

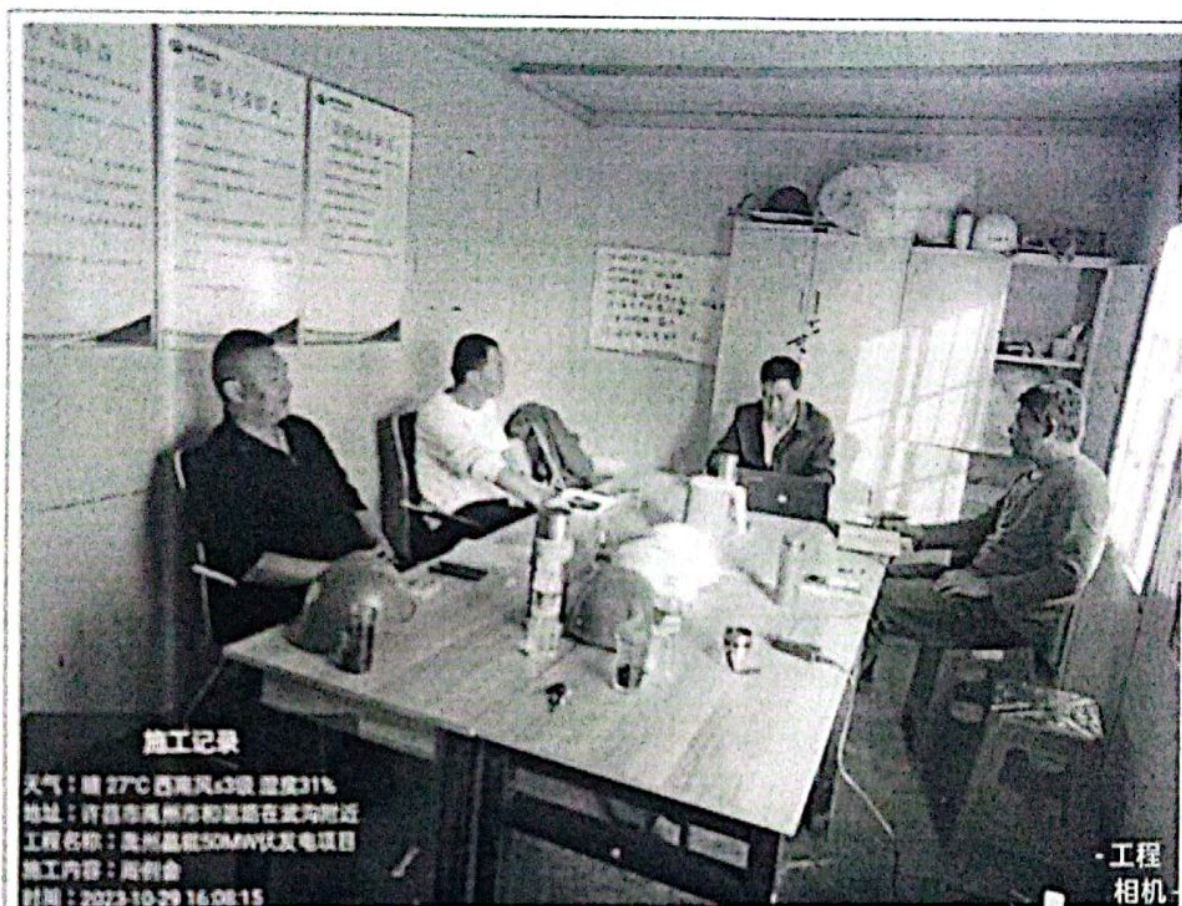

施工记录

天气：晴 27°C 西南风 3级 湿度31%
地址：许昌市禹州市和基路在武沟附近
工程名称：禹州市品能50MW光伏发电项目
施工内容：周例会
时间：2023-10-29 16:08:15

工程
相机

主送单位	禹州市品能光伏发电有限公司项目部		
抄送单位	山东力诺电力设计咨询有限公司施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间	2023年10月29日

监理例会会议签到表

时间 2023 年 10 月 27 日

序号	姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
1	周国权	上海强理	总监	15978737925
2	杨成	君诚公司	老总	13561978129
3	杨滔	君诚公司	主管	15974091185
4	谢文林	君诚公司	主管	13782388189
5	袁青波	力诺		18396873319
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
