

禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

第 二 十 二 次 会 议 纪 要

常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部

2023 年 03 月 10 日



监理例会

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZJN-FGLH-022

签发：王立杰

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 03 月 10 日
会议主持人	田同有		

会议主题：监理周例会

本次会议内容：对上周布置的工作进展进行检查,施工单位项目负责人汇报了本周施工进度,提出相关问题,监理单位、施工单位负责人例会上提出了要求,纪要整理如下
分包单位(河南兴华电力设计有限公司):

升压站:

1、本周完成工程量:

- (1) 人员: 管理人员6人, 技术员3人, 工人32人, 施工机械水准仪1台, 全站仪1台;
- (2) 35KV电缆支架制作, 设备进场, 开始吊装;
- (3) 消防泵房基础混凝土方木模板清理;
- (4) 站用变设备接线完成;
- (5) 场地回填及清理材料完成60%;
- (6) 二次舱电缆支架制作完成35%, 设备已进场。
- (7) 主变区土方回填完成65%, 设备已进场。
- (8) 储能区电缆支架制作完成50%。
- (9) 事故油池外粉完成65%。

2、下周的工作计划:

- (1) 35KV电安装完成100%, 接线完成;
- (2) SVG设备安装完成100%;
- (3) 消防泵房细石混凝土浇筑完成100%;
- (4) 站用变设备开始调试;
- (5) 场地回填及清理材料完成100%;
- (6) 二次舱电缆支架制作完成100%, 开始调试;
- (7) 主变区土方回填完成100%, 设备开始调试;

(8) 储能区电缆支架制作完成100%，开始调试；

(9) 事故油池外粉完成100%，回填完成100%；

3、安全：

(1) 按照要求进行现场安全文明管控。

输出线路：

1、本周完成工程量：

(1) 人员：管理人员2人，协调人员2人，施工机械水准仪1台，全站仪1台，GPS1台；

(2) 与许昌电力公司对接光缆改造施工方案；

(3) 确定T接110KV线路的停电计划；

2、下周的工作计划：

(1) 现场安全巡查；

(2) 待T接点确认停电后开展后续施工工作；

3、安全：

(1) 已完成胡塔基及耐张段的安全检查。

分包单位（河南奥纳电力工程有限公司）：

1、本周完成工程量：

(1) 人员：管理人员4人，普工30人，施工机械1台打桩机、1台拖拉机、1台引孔机；

(2) 组件安装1974快；扁铁焊接280米；电缆沟开挖110米；16区支架安装0.3MW；

(3) 首并网区汇流箱安装完成、直流电缆敷设完成、电缆过路管敷设完成。

3、下周的工作计划：

(1) 组件安装、交流电缆敷设、接地扁铁焊接、16区支架安装；

(2) 首并区域打桩、支架安装；

总包单位（山东力诺电力设计咨询有限公司）：

1、要求储能区及升压站设备区做好相关交接工作；

2、光伏区箱变油池下周必须抓紧时间落实确定；

3、光伏区组件安装作为主要质量检查，去年第三方检验光伏区组件存在隐裂情况，要求施工单位再次对组件安装施工队伍进行交底工作；

4、要求施工单位保管好施工现场的组件包装、废品废料等，不得私自运出回收，如有发现施工单位保管措施不到位或私自运出回收，我总包单位将在工程款中扣取相关费

用。

- 5、电缆线上塔工作，相关施工单位做好交接，并提前采购好相关材料与夹具等。
- 6、升压站、光伏区设备到场后所有设备到货清单整理好一份提供到总包单位。
- 7、升压站土建工作下周将会转移到电气方面，要求电气管理人员下周参会。
- 8、各施工单位保存好隐蔽工程相关照片、视频。

监理单位（常州正衡电力工程监理有限公司）：

质量及进度要求：

1、上周监理周例会要求各单位把监理项目部所签字盖章的资料，复印一套，光伏区单位未提供，现要求 48 小时（12 日下午 6.00 点）之内提供相关资料，否则将对你单位考核 5000.00 元；

2、升压站储能区具备回填条件的，要及时向监理项目部报验，验收合格后施工单位抓紧时间回填土；

3、升压站、光伏区电缆穿管喇叭口全部未做，要求施工单位按图纸及规范要求施工；

4、光伏区接地沟、电缆沟同沟情况下，接地扁铁敷设和交流电缆敷设间距保持在 50 公分。

5、监理通知回复单（13-18#），否则将对未回复的单位进行考核。

6、光伏区组件拆箱后要及时收集箱内备件（M4 插头连接线）以及箱体外包装上的组件识别条码。


安全要求：

1、做好早班会安全交底，正确佩戴安全帽并系好帽带。

2、升压站做好电气二次设备进场保管，不得露天下存放相关电气二次设备。

3、升压站配备灭火器较少，每个施工区域不得少于两具灭火器。

4、升压站配电箱内接线杂乱，电焊机未做接地，要求施工单位会后立即整改完成。

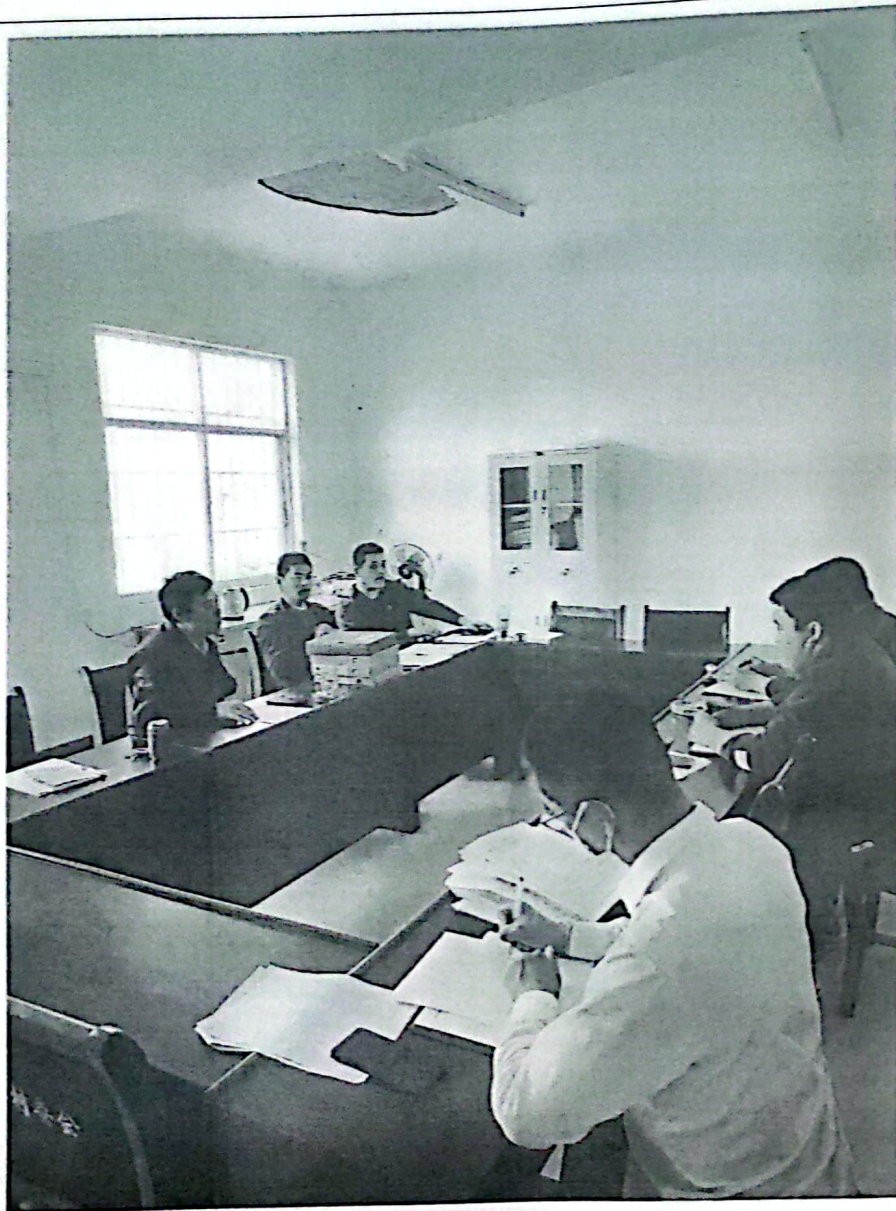

主送单位	禹州市晶能光伏发电有限公司项目部		
抄送单位	山东力诺电力设计咨询有限公司施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间	2023 年 03 月 10 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

监理例会会议签到表

时间: 2021年03月10日

序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话
1	田国育	正街监理	总代	15978737925
2	徐文平	正街监理	监理	15610615208
3	沙元毅	山东力诺		13305317200
4	王新	兴华电力		19903830300
5	张亮明	昆兰		13120360711
6	张少海	赛纳		17630607126
7	张	兴华电力		17763289760
8	张	山东力诺		13658605933
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
1				
