

扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW
分布式光伏发电项目

监 理 周 报

第 四 期


(2022 年 7 月 2 日-2022 年 7 月 8 日)




扫描全能王 创建

工程名称	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目	建设单位	扬州申曜新能源科技有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司		
本周施工内容及进度	1、天富龙 201 厂房：组件安装完成，逆变器安装完成，直流电缆放线完成，檩条加固完成 60%，斜撑加固完成 20%；天富龙 101 厂房：光伏支架安装完成,组件安装完成 85%，逆变器安装完成，直流电缆安装完成；天富龙 102 厂房：厂房加固完成 30%，支架安装完成，逆变器安装完成，直流电缆放线完成，等待桥架到场敷设接线； 2、天富龙内饰厂区组件安装 74%，逆变器安装完成，直流电缆放线全部完成；支架安装全部完成； 3、设计现场确认桥架安装路径；		
下周计划	1、天富龙 201 厂房：组件、电缆接线，桥架敷设完成，接地安装，检修通道安装，厂房檩条、斜撑加固； 2、天富龙 101 厂房：组件安装完成，组件、电缆 MC4 接头接线，桥架安装，检修通道安装； 3、天富龙 102 厂房：组件安装 60%，组件、电缆 MC4 接头接线，桥架敷设，接地安装，检修通道安装，加固檩条材料外出加工； 4、威英 1#厂房：计划 7 月 15 日入场；威英 2#厂房：计划 7 月 15 日入场；威英 3#厂房：计划 7 月 15 日入场，7 月 10 日水泥预制块入场； 5、交流电缆到货，桥架到场，接地材料到场；33KW 逆变器、50KW 逆变器到货；		
安全文明施工情况	1、进场工人已进行安全三级教育。 2、进场工人已佩戴好安全帽。 3、现场已配置安全文明标牌。		
施工质量	1、天富龙 101 夹具、支架安装螺栓紧固出现松动现象，已要求施工单位及时整改。 2、天富龙 201 组件安装出现压块压接不实现象，已要求施工单位及时整改。 3、厂房加固符合图纸设计要求。		
设备材料进场情况	1、光伏支架到场 2.44MW。 2、直流电缆到场 24500m。 3、扁铁到场 276m。钢板 30 块。 4、焊管 Q235 到场 384m。 5、组件到货 143 箱。 6、逆变器到场 18 台。		
人员机械情况	1、总包管理 2 人，光伏 19 人，加固 9 人。 2、曲臂车 2 台、登高车 2 台、吊车 1 台。		




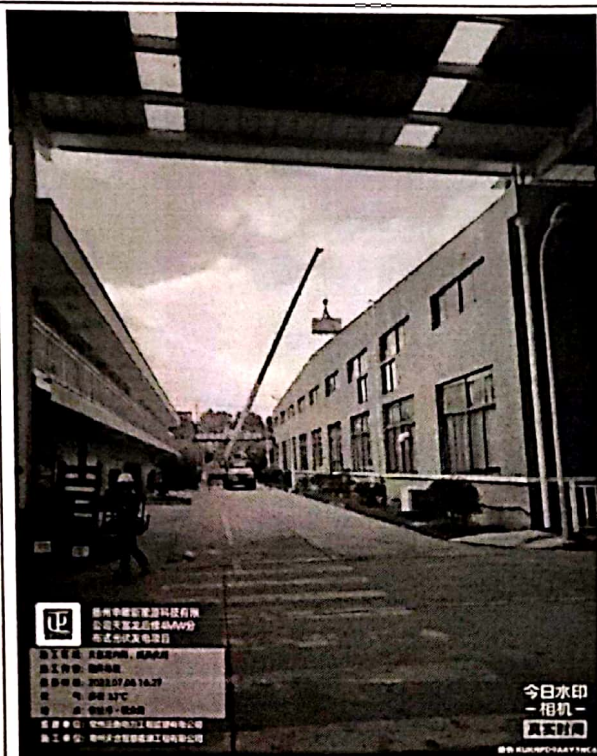


组件吊装

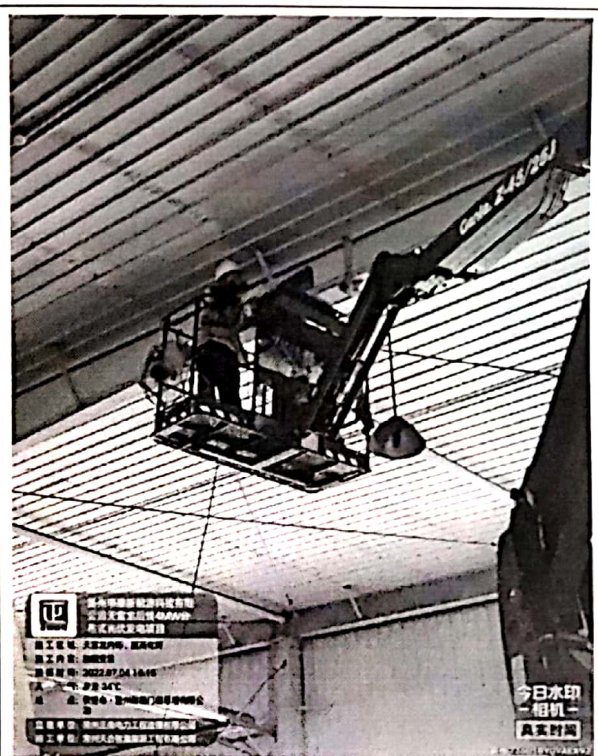

加固安装

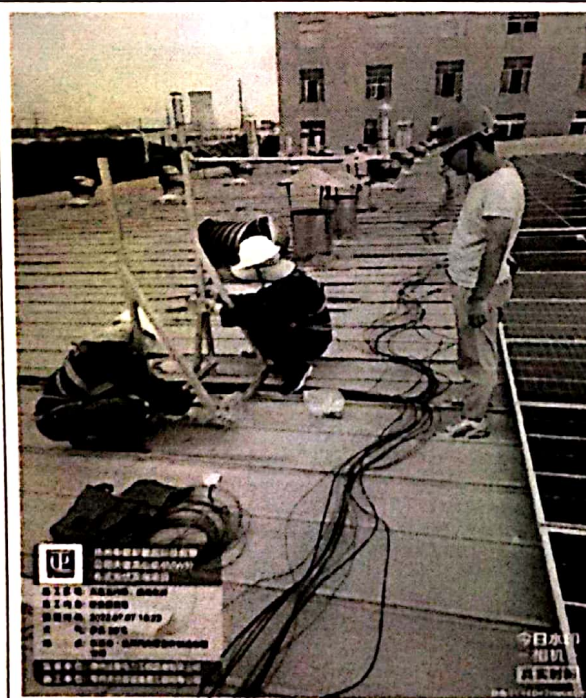

直流线敷设

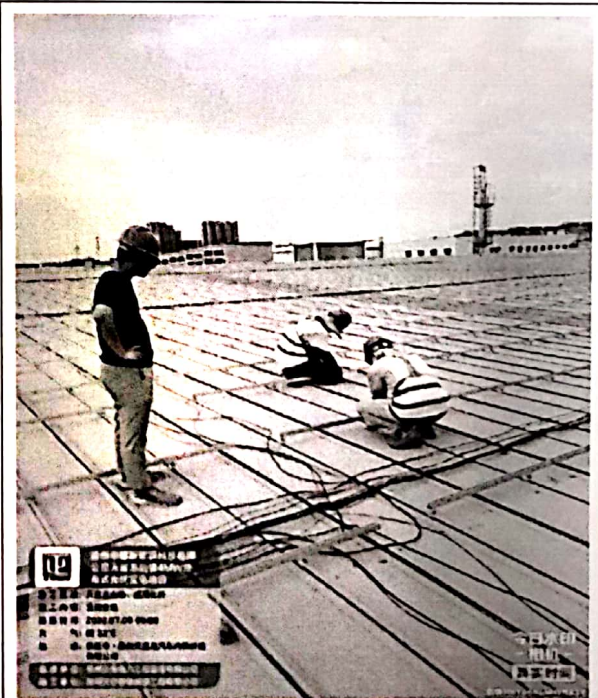

支架安装

