

会议纪要

工程名称：潍坊招商科瑞 1.2MW 分布式光伏项目

编号：ZHJL-HYJY-011

签发：周飞

会议地点	监 理 办 公 室	会议时间	2022 年 10 月 20 日
会议主持人	周 飞		
会议主题：潍坊招商科瑞一期 1.2MW 分布式光伏发电项目安全、进度、质量活动周例会			
会议内容			
2022 年 4 月 04 日 10 点，由监理组织网络会议，常州正衡电力工程监理有限公司、潍坊旭远光伏新能源有限公司、江苏华湛电力安装工程有限公司公司出席监理例会。会议纪要如下： 一、会议制度要求 1.工程监理例会周四上午 10:00。开会地点现 场 项 目 部 办 公 室 ， 例 会 召 开 时 间 除 特殊情况不另行通知时间。 2.各施工方项目经理及主要管理人员要准时参加，无特殊情况不准请假，无故不参加者或迟到者将予 200 现金处罚； 3.例会前要求施工单位提前提交详细的书面周报汇报材料（包括进度完成情况、进场人员情况、设备及材料进场情况、周进度计划落实情况），汇报材料将作为会议纪要的附件； 4.如有特殊情况将召开专题例会，专题例会由监理、业主及施工单位共同参加，以便及时解决工程施工中发现的安全、质量、进度、技术、商务以及现场管理中的突出问题。 二、会议内容 上周会议回顾组件安装完成 95% 。 施工单位汇报下周计划：直流电缆敷设、并网前准备工作。安全整改。 1、现场爬梯未装防坠器，厂房顶采光带未做安全防护。			




Quark 夸克
高清扫描 还原文档

- 2、进入施工现场的施工人員一定正确佩戴好安全帽。
- 3、组件安装未采取措施，组件转运是一人背运，安装施工中发现踩组件边框进行安装。背运及踩边框会对在组件造成损伤或隐裂，损伤或隐裂是无法看到，需要专业人员进行检测。
- 4、1#、2#、3#厂房垃圾堆积太多，应及时清理。
- 5、并网前电缆绝缘测试。
- 6、安全所需安全网、防坠器、灭火器等材料已上报公司。
- 7、并网时总包必须到现场，联系并网柜厂家技术人员现场指导并网。
- 8、电表 2022 年 10 月 19 号已到期，需拆下来拿到电网公司重新校验后再安装。
- 9、并网前电网公司需要联系电网公司到现场验收；
- 10、并网当天总包方技术负责人和并网柜厂家人员到现场监督。
- 11、因施工质量及进度延迟并网所产生的监理延期费用由总包负责。

招商科瑞 1.2MWp 项目


光伏发电项目实施过程中所需资料及文件

序号	名称	原定截止时间	更新时间
1	施工日志按照业主下发模板填写。		每天发送
2	并网时间 2022.10.27 日		
主送单位	潍坊旭远光伏新能源有限公司、抄送江苏华湛电力安装工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022 年 8 月 04 日



Quark 夸克
高清扫描 还原文档



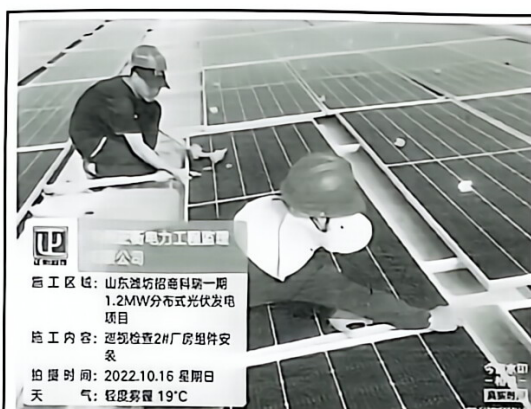

2#组件安装



2#组件安装



2#组件安装



2#组件安装




2#组件安装



2#组件安装



Quark 夸克
 高清扫描 还原文档

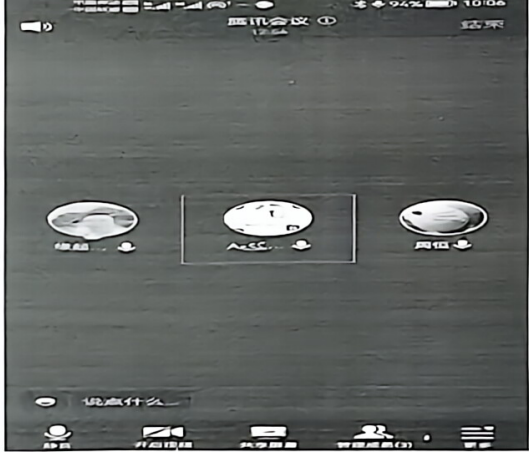	
监理网络会议	



Quark 夸克
 高清扫描 还原文档
