

# 会议纪要

工程名称：潍坊招商科瑞 1.2MW 分布式光伏项目

编号：ZHJL-HYJY-005

签发：

会议地点	监理办公室	会议时间	2022 年 6 月 23 日
会议主持人	黎建光		
会议主题：潍坊招商科瑞一期 1.2MW 分布式光伏发电项目安全、进度、质量活动周例会			
会议内容			
<p>2022 年 6 月 23 日 10 点，由监理组织，常州正衡电力工程监理有限公司、潍坊旭远光伏新能源有限公司、江苏华湛电力安装工程有限公司公司出席监理例会。会议纪要如下：</p> <p>一、会议制度要求</p> <p>1.工程监理例会周四上午 10:00。开会地点现场项目部办公室，例会召开时间除特殊情况不另行通知时间。</p> <p>2.各施工方项目经理及主要管理人员要准时参加，无特殊情况不准请假，无故不参加者或迟到者将予 200 现金处罚；</p> <p>3.例会前要求施工单位提前提交详细的书面周报汇报材料（包括进度完成情况、进场人员情况、设备及材料进场情况、周进度计划落实情况），汇报材料将作为会议纪要的附件；</p> <p>4.如有特殊情况将召开专题例会，专题例会由监理、业主及施工单位共同参加，以便及时解决工程施工中发现的安全、质量、进度、技术、商务以及现场管理中的突出问题。</p> <p>二、会议内容</p> <p>上周会议回顾施工进度缓慢 29 日加固无法完成。</p> <p>施工单位汇报 27 号 3#车间加固安装完成，组件施工人员进场施工，再加固 2#1#车间；因阻工耽误时间按照并网节点顺延。</p> <p>安全</p> <p>1、进入高温多雨季节，要求现场配备防暑药物发放到工人手中，并做好材料进场防雨准备。</p> <p>2、现场施工人员在施工时需要长时间蹲着施工，起立时一定要缓慢，防止起立出现眩晕</p>			

现象；

质量、进度

- 1、部分加固部位施工有一定难度，提前沟通早提出解决方案；
- 2、项目总包管理人员配合监理检查工作，提出任何符号要求问题及时安排人员整改消缺；
- 3、总包管理人员要常驻现场，施工出现任何状况及时进行解决；
- 4、施工单位增加施工人员施工把滞后时间赶过来争取按照计划节点并网发电。
- 5、现场注意安全文明施工及个人安全防护用品使用。

### 招商科瑞 1.2MWp 项目

#### 光伏发电项目实施过程中所需资料及文件

序号	名称				原定截止时间	更新时间
1	安全帽、安全带及防护用品现场监理进行检查					
2	准时参加会议，如有特殊情况及时通知大家避免大家都在等待					
3	组件、逆变器、电缆、开关柜等材料进场反馈				5月3日	6月30日
4	1	到达现场屋顶加固檩条镀锌层厚度与设计要求相差悬殊	图纸要求增强构件为Q235B热镀锌材料，镀锌层厚度平均不小于65μm，增设螺栓为普通热镀锌螺栓	檩条返厂镀锌	檩条加固施工前	施工单位微信确定，最后出变更
	2	到达现场加固斜撑底板厚度为10mm，与设计要求相差2mm	图纸要求斜撑底板厚度为12mm	设计院出设计变更或返厂加工	斜撑加固施工前	
	3	2#厂房屋顶北侧，已安装导轨型材与图纸不符	设计图纸	设计院出设计变更	组件安装前	
	4	1#厂房屋顶安装组件部分未加固	本项目设计院分为加固设计院及光伏区设计院，加固设计院只针对2#屋顶及3#屋顶荷载报告及加固施工图纸，光伏设计院针对1#屋顶排布了176块组件	加固设计院针对1#屋顶组件安装区域出荷载报告及加固图纸；或者1#屋顶不排布组件	加固设计院出1#厂房加固图纸之前	
5	8	1、夹具为受力点，导轨拼接处不能搭接在夹具正上方；2、导轨连接处要用导轨连接件，施工过程中未见导轨连接件；3、夹具距离跨度大，未按图纸施工；4、采光带上方安装导轨，影响今后厂区更换采光带；5现场使用夹具导轨不是一个材质，不是阳极氧化工艺	工程联系单2及图纸要求	1、导轨拼接处不能搭接在夹具正上方；2、导轨连接件；3、需每间隔一跨安装1个夹具，需补装夹具；4、需拆除采光带上方导轨，以及采光带上方不能安装组件；5、夹具应为阳极氧化工艺		夹具、连接件缺失部分下单后两天进场。

6	5	加固图纸蓝图仍未到达现场	首次监理例会		6月6日	是	9	根据EPC合同16.2.2 (i), 施工过程中, 发包人有 权对承包人的各项履约资料进行检查, 对不符合 要求的承包人应按要求整改, 如不整改或整改后 仍不满足发包人要求的, 发包方有权扣除每次1 万-5万违约金
	6	开关柜内断路器与浪涌保护与项目招 标供应商短名单不一致	招标公告	更换天润供应商名录短名单内 开关及浪涌	设备到达现 场之前			验收不通过
	7	人员已经进场, 资质、人员、资料仍 未报审; 加固施工材料已到场仍未报 审	首次监理例会		6月5日	是	10	根据EPC合同16.2.2 (i), 施工过程中, 发包人有 权对承包人的各项履约资料进行检查, 对不符合 要求的承包人应按要求整改, 如不整改或整改后 仍不满足发包人要求的, 发包方有权扣除每次1 万-5万违约金
主送单位		潍坊旭远光伏新能源有限公司、抄送江苏华湛电力安装工程有限公司						
发文单位		常州正衡电力工程监理有限公司			发文时间		2022年6月23日	



山东潍坊招商科瑞一期1.2MW分布  
 式光伏发电项目  
 施工区域: 3#厂房  
 施工内容: 斜撑加固  
 拍摄时间: 2022.06.18 09:13  
 地点: 安丘市·山东亿达矿业器材有限  
 公司  
 建设单位: 潍坊旭远光伏新能源有限公司  
 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

加固检查



山东潍坊招商科瑞一期1.2MW分布  
 式光伏发电项目  
 施工区域: 3#厂房  
 施工内容: 支撑加固  
 拍摄时间: 2022.06.18 15:26  
 地点: 安丘市·潍坊市招商科瑞生物技  
 术有限公司  
 建设单位: 潍坊旭远光伏新能源有限公司  
 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

斜撑加固



山东潍坊招商科瑞一期  
 1.2MW分布式光伏发电项  
 目  
 施工区域: 3#厂房  
 施工内容: 搭设施工平台  
 拍摄时间: 2022.06.20 17:44  
 地点: 安丘市·潍坊市招商科瑞生物技  
 术有限公司  
 建设单位: 潍坊旭远光伏新能源有限公司  
 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

加固平台搭设



山东潍坊招商科瑞一期  
 1.2MW分布式光伏发电项  
 目  
 施工区域: 3#厂房  
 施工内容: 搭设施工平台  
 拍摄时间: 2022.06.21 09:16  
 地点: 安丘市·潍坊市招商科瑞生物技  
 术有限公司  
 建设单位: 潍坊旭远光伏新能源有限公司  
 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

檩条加固平台



山东潍坊招商科瑞一期  
 1.2MW分布式光伏发电项  
 目  
 施工区域: 3#厂房  
 施工内容: 搭设施工平台  
 拍摄时间: 2022.06.20 17:26  
 地点: 安丘市·潍坊市招商科瑞生物技  
 术有限公司  
 建设单位: 潍坊旭远光伏新能源有限公司  
 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

加固平台材料



山东潍坊招商科瑞一期1.2MW分布  
 式光伏发电项目  
 施工区域: 3#厂房  
 施工内容: 檩条加固  
 拍摄时间: 2022.06.18 09:02  
 地点: 安丘市·安丘市消防救援大队  
 建设单位: 潍坊旭远光伏新能源有限公司  
 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司



檩条加固



斜撑加固



檩条加固

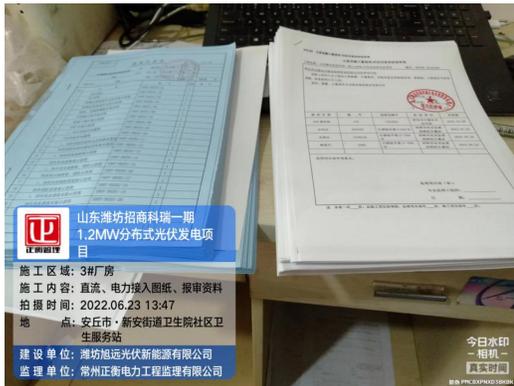

资料图纸



檩条加固
