

会议纪要



工程名称：潍坊招商科瑞 1.2MW 分布式光伏项目
编号：ZHJL-HYJY-002

签发：[Signature]


会议地点	网络会议	会议时间	2022 年 6 月 1 日
会议主持人	黎建光		
会议主题：潍坊招商科瑞一期 1.2MW 分布式光伏发电项目安全、进度、质量活动周例会			
会议内容			
2022 年 5 月 26 日 16:00，由业主组织，常州正衡电力工程监理有限公司、潍坊旭远光伏新能源有限公司、江苏华湛电力安装工程有限公司公司出席，远程网络召开首监理例会。会议纪要如下； 一、会议制度要求 1.工程监理例会定于每周四上午 10:00。开会地点现场项目部会议室，例会召开时间除特殊情况不另行通知时间。 2.各施工方项目经理及主要管理人员要准时参加，无特殊情况不准请假，无故不参加者或迟到者将予 200 现金处罚； 3.例会前要求施工单位提前提交详细的书面汇报材料（包括进度完成情况、进场人员情况、设备及材料进场情况、周进度计划落实情况），汇报材料将作为会议纪要的附件； 4.如有特殊情况将召开专题例会，专题例会由监理、业主及施工单位共同参加，以便及时解决工程施工中发现的安全、质量、进度、技术、商务以及现场管理中的突出问题。 二、会议流程 1、总包汇报上周工作完成量及下周工作计划； 2、监理对工程安全、质量、进度点评要求； 3、业主对会议内容及施工总结要求 二、会议内容 施工单位汇报明天支架安装加固安装人员进场，进场后确定施工计划安排。 安全			

1、施工人员进场先做好安全技术学习、工程图牌安装工作； 2、前期施工存在安全隐患有爬梯上下处彩钢瓦未保护，导轨安装采光带未防护，屋面施工前整改完成。 3、天气逐渐炎热，屋面施工备好降温防暑物品，最好不使用含酒精药物。 质量、进度 1、按照要求开工报审资料未完成不准开工，考虑 630 并网工期紧张，施工人员进场边施工边报审，但不能超过联系单要求日期，特殊施工人员证件人员进场第一时间上报。 2、因其它原因造成本工程迟迟未施工，给 630 并网造成一定影响，下一步施工工作安排考虑把这段时间补回来。 3、支架导轨安装与图纸不符部分先进行整改消缺。 4、麻雀虽小五脏俱全，施工单位配备齐全工地管理人员地八大员 。
--


招商科瑞 1.2MWp 项目图纸及进场时间

光伏发电项目实施过程中所需资料及文件			
序号	名称	原定截止时间	更新时间
1	1、加固资质、施工方案、人员证件未上报； 2、施工前期报审资料及开工报告，施工资料报审表格已经发给你们现场管理人员； 3、由于当前冠状病毒随时传播，总包做好疫情防控工作及物资准备；光伏安装施工人员、钢构加固施工人员要做好体温测量及记录工作； 4、施工人员做好进场三级安全教育、班前会、安全技术交底影像记录；	6 月 5 日	6 月 5 日
2	4.1 项目章授权文件（5 月 30 日），设计进度计划，采购进度计划，施工进度计划、蓝图（（5 月 30 号发给业主项目部） 监理审核的施工组织方案和专项方案、吊装方案 4.2 从 5 月 26 日起，要形成项目日报、周报、月报制度，按照天润新能模板填报。	5 月 30 日	6 月 3 日

3	加固材料进场进度反馈	5月30日	6月2日
4	加固材料时间实际到场		6月3日
5	施工人员实际到场		6月2日
6	施工图纸意见反馈	6月3日 18:00点	
7	如果施工图纸仍不满足施工条件，联系设计院召开施工图纸评审会议	6月6日 16:00点	
8	蓝图	确定好图纸一周内发到现场	
9	安全、质量、消防演练照片	每周	
主送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022年6月1日

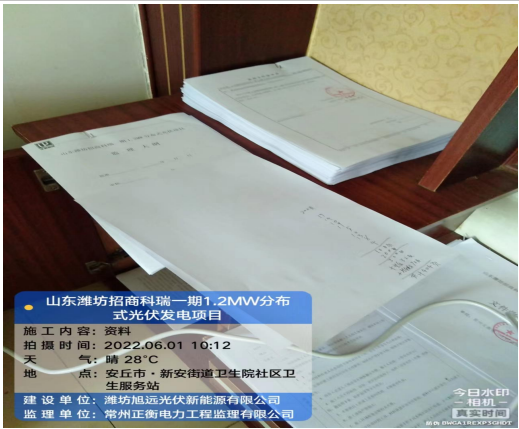

● 山东潍坊招商科瑞一期1.2MW分布式光伏发电项目
施工内容: 资料
拍摄时间: 2022.06.01 10:12
天气: 晴 28°C
地点: 安丘市·新安街道卫生院社区卫生服务站
建设单位: 潍坊旭远光伏新能源有限公司
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司



重要会议日程表		
序号	会议名称	时间
1	项目启动会	2022.06.01 10:00
2	项目启动会	2022.06.01 10:00
3	项目启动会	2022.06.01 10:00
4	项目启动会	2022.06.01 10:00
5	项目启动会	2022.06.01 10:00
6	项目启动会	2022.06.01 10:00
7	项目启动会	2022.06.01 10:00
8	项目启动会	2022.06.01 10:00
9	项目启动会	2022.06.01 10:00
10	项目启动会	2022.06.01 10:00
