

会 议 纪 要

工程名称：潍坊招商科瑞 1.2MW 分布式光伏项目

编号：ZHJL-HYJY-007

签发：

会议地点	监 理 办 公 室	会议时间	2022 年 7 月 7 日
会议主持人	黎 建 光		
会议主题：潍坊招商科瑞一期 1.2MW 分布式光伏发电项目安全、进度、质量活动周例会			
会议内容			
2022 年 7 月 7 日 10 点，由监理组织网络会议，常州正衡电力工程监理有限公司、 潍坊旭远光伏新能源有限公司、江苏华湛电力安装工程有限公司公司出席监理例会。会议纪要如下； 一、会议制度要求 1.工程监理例会周四上午 10:00。开会地点现 场 项 目 部 办 公 室 ， 例会召开时间除特殊情况不另行通知时间。 2. 各施工方项目经理及主要管理人员要准时参加，无特殊情况不准请假，无故不参加者或迟到者将予 200 现金处罚； 3. 例会前要求施工单位提前提交详细的书面周报汇报材料（包括进度完成情况、进场人员情况、设备及材料进场情况、周进度计划落实情况），汇报材料将作为会议纪要的附件； 4. 如有特殊情况将召开专题例会，专题例会由监理、业主及施工单位共同参加，以便及时解决工程施工中发现的安全、质量、进度、技术、商务以及现场管理中的突出问题。 二、会议内容 上周会议回顾材料设备进场没有完成、爬梯四周警示标示未悬挂。 施工单位汇报下周 2#车间加固完成，3#车间整改消缺完成。下周支架整改消缺完成，7 月 9 日组件施吊装完成组件安装，材料进场完成。 安全			

1、安装施工人员要经过安全教育及技术交底上岗，组织安全教育活动时我们监理有一份组件开箱、搬运、安装工艺交底及培训教材需要参加。 2、屋面施工人员施工时必须佩戴安全防护用品； 3、厂房屋面屋面采光带处组件安装前做好安全防护； 4、上下爬梯出悬挂警示牌，光伏区安装施工人员上下爬梯使用防坠绳； 5、配合当地政府做好疫情防护工作，每周四上午在葛庄村大队部及厂门口做免费核酸检测一次。 质量、进度 1、安排施工人员配合做拉拔试验，作好记录； 2、厂房加固部分区域需要提前跟厂方进行协调施工，如厂方存在异议要书面确认； 3、材料设备进场做好防雨措施；进场材料设备准备好质量证明文件、厂家企业资质安全生产及数量进行报验； 4、施工日记要认真及时填写，后期进入资料装订 招商科瑞 1.2MWp 项目 光伏发电项目实施过程中所需资料及文件							
序号	名称					原定截止时间	更新时间
1	施工日志明天发群里，组件人员进场施工按照业主下发模板填写施工日志。						下周一开始
2	做夹具拉拔试验具体时间						支架消缺整改完成做
3	组件、逆变器、电缆、开关柜等材料进场时间						7月9日
4	合同并网节点日期为 630						
5	1	到达现场屋顶加固檩条镀锌层厚度与设计要求相差悬殊	图纸要求增强构件为Q235B热镀锌材料，镀锌层厚度平均不小于65μm，增设螺栓为首通热镀锌螺栓	檩条返厂镀锌	檩条加固施工前		施工单位微信确定，最后出变更
	2	到达现场加固斜撑底板厚度为10mm，与设计要求相差2mm	图纸要求斜撑底板厚度为12mm	设计院出设计变更或返厂加工	斜撑加固施工前		
	3	2#厂房屋顶北侧，已安装导轨型材与图纸不符	设计图纸	设计院出设计变更	组件安装前		
	4	1#厂房屋顶安装组件部分未加固	本项目设计院分为加固设计院及光伏区设计院，加固设计院只针对2#屋顶及3#屋顶荷载报告及加固施工图纸，光伏设计院针对1#屋顶排布了176块组件	加固设计院针对1#屋顶组件安装区域出荷载报告及加固图纸；或者1#屋顶不排布组件	加固设计院出1#厂房加固图纸之前		

6	8	1、夹具为受力点，导轨拼接处不能搭接在夹具正上方；2、导轨连接处要用导轨连接件，施工过程中未见导轨连接件；3、夹具距离跨度大，未按图纸施工；4、采光带上方安装导轨，影响今后厂区更换采光带；5现场使用夹具导轨不是一个材质，不是阳极氧化工艺		工程联系单2及图纸要求		1、导轨拼接处不能搭接在夹具正上方；2、导轨连接件；3、需每间隔一跨安装1个夹具，需补装夹具；4、需拆除采光带上方导轨，以及采光带上方不能安装组件；5、夹具应为阳极氧化工艺			夹具、连接件缺失部分下单后两天进场。
7	5	加固图纸蓝图仍未到达现场	首次监理例会		6月6日	是	9	根据EPC合同16.2.2 (i)，施工过程中，发包人对承包人的各项履约资料进行检查，对不符合要求的承包人应按要求整改，如不整改或整改后仍不满足发包人要求的，发包方有权扣除每次1万-5万违约金	
	6	开关柜内断路器与浪涌保护与项目招标供应商短名单不一致	招标公告	更换天润供应商名录短名单内开关及浪涌	设备到达现场之前			验收不通过	
	7	人员已经进场，资质、人员、资料仍未报审；加固施工材料已到场仍未报审	首次监理例会		6月5日	是	10	根据EPC合同16.2.2 (i)，施工过程中，发包人对承包人的各项履约资料进行检查，对不符合要求的承包人应按要求整改，如不整改或整改后仍不满足发包人要求的，发包方有权扣除每次1万-5万违约金	
主送单位		潍坊旭远光伏新能源有限公司、抄送江苏华湛电力安装工程有限公司							
发文单位		常州正衡电力工程监理有限公司				发文时间		2022 年 7 月 7 日	




加固检查



斜撑加固



檩条加固

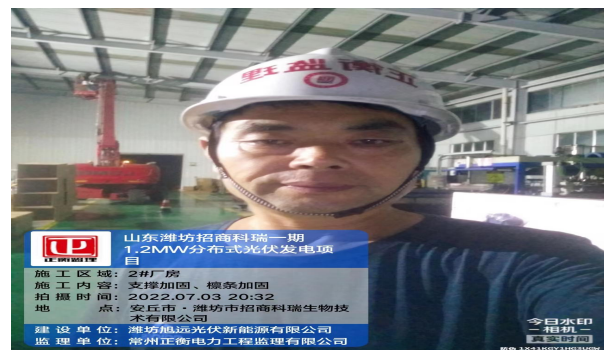


加固巡检



桥架进场




组件卸货

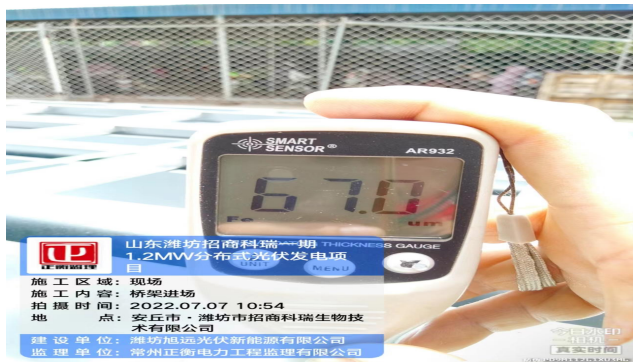

镀锌层检测



桥架检查检查

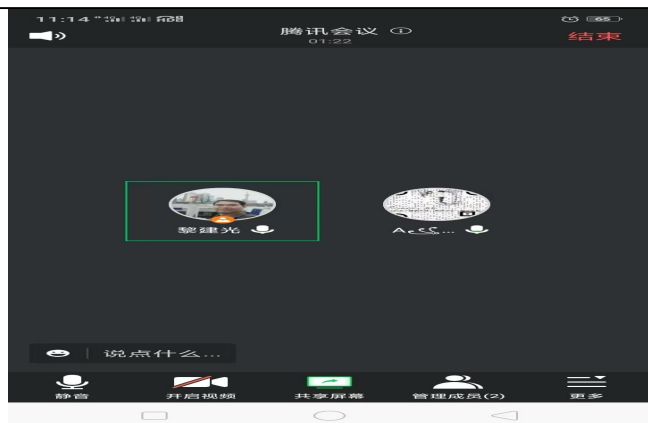

会议



桥架进场



会议



压块检查
