

会 议 纪 要

工程名称：潍坊招商科瑞 1.2MW 分布式光伏项目

编号：ZHJL-HYJY-009

签发：

会议地点	监 理 办 公 室	会议时间	2022 年 7 月 28 日
会议主持人	黎 建 光		
会议主题：潍坊招商科瑞一期 1.2MW 分布式光伏发电项目安全、进度、质量活动周例会			
会议内容			
2022 年 7 月 28 日 10 点，由监理组织网络会议，常州正衡电力工程监理有限公司、 潍坊旭远光伏新能源有限公司、江苏华湛电力安装工程有限公司公司出席监理例会。会议纪要如下； 一、会议制度要求 1.工程监理例会周四上午 10:00。开会地点现 场 项 目 部 办 公 室 ， 例会召开时间除特殊情况不另行通知时间。 2. 各施工方项目经理及主要管理人员要准时参加，无特殊情况不准请假，无故不参加者或迟到者将予 200 现金处罚； 3. 例会前要求施工单位提前提交详细的书面周报汇报材料（包括进度完成情况、进场人员情况、设备及材料进场情况、周进度计划落实情况），汇报材料将作为会议纪要的附件； 4. 如有特殊情况将召开专题例会，专题例会由监理、业主及施工单位共同参加，以便及时解决工程施工中发现的安全、质量、进度、技术、商务以及现场管理中的突出问题。 二、会议内容 上周会议回顾 7 月 17 日组件、设备进场安装施工这项计划没有完成，交流电缆敷设完成 100% 。 施工单位汇报下周 3#车间组件安装完成。7 月 31 日组件、并网柜进场完成，30 日逆变器进场完成。			

安全

1、下周业主单位现场进行安全质量检查，也就是中间检查。

2、现场做好安全防护措施工作，正确佩戴安全帽、反光背心、安全带等劳保用品，爬梯四周警示标志整理、采光带防护、人员上下爬梯防护。

3、纸质版安全资料整理完善，施工前期报审资料、过程资料准备好以备领导检查；
质量、进度

1、监理例会提出质量问题总包单位认真对待，这也是我们巡检项目工程中发现质量问题地反馈，该消缺整改的安排施工人员整改消缺，就没有必要下单子；

2、巡检发现现场需要整改问题有垂直桥架安装底部不符合规范要求，如跨接线、接地线安装等问题、地面水平桥架宜安装支架，屋面导轨连接个别间距过大、接地焊接完成彩钢瓦回复原样等问题；

3、电缆线敷设及电缆头制作安装预留余量要符合规范要求，如果说我们施工单位没有此方面规范，监理项目部可以提供技术支持（直流大概 40-50 公分、交流大概 1.8 米左右根据线径确定）；

4、加固安装消缺事宜处理情况现在到了哪一步？书面材料拿到后反馈到业主项目部及监理部。

招商科瑞 1.2MWp 项目

光伏发电项目实施过程中所需资料及文件

序号	名称	原定截止时间	更新时间
1	施工日志按照业主下发模板填写。		每天发送
2	天润公司安监部、质检部现场检查	8 月 2-3 日	8 月 2-3 日
3	采光带防护、带点部位检查、纸质版资料	8 月 1 日	7 月 15 日

4	合同并网节点日期为 630		
5	100KV 逆变器厂家进场时间	7 月 30 日	7 月 30 日
6	加固安装厂家明确要求加固剩余工程量，不准拆除吊顶进行加固	7 月 28 日（总包）	
7			
主送单位	潍坊旭远光伏新能源有限公司、抄送江苏华湛电力安装工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022 年 7 月 28 日



接地桥架防腐



逆变器开箱检查



电缆敷设




3#厂房电缆沟开挖



3#厂房配电室基础施工




2#厂房桥架接地防腐

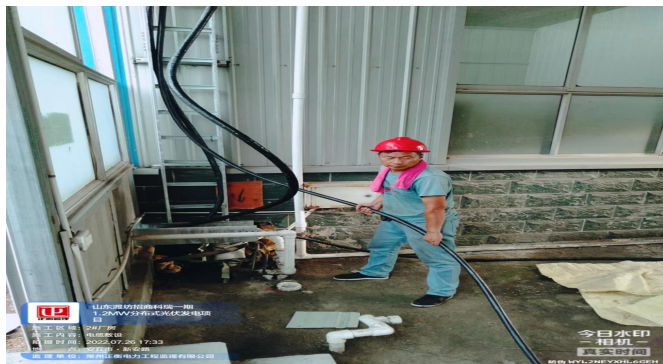

2#厂房电缆敷设



电缆敷设检查

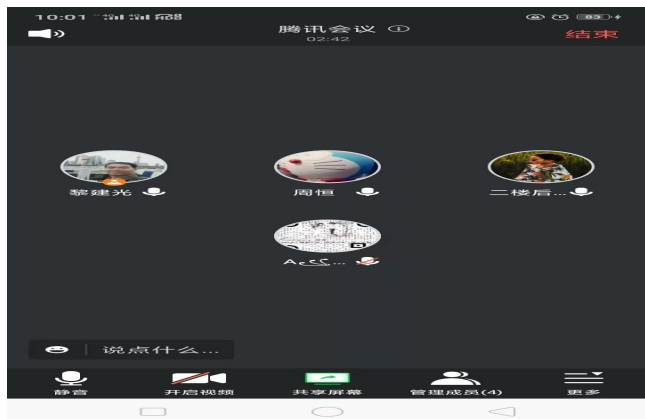

会议



逆变器开箱检查



会议



材料进场
