

会 议 纪 要

工程名称：潍坊招商科瑞 1.2MW 分布式光伏项目

编号：ZHJL-HYJY-010

签发：

会议地点	监 理 办 公 室	会议时间	2022 年 8 月 4 日
会议主持人	黎 建 光		
会议主题：潍坊招商科瑞一期 1.2MW 分布式光伏发电项目安全、进度、质量活动周例会			
会议内容			
2022 年 4 月 04 日 10 点，由监理组织网络会议，常州正衡电力工程监理有限公司、 潍坊旭远光伏新能源有限公司、江苏华湛电力安装工程有限公司公司出席监理例会。会议纪要如下； 一、会议制度要求 1.工程监理例会周四上午 10:00。开会地点现 场 项 目 部 办 公 室 ， 例会召开时间除特殊情况不另行通知时间。 2. 各施工方项目经理及主要管理人员要准时参加，无特殊情况不准请假，无故不参加者或迟到者将予 200 现金处罚； 3. 例会前要求施工单位提前提交详细的书面周报汇报材料（包括进度完成情况、进场人员情况、设备及材料进场情况、周进度计划落实情况），汇报材料将作为会议纪要的附件； 4. 如有特殊情况将召开专题例会，专题例会由监理、业主及施工单位共同参加，以便及时解决工程施工中发现的安全、质量、进度、技术、商务以及现场管理中的突出问题。 二、会议内容 上周会议回顾组件并网柜进场没有完成，逆变器安装完成 90% 。 施工单位汇报下周组件、并网柜进场完成，开始安装。 安全 1、业主单位现场进行安全检查结果及时安排人员整改消缺。			

2、现场做好安全防护措施工作，采光带用安全网防护、爬梯采用防坠器和增加护笼方式。 3、纸质版安全资料整理完善，尤其是工人进场学习教育影像及纸质版教育材料，三级教育考核及班前会内容落实； 4、对入场施工人员进行安全教育时把有质量伤亡事故引起的案例进行宣贯一下（组件 M4 插头引起事故案例）； 5、吊车人员证件、车辆年检与报审要相符，否则不准入场施工； 质量、进度 1、逆变器 M4 插头做好自检完成报监理验收完成后插接，不准随做随进行插接； 2、逆变器接地连接按照设计要求进行连接，现场连接没有按照设计要求连接到专用接地干线上； 3、加固安装剩余工程量事宜与厂家处理书面材料反馈到设计院和业主项目部及监理单位项目部。 4、组件、并网柜及时进场施工并网，否则监理延期费用由总包否则。			
招商科瑞 1.2MWp 项目			
光伏发电项目实施过程中所需资料及文件			
序号	名称	原定截止时间	更新时间
1	施工日志按照业主下发模板填写。		每天发送
2	天润公司安监部、质检部现场检查	8 月 2-3 日	8 月 2-3 日完成
3	组件、并网柜进场日期	未暂定	
4	合同并网节点日期为 630		8 月 20 日


5	100KV 逆变器厂家进场时间	7 月 30 日	7 月 30 日 进场完成
6	加固安装厂家明确要求加固剩余工程量，不准拆除吊 顶进行加固及立柱焊接加强肋劲	7 月 28 日（总包）	书面材料 完成回复 业主及监 理
7			
主送单位	潍坊旭远光伏新能源有限公司、抄送江苏华湛电力安装工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022 年 8 月 04 日



逆变器安装



接地防腐检查

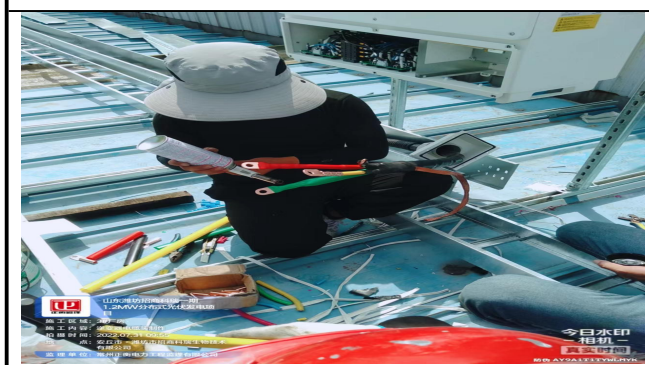

电缆头制作




3#厂房电缆制作



3#厂房逆变器接地连接导轨



3#厂房桥架接地防腐

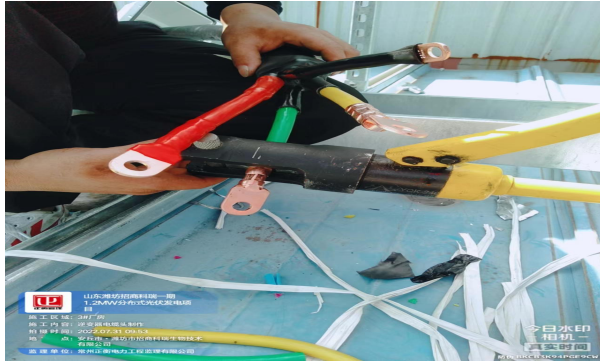

3#厂房电缆头制作



业主质量安全检查



会议



业主质量安全检查



会议



逆变器进场
