

会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-HYJY-024

签发：贲振军

会议地点	项目部办公室	会议时间	2023 年 08 月 12 日
会议主持人	贲振军		

会议主题：施工质量、安全、进度。

会议内容：

一、项目总体建设进度汇总：

1. 升压站地块土方回填作业累计完成 756 车，大约 15000m³，累计完成土方工作量的 75%；
2. 光伏区 D 地块预应力高强混凝土管桩累计到场 1505 根，累计到场工作量的 8.09%；
3. 光伏区 D 地块预应力高强混凝土管桩累计打桩完成 1460 根，累计完成工作量的 7.85%；
4. 光伏区 D 地块鱼塘间道路土方回填累计完成 65%。

二、建设单位项目部


1. 要求施工单位安全员对现场施工安全要严格把控，确保工程机械施工安全；
2. 再次强调施工现场安全员要佩戴红袖章，与打桩作业人员同时上下班；
3. 施工现场负责人请假，要求施工单位委派临时现场负责人带班，保证施工的质量、进度及安全；
4. 光伏区 D 地块南侧鱼塘施工时，可考虑将水全部排放至临近鱼塘，水陆桩机进场后，先进行 1 号方阵的补桩作业，同时对南侧鱼塘进行抽水处理，抽水完成后将水陆桩机调到南侧配合水上打桩船同时对南侧四个鱼塘进行打桩作业；
5. 升压站地块的回填土方抽检 3 车过磅，最重的 32.26 吨，最轻的 28.1 吨，上下限差距较大，需增加抽检样本；
6. 升压站地块西侧和南侧的挡土墙联系设计单位出具图纸，可以同步进行施工。

三、监理单位项目部：

1. 升压站地块运输土方的车辆在村内小路行驶时车速过快，要求施工单位告知运土车司机控制车速，确保行车安全，同时做好道路洒水降尘的工作；

2. 要求施工单位报验升压站土方压实度灌砂法检测人员资质证书和光伏区道路土方回填所用工程机械操作人员的相关证书；
3. 要求施工单位每天的日报要按时上报，各个岗位多沟通确保施工日报的准确性；
4. 及时完善新增人员的安全交底及三级安全教育等安全资料；
5. 要求施工单位及时报验施工资料，资料必须与工程同步。

主送单位	海丰通威渔光科技有限公司
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2023年08月12日星期六

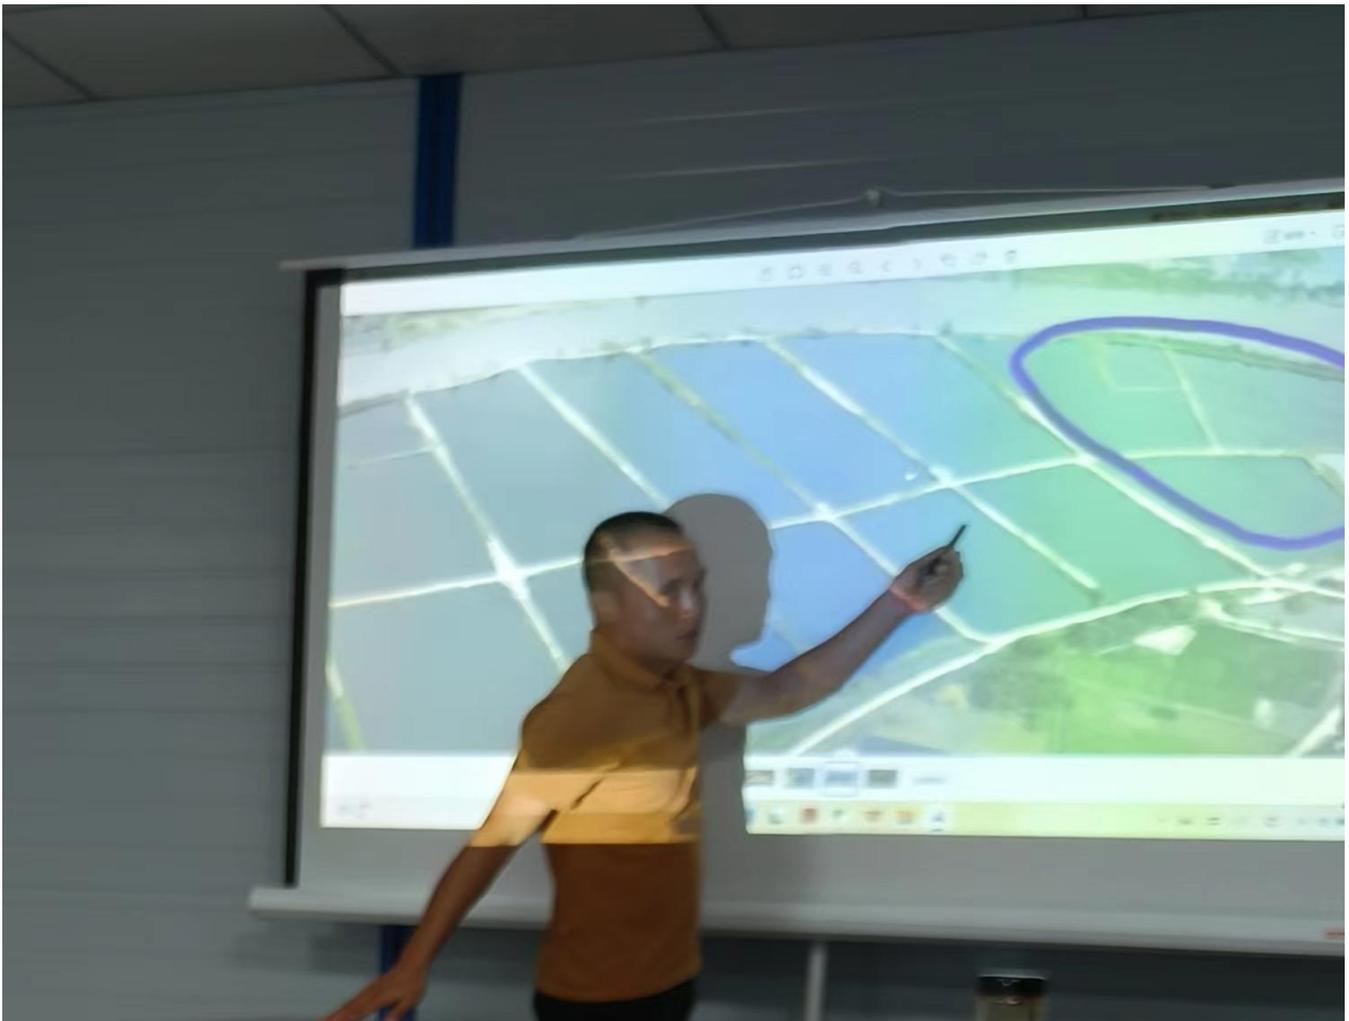



会议签到表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

日期：2023年8月12日

序号	姓名	参建单位名称	职务/职称	联系电话
01	韩煜	海丰通威渔光科技有限公司	项目负责人	15757814923
02	叶冰	海丰通威渔光科技有限公司	现场经理	13735424724
03	鲍伟	海丰通威渔光科技有限公司	商务经理	15867126045
04	黄振军	常州正衡电力工程监理有限公司	总监代表	17190065789
05	王林	浙江阳明电力建设有限公司	项目经理	16628757788
06	袁少明	浙江阳明电力建设有限公司	技术负责人	13966534390
07	毕楠	浙江阳明电力建设有限公司	安全员	13335554979
08	王文超	浙江阳明电力建设有限公司	施工员	18356301212
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
