

会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-HYJY-039

签发：贲振军

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------|
| 会议地点 | 项目部办公室 | 会议时间 | 2024 年 1 月 12 日 |
| 会议主持人 | 贲振军 | | |
| 会议主题：施工质量、安全、进度。 | | | |
| 会议内容： 一. 建设单位项目部 1. 安装完成的电缆桥架对接处存在下沉现象，等电位连接线未安装到位，变径接口处以底平为准，个别镀锌层厚度不符合设计要求，要求施工单位按照设计和规范要求整改； 2. 个别光伏支架抱箍连接螺栓存在紧固不到位现象，要求施工单位对安装完成的支架螺栓逐一排除紧固，最终用力矩扳手进行验收； 3. 组件间、组件至支架间等电位连接线存在混用现象、松动现象，要求施工单位按照设计要求及时更换不合格的等电位连接线； 4. 光伏支架前后立柱、连接杆、螺栓平垫存在返锈现象，要求施工单位采取相应的补救措施； 5. 桥架内电缆敷设杂乱，没有进行绑扎，标识牌安装不到位，要求施工单位按照规范要求整改； 6. 汇流箱出线口与波纹管的连接处严禁用胶带绑扎，要求施工单位按照规范要求整改； 7. 组串间的直流电缆敷设不规范，要求施工单位进行固定绑扎到位； 8. 箱逆变一体机钢平台个别焊缝焊接不合格、防腐不合格、格栅板未进行加固焊接，要求施工单位及时进行整改； 9. 施工现场临时用电不规范存在较大的安全隐患，要求施工单位及时进行整改； 10. 施工现场旧托盘、废纸箱、废钢带等垃圾较多，要求施工单位及时进行清理； | | | |

11. 施工现场扬尘较大，要求施工单位增加洒水降尘的次数；

12. 水面焊接作业时必须配备灭火器、每条浮船上必须配备救生圈、作业人员穿着救生衣、特殊工种持证上岗，人证合一。

二. 监理单位项目部：

1. 要求施工单位及时提供升压站回填土压实度检测报告、水泥土搅拌桩试验桩的抗压及钻芯取样的检测报告，原材料复检报告；

2. 要求施工单位及时提供光伏区 4#方阵桩基和 T9T10T11 箱逆变一体机桩基的承载力报告；


3. 要求施工单位加快光伏区 11.64MWp 区域的电气施工作业，自检合格后报监理单位项目部进行验收；

4. 要求施工人员对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量和安全隐患及时进行整改，监理工程师对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留任何隐患；

5. 光伏区施工现场严禁焚烧垃圾，严禁明火，严禁酒后作业，违者重罚；

6. 要求施工单位对新进场施工人员进行安全教育培训，增强施工人员的安全意识，对进场的机械设备进行检查，确保施工安全零事故，对安全检查中监理工程师提出的安全问题逐条进行整改。

| | |
|------|---------------------|
| 主送单位 | 海丰通威渔光科技有限公司 |
| 抄送单位 | 浙江阳明电力建设有限公司 |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 发文时间 | 2024 年 1 月 12 日 星期五 |

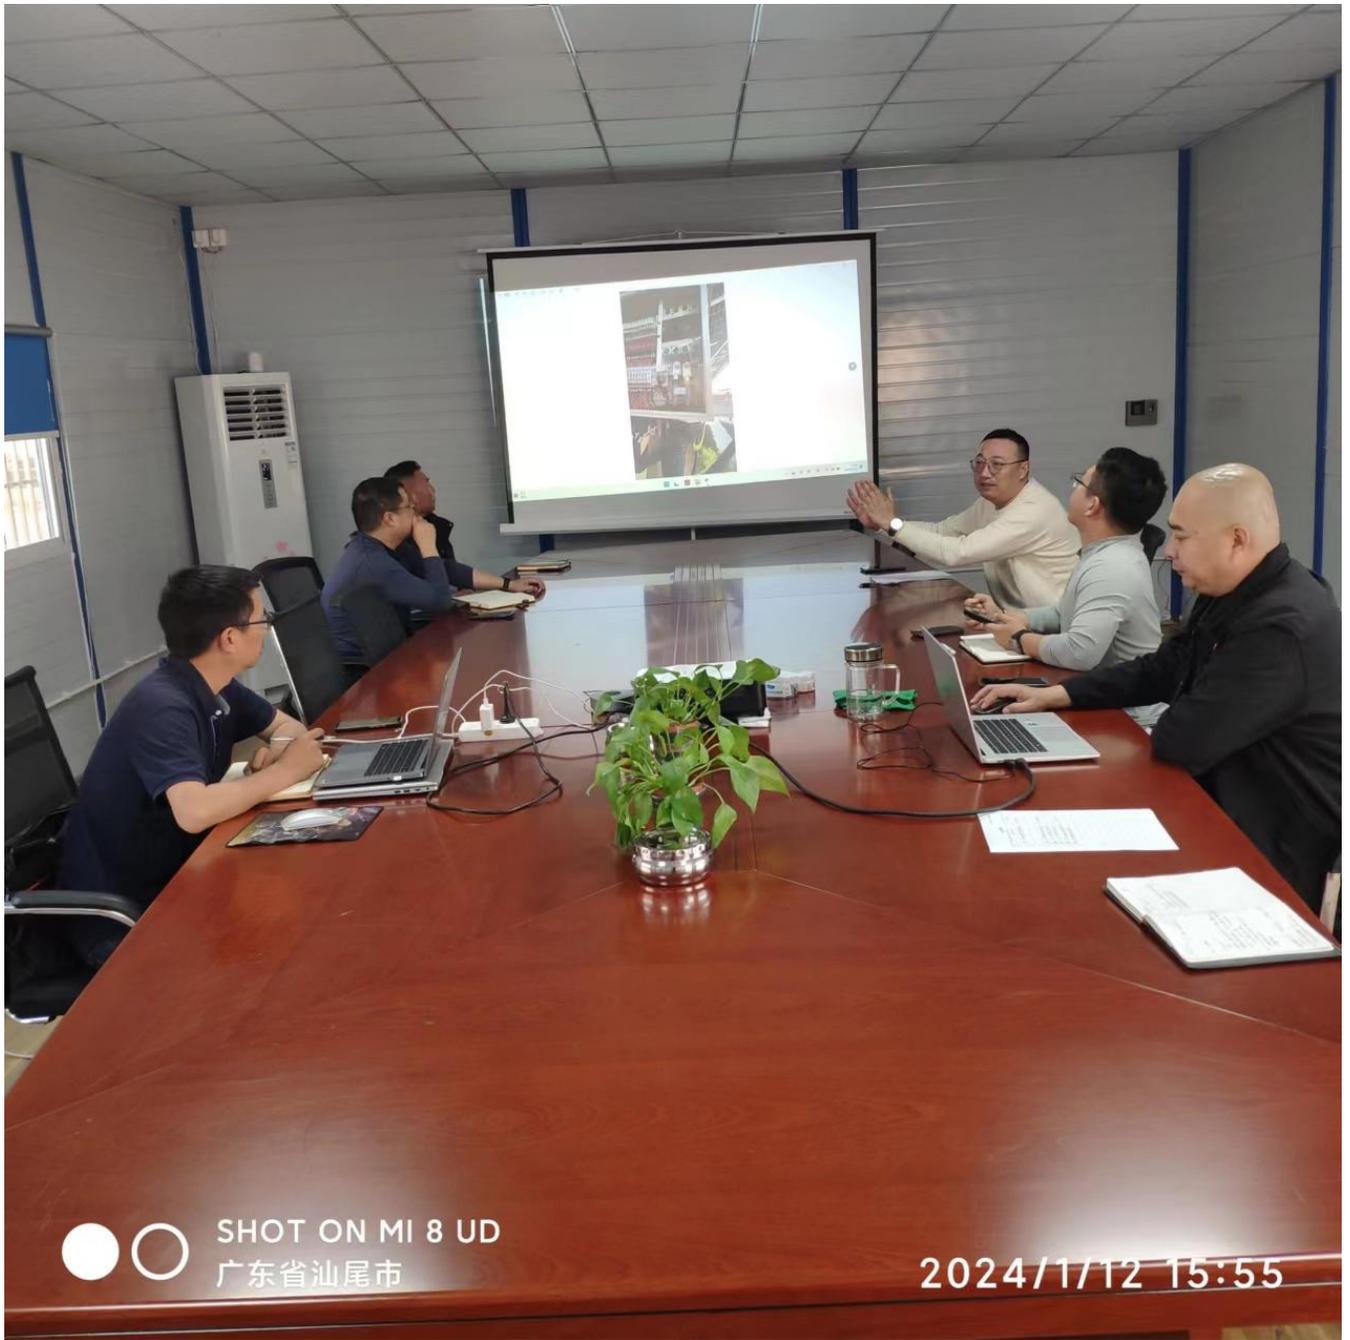

SHOT ON MI 8 UD
广东省汕尾市

2024/1/12 15:55

会议签到表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

日期：2024 年 01 月 12 日

| 序号 | 姓名 | 参建单位名称 | 联系电话 |
|----|-----|----------------|-------------|
| 01 | 叶旭 | 海丰通威渔光科技有限公司 | 1373544724 |
| 02 | 鲍炜 | 海丰通威渔光科技有限公司 | 15867126045 |
| 03 | 孙振平 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 1719065189 |
| 04 | 王佳伟 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 15845256920 |
| 05 | 王丹 | 浙江阳明电力建设有限公司 | 16628757788 |
| 06 | 王丹 | 浙江阳明电力建设有限公司 | 18010828866 |
| 07 | 王丹 | 浙江阳明电力建设有限公司 | 13955101031 |
| 08 | 刘高洪 | 浙江阳明电力建设有限公司 | 15951742627 |
| 09 | 王文超 | 浙江阳明电力建设有限公司 | 18356301212 |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
