

会议纪要


工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编 号：ZHJL-HFTW-HYJY-050

签 发：贲 振 军

会议地点	项 目 部 会 议 室	会议时间	2024 年 09 月 12 日
会议主持人	贲 振 军		
会议主题：升压站施工进度、质量、安全			
会议内容：			
一． 施工单位总体施工进度情况：			
1. 光伏区 B 地块安装光伏组件 6420 块容量为 4.2372MWp，光伏支架桩基和箱变桩基共计 1214 根，320kW 组串式逆变器 11 台，通讯箱 1 台，于 2022 年 12 月 1 日临时并网发电；			
2. 光伏区 C 地块实际安装容量为：3.16855MWp，其中 665Wp 组件安装 4070 块，660Wp 组件安装 700 块，光伏支架桩基 883 根，箱逆变一体机桩基 8 根，累计完成 100%,光伏支架安装完成 100%，光伏组件安装完成 100%，低压电气施工完成 96%；			
3. 光伏区 D 地块安装单晶硅太阳能组件 85770 块容量为 56.6082MWp，光伏支架桩基 15818 根，累计完成 100%，箱逆变一体机桩基 88 根，累计完成 100%，光伏支架累计安装完成 100%，单晶硅太阳能组件累计安装完成 100%，低压电气施工累计完成 96%；			
4. 光伏区 D 地块至光伏区 C 地块集电线路顶管距离约 329 米，累计施工完成 100%；光伏区 C 地块至光伏区 B 地块集电线路顶管距离约 447 米，累计施工完成 100%；			
5. 光伏区 D 地块集电线路电缆桥架桩基 213 根，累计打桩完成 100%；			
6. 升压站水泥土搅拌桩施工完成 100%，PHC500ABx125 桩基施工完成 100%，配电房基础开挖完成 100%，储能区域基础开挖完成 50%。			
二、施工单位下周施工计划：			
1. 光伏区 C 地块电气施工完成，自检合格后报监理项目部进行分项工程验收；			
2. 光伏区 D 地块电缆桥架等现场剩余材料清理至仓库保存，南侧围栏计划施工完成 50%；			
3. 升压站配电房和储能区域的基础垫层浇筑完成，螺旋钢筋地笼加工完成 50%；			
4. 升压站生产辅助楼基础及消防水池基础开挖，计划完成 50%；			

三．建设单位项目部对施工单位的要求： 1. 要求施工单位 10 月 30 日前完成光伏场区的监控系统； 2. 要求施工单位 10 月 20 日前完成光伏区 D 地块至光伏区 C 地块的集电线路所有工作量，施工资料必须与工程同步； 3. 要求施工单位联系设计单位及时出具河对岸 600 亩鱼塘的桩位排布图，不得影响后续的打桩作业； 4. 光伏场区的围栏施工同步进行，避免闲杂人员入场区内，张贴安全标识标牌； 5. 升压站土建施工缓慢，与上报的施工进度不符，比较滞后，要求施工单位合理增加人员与机械，确保后续的施工节点顺利进行； 6. 要求施工单位申请升压站临时用电的验收工作，所有的施工工序都要在自检合格的前提下报监理项目部验收，验收合格后方可进行下一道工序； 7. 要求施工单位做好每个光伏组串的开路电压测试，并形成测量记录； 8. 要求施工单位到场一名专业的资料员，做好资料整理、报验、归档等相关工作，不得影响上级部门的检查，如果因为资料不齐全造成的考核，由施工单位承担。 四．监理单位项目部对施工单位的要求： 1. 要求施工单位隐蔽工程必须在自检合格的前提下，报专业监理工程师进行验收，验收合格后方可进行下一道工序，否则此段工作量不予确认； 2. 要求施工单位对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量问题及时进行整改，监理工程师对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留隐患； 3. 要求施工单位提前采购好 35kV 集电线路的电缆、电缆桥架、防雷接地扁钢等材料，不得影响后续的施工； 4. 广东地区已经进入台风多发季节，要求施工单位提前做好防台风的相关措施及方案，提前检查项目部板房及施工现场集装箱的牢固性，发现安全隐患及时排除。	
主送单位	海丰通威渔光科技有限公司
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2024 年 09 月 12 日 星期四

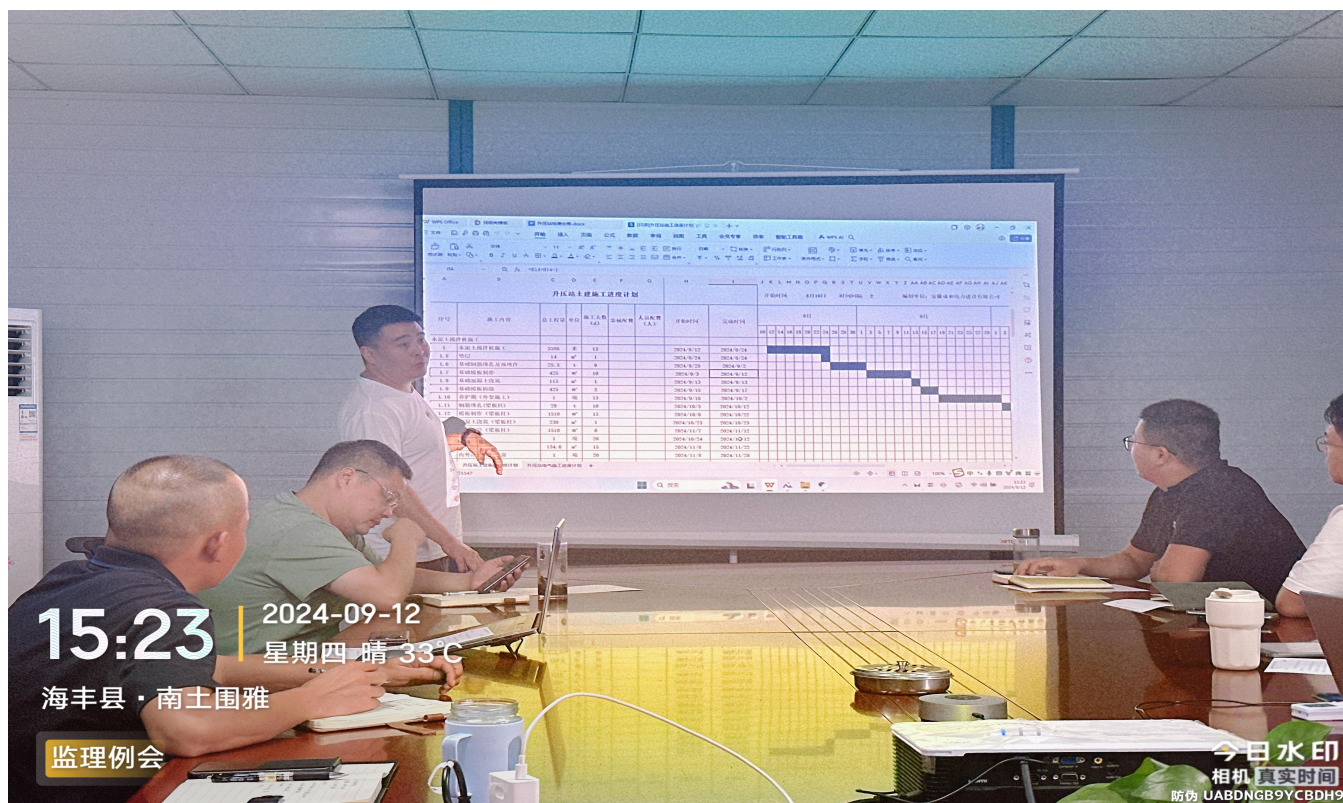

会议签到表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

日期：2024 年 09 月 12 日

序号	姓 名	参建单位名称	联系电话
01	林煜	海丰通威渔光科技有限公司	15757874923
02	叶双	海丰通威渔光科技有限公司	13735424724
03	乾炜	海丰通威渔光科技有限公司	15867126045
04	陈淑华	常州正衡电力工程监理有限公司	17190065789
05	王世伟	常州正衡电力工程监理有限公司	15845256920
06	王世伟	浙江阳明电力建设有限公司	16628757788
07	王世伟	浙江阳明电力建设有限公司	13856375566
08	王世伟	浙江阳明电力建设有限公司	17505632222
09	刘高洪	浙江阳明电力建设有限公司	15951742627
10	王世伟	浙江阳明电力建设有限公司	18356301212
11	王世伟	浙江阳明电力建设有限公司	13355637388
12	王世伟	浙江阳明电力建设有限公司	1335554979
13		浙江阳明电力建设有限公司	
14		浙江阳明电力建设有限公司	
15			
16			
17			
18			
